

工事概要

受注者: 辻谷建設 株式会社

工事名: 一般国道44号 釧路町 別保中央東改良工事


本工事は、釧路外環状道路の釧路東IC～釧路別保IC間のうち、延長110m区間において改良工事を実施しています。

作業期間 : 平成28年5月～平成29年3月

工事箇所 : 釧路町別保

工事内容 : 道路土工、植生工、排水構造物工

進捗率 54.9% (11月末現在)

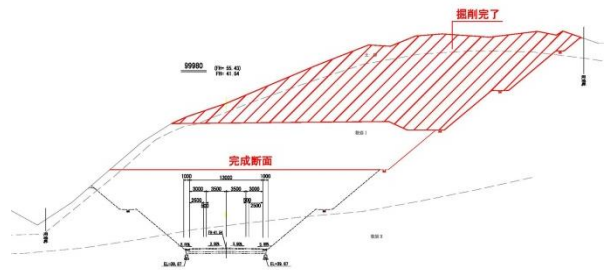

(着工前7.1)



(11/28現在)



(軟岩・中硬岩の積込み状況)



(現場コメント)

工事も着工より半年を超えましたが進捗は未だやや遅れている状況を推移しています。ただ、掘削も最終断面の施工に移行し、2月末の土砂搬出完了が見えてきました。雪舞う季節、特に危険度が高くなる運搬作業における路面管理を徹底し無事故での年越しを目指します。

工事概要

受注者:市橋建設株式会社

工事名:一般国道44号 釧路町 新別保大橋橋脚工事

本工事は、釧路外環状道路のうち、別保川を跨ぐ橋梁の下部工事を実施しています。

作業期間 :平成28年7月～平成29年3月

工事箇所 :釧路町別保

工事内容 :基礎工P2(大口径深礎杭 $\phi 12.5$ L=20.0m)

進捗率 :28.0%(11月末現在)



(現場コメント)

釧路外環状道路のうち、現在未開通区間の釧路東IC～釧路別保IC間で、路線の最終地点に位置する別保川に橋を架ける工事です。

現在、深礎杭本体となる部分の掘削作業を行っています。掘削作業は孔内に重機を降り行います。掘削によって発生した土砂はクレーンにより地上へ排出され、その後外周にライナープレートと呼ばれる鉄製の板を組み付けるという作業を岩盤層に達するまで繰り返して行います。12月中旬には岩盤層へ到達し、別の工法へと移行する予定ですので、次回にはその様子も紹介できると思います。

引き続き作業所一丸となり安全作業に心掛け作業を進めて参りますので、工事へのご理解とご協力をお願い申し上げます。
