

工事概要

受注者: 辻谷建設 株式会社

工事名: 一般国道44号 釧路町 別保中央東改良工事


本工事は、釧路外環状道路の釧路東IC～釧路別保IC間のうち、延長110m区間において改良工事を実施しています。

作業期間 : 平成28年5月～平成29年3月

工事箇所 : 釧路町別保

工事内容 : 道路土工、植生工、排水構造物工


進捗率 13.8% (7月末現在)

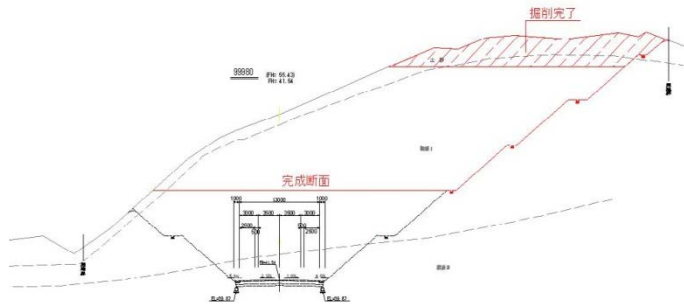

(着工前)



(7/30現在)

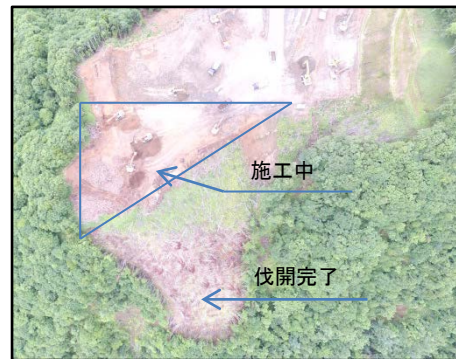

(掘削状況)



(現場コメント)

工事開始より1ヶ月が経過し、約10,000m³の土石の掘削が完了しました。工事は予定より若干進んでいる状況ですが現場は山間部の末端の崖部をメインとした地形のため、重機法面落下災害及び120台/日の運搬で発生が予想される運搬時交通災害の防止を徹底して無事故無災害で工事を進捗しています。

工事概要

受注者：市橋建設株式会社

工事名：一般国道44号 釧路町 新別保大橋橋脚工事



本工事は、釧路外環状道路のうち、別保川を跨ぐ橋梁の下部工事を実施しています。

作業期間：平成28年7月～平成29年3月

工事箇所：釧路町別保

工事内容：基礎工P2(大口径深礎杭 $\phi 12.5$ L=20.0m)

進捗率：2.0%(7月末現在)

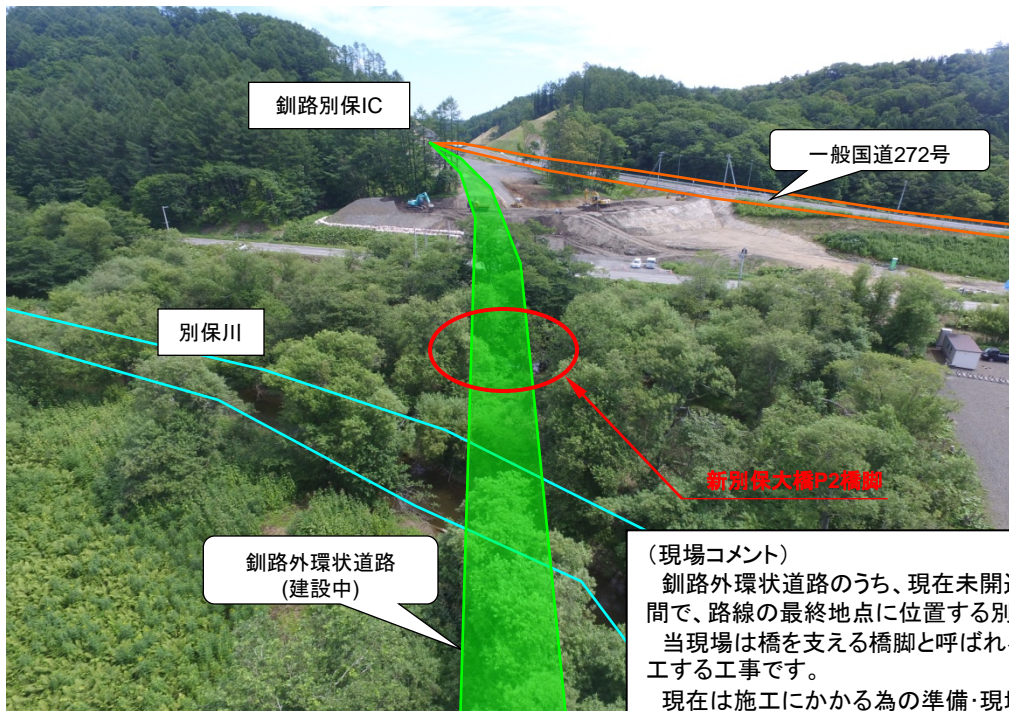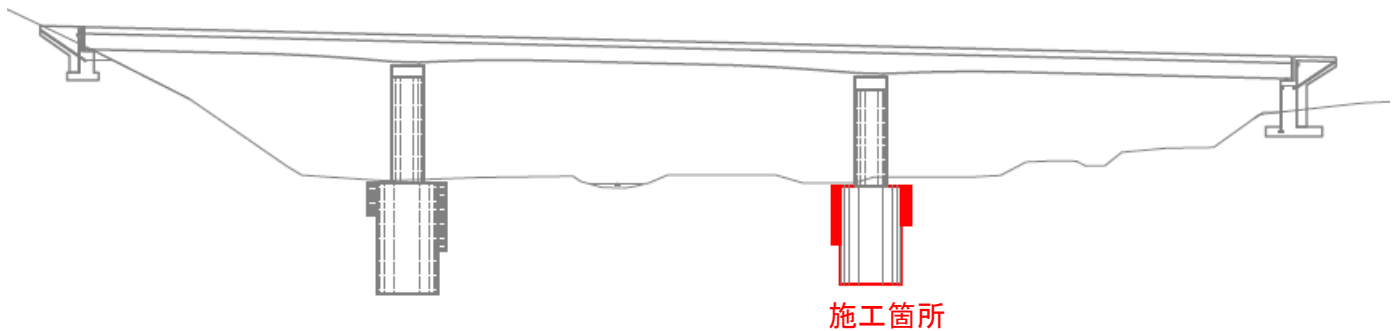

(現場コメント)

釧路外環状道路のうち、現在未開通区間の釧路東IC～釧路別保IC間で、路線の最終地点に位置する別保川に橋を架ける工事です。当現場は橋を支える橋脚と呼ばれる柱の更の下、基礎の部分を実施する工事です。

現在は施工にかかる為の準備・現地調査を行っており、本格的な作業はお盆明けからの予定です。

最後に、一日も早い開通を目指し無事故・無災害で現場を進めて参りますので御協力をよろしくお願い致します。
