


工事概要

受注者 : 株式会社 上田組
工事名 : 一般国道335号 標津町 崎無異改良工事




本工事は、標津防災のうち、土砂掘削、盛土、植生、排水構造物、カルバート、橋台の設置を実施しています。

作業期間 : 平成28年5月～平成29年3月
工事箇所 : 標津町崎無異
工事内容 : 土砂掘削(土量 25,100m³)、盛土(土量21,600m³)、植生工、排水構造物工、カルバート工、橋台工 他
進捗率 : 6.2%(6月末現在)

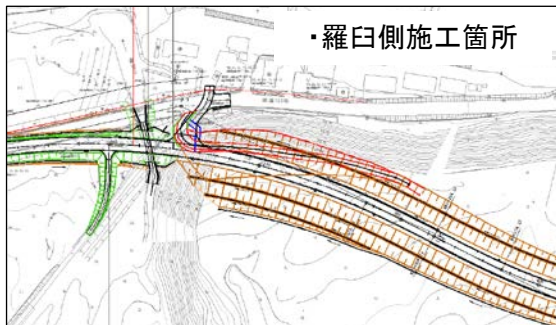

掘削土積込状況

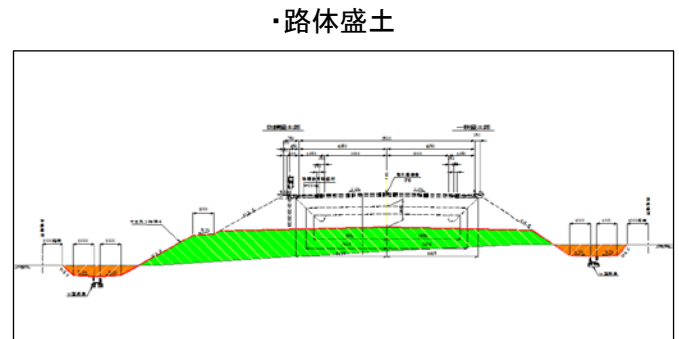

盛土1層目の施工状況



羅臼方向からの状況

今年度の土工完成予想図



(現場コメント)

6月中は雨が多く若干工程が遅れ気味です。7月の天候に期待したいです。
7月は土砂の掘削積込から運搬・盛土作業が主な作業になり、交通事故の防止や環境に配慮しながら施工していきます。
熱中症が起こりやすい時期でもありますが、水分を十分に取しながら今後の作業も安全管理に努めます。
