

工事概要

受注者 : 辻谷建設 株式会社

工事名 : 一般国道44号 釧路町 遠矢改良工事


本工事は、上別保道路のうち、平成30年度開通予定区間の路体盛土・路床盛土・カルバート工を施工しています。

作業期間 : 平成29年3月～平成30年3月

工事箇所 : 釧路町上別保

工事内容 : 路体盛土工(土量 61,000m³)
植生工、カルバート工、舗装工 他

進捗率 : 42.0%(8月末現在)

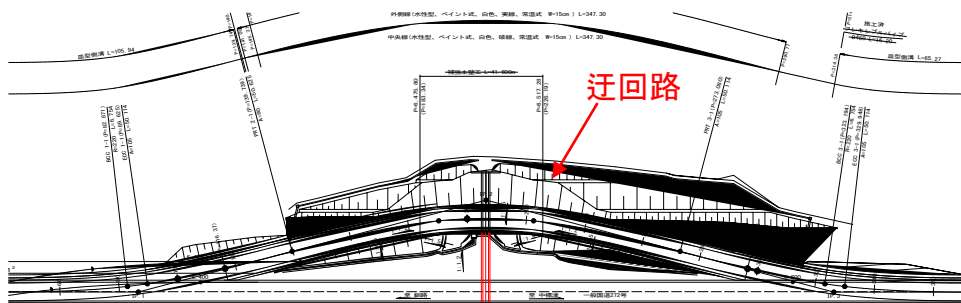

迂回路着工前

カルバート工

迂回路完了



(現場コメント)

工事開始より3ヶ月が経過し、カルバート工を施工するために迂回路を施工し、8月下旬から迂回路での通行を開始しています。工事は予定より若干遅れている状況ですが、現場は交通量が多いので一般車両との交通災害の防止を徹底して、無事故無災害で工事を進捗していきます。
