

工事概要

受注者: 辻谷建設 株式会社

工事名: 一般国道44号 釧路町 別保中央東改良工事


本工事は、釧路外環状道路の釧路東IC～釧路別保IC間のうち、延長110m区間において改良工事を実施しています。

作業期間 : 平成28年5月～平成29年3月

工事箇所 : 釧路町別保

工事内容 : 道路土工、植生工、排水構造物工

進捗率 30.8% (9月末現在)

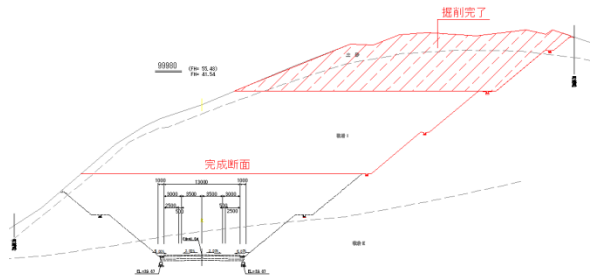

(着工前7.1)



(9/27現在)



(掘削状況)



(現場コメント)

8月の天候不良で遅れた工程ですが9月でも解消出来ないまま、計画より-5%の工程で進捗しています。

これからの冬期施工を考慮し、12月までに進捗をプラスにするため軟岩発破を実施しますが、追い込み期に発生が予想される焦り作業での事故発生防止に向け現場管理体制を強化し0災害を継続します。

工事概要

受注者:市橋建設株式会社

工事名:一般国道44号 釧路町 新別保大橋橋脚工事

本工事は、釧路外環状道路のうち、別保川を跨ぐ橋梁の下部工事を実施しています。

作業期間 :平成28年7月～平成29年3月

工事箇所 :釧路町別保

工事内容 :基礎工P2(大口径深礎杭 $\phi 12.5$ L=20.0m)

進捗率 :14.0%(9月末現在)



(現場コメント)

釧路外環状道路のうち、現在未開通区間の釧路東IC～釧路別保IC間で、路線の最終地点に位置する別保川に橋を架ける工事です。

9月に入りいよいよ深礎杭(橋脚を支える基礎)の施工に直接関わる作業であるスーパーウェルポイントの施工が始まりました。これは杭本体の掘削を行う前に予め杭周辺の地下水位を低下させ、安全に掘削作業を進める為に行われるものです。

引き続き安全作業に心掛け、災害ゼロを目標に現場一丸となって作業を進めて参ります。
