

工事概要

受注者: 道路工業株式会社

工事名: 一般国道38号 釧路市 北園西舗装工事


本工事は、釧路外環状道路の釧路西IC～釧路中央IC間のうち延長1km区間において舗装工事を実施しています。

作業期間 : 平成27年6月～平成28年2月

工事箇所 : 釧路市北園

工事内容 : アスファルト舗装工、防護柵工、道路付属施設工、排水構造物工、縁石工、区画線

進捗率 : 39.6%(9月末現在)

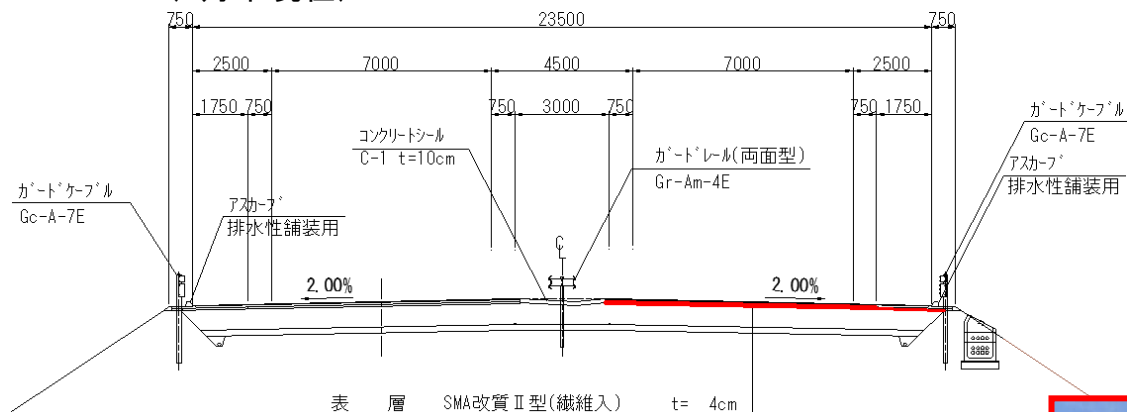

表層	SMA改質Ⅱ型(繊維入)	t= 4cm
基層	再生粗粒度アスコン 20%	t= 5cm
上層路盤	再生アスファルト安定処理 20%	t= 6cm
下層路盤	骨材 40mm級	t= 65cm
凍上抑制層	路盤砂	t= 20cm
		Σ t=100cm



下層路盤 仕上状況



RSS(ロードスキャナシステム)



アスファルト安定処理 舗設状況

(現場コメント)

9月下旬よりアスファルト舗装の施工に取り掛かかっています。

舗設機械にロードスキャナシステムを用いて平均路面高を計測し平坦な舗装路面を施工するようにしております。

現場内は重機、ダンプが頻りに動いておりますので無事故・無災害で竣工できる様頑張ります。

工事概要

受注者: オリエンタル白石株式会社

工事名: 一般国道44号 釧路町 オビラシケ川橋上部工事

本工事は、釧路外環状道路のうち、オビラシケ川及び道道遠矢別保線を跨ぐ橋梁の上部工事を実施しています。

作業期間 : 平成26年1月～平成27年12月

工事箇所 : 釧路町別保東

工事内容 : 5径間連続PCラーメン橋(橋長: 394.6m 幅員: 11.150m)

支間長: 40.0m + 88.0m + 136.0m + 88.0m + 40.0m

架設方法: PC片持架設、固定式支保工

進捗率 : 96% (9月末現在)

施工箇所



(現場コメント)

9月末時点で、壁高欄の施工が1/3完了しました。季節の変わり目で不安定な天候ですが、残りの施工も事故の無いように日々気をつけて無災害を目標に頑張ります。
