

工事概要

受注者: 道路工業株式会社

工事名: 釧路中標津道路 釧路町 上別保舗装工事

本工事は、上別保道路のうち、平成27年度開通予定区間の土砂掘削、舗装、排水構造物、付属物等の設置を実施しています。


作業期間 : 平成27年9月～平成28年3月

工事箇所 : 釧路町上別保

工事内容 : 下層路盤(18,100m²)、舗装(46,480m²)

排水構造物工、付属物工 他

進捗率 : 80%(1月末現在)

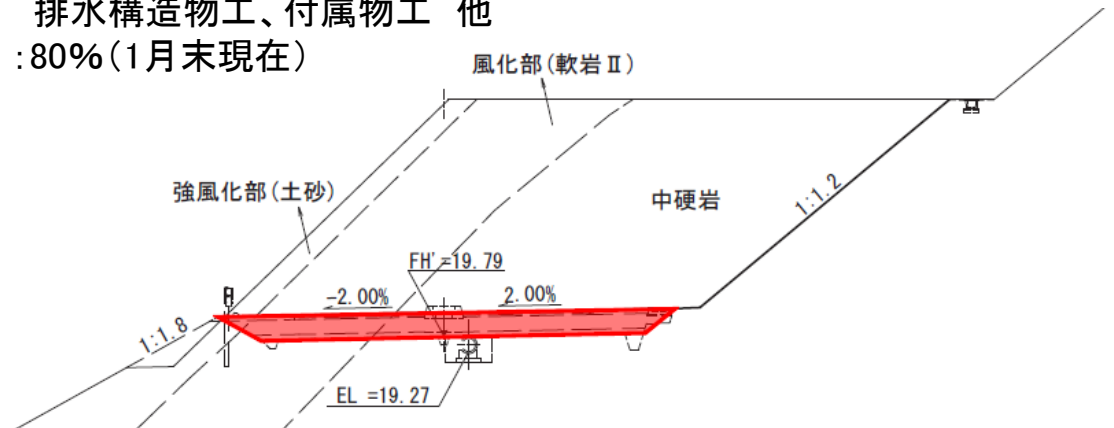

(現場コメント)

天候に恵まれ、施工も順調に進んでおります。埋設物関係も終了し、下層路盤工終了予定。

今週末には、本線最後のアスファルト安定処理も完了し全線通行可能になります。が油断は禁物。風向きが変われば天候も変化致します。

良くも悪くも今は外気温が低いほど天候は安定していますので本当に我慢くらべです。


現場朝礼時の外気温は氷点下22°Cの中、完成に向けて必死に頑張っています！

工事概要

受注者: 高玉建設工業株式会社
工事名: 釧路中標津道路 釧路町 上別保改良工事

本工事は、上別保道路のうち、平成27年度開通予定区間の土砂掘削、植生、排水構造物の設置を実施しています。

作業期間 : 平成27年5月～平成28年3月
工事箇所 : 釧路町上別保
工事内容 : 土砂掘削(土量 44,800m³)
植生工、排水構造物工 他
進捗率 : 94%(H28.1月末現在)

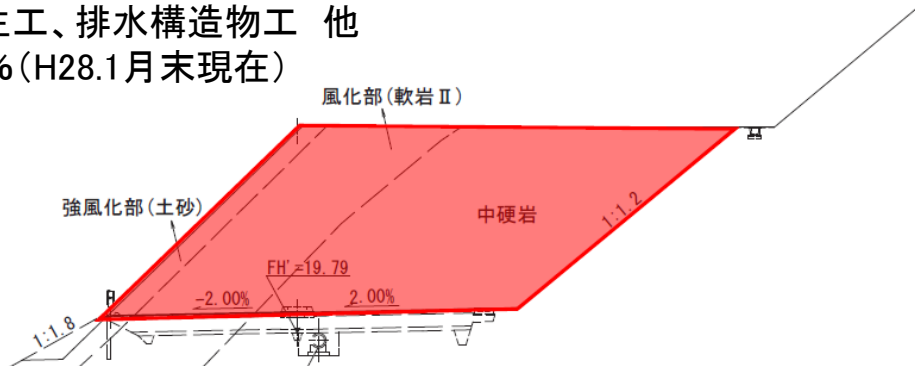

(現場コメント)

12月作業を頑張った事、その間の天候にも恵まれて、H28.1月中旬までの目標進捗を得られました。工事関係者全員が“達成感で一杯”です！同時に責任者として、この“仲間達に感謝”の念が止みません\m^^m/

後は？竣工検査への準備となりますが・・・後片付けや検査準備、通勤災害に油断せず、無事に発注者へ引き渡せるよう！もう一度、気持ちを締めて！！安全作業に努めます！！
