

# 工事概要

受注者: 道路工業 株式会社

工事名: 釧路中標津道路 釧路町 上別保舗装工事

本工事は、上別保道路のうち、平成27年度開通予定区間の土砂掘削、舗装、排水構造物、付属物等の設置を実施しています。



作業期間 : 平成27年9月～平成28年3月

工事箇所 : 釧路町上別保

工事内容 : 下層路盤(18,100m<sup>2</sup>)、舗装(46,480m<sup>2</sup>)

排水構造物工、付属物工 他

進捗率 : 30.0%(10月末現在)

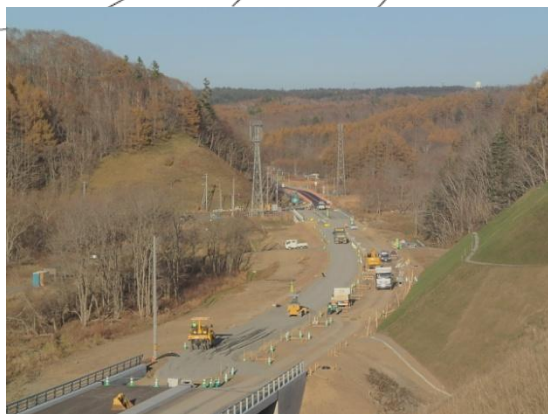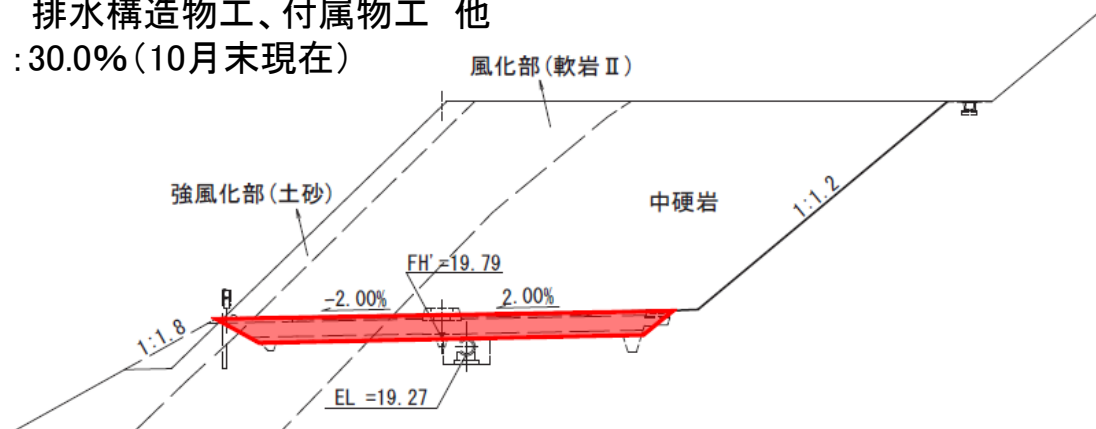

## (現場コメント)

大型ブレーカー2台の他、岩盤窄孔機を追加。  
路盤工では振動タイヤローラを使用し、施工機械の編成による工期短縮・施工速度・品質の向上を行っております。

路床完了後、縦断管、路盤工の並行作業を行い、双方の作業区分を明確に、通行帯を確保しながら、安全対策を十分にとり作業を行っています。

# 工事概要

受注者: 高玉建設工業 株式会社

工事名: 釧路中標津道路 釧路町 上別保改良工事

本工事は、上別保道路のうち、平成27年度開通予定区間の土砂掘削、植生、排水構造物の設置を実施しています。


作業期間 : 平成27年5月～平成28年3月

工事箇所 : 釧路町上別保

工事内容 : 土砂掘削(土量 44,800m<sup>3</sup>)

植生工、排水構造物工 他

進捗率 : 60%(10月末現在)

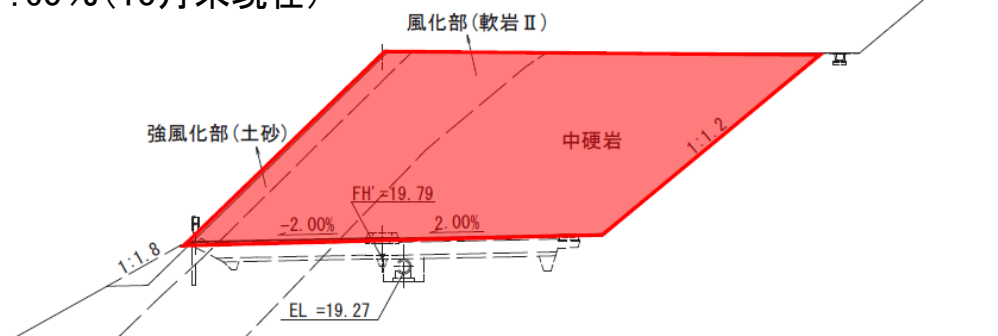

## (現場コメント)

何とか台風時期を乗り越えました。作業ロスも許容範囲(\*^ ^\*)

これから寒さとの戦いが始まりますが、“進捗確保”と“無災害達成”に向け、日々邁進致します。

