

# 工事概要

受注者 : 株式会社 上田組  
工事名 : 一般国道335号 標津町 崎無異改良工事



本工事は、標津防災のうち、土砂掘削、盛土、植生、排水構造物、カルバート、橋台の設置を実施しています。


作業期間 : 平成28年5月～平成29年3月  
工事箇所 : 標津町崎無異  
工事内容 : 土砂掘削(土量 25,100m<sup>3</sup>)、盛土(土量21,600m<sup>3</sup>)、植生工、排水構造物工、カルバート工、橋台工 他  
進捗率 : 39.2%(9月末現在)

(路体盛土箇所)  
路体盛土作業も終了し  
削り取りによる法面整形作業をしています。


切土法面整形後は、リサイクル緑化  
による植生を行います



A1橋台では杭を施工すると、  
下図のような感じになります。

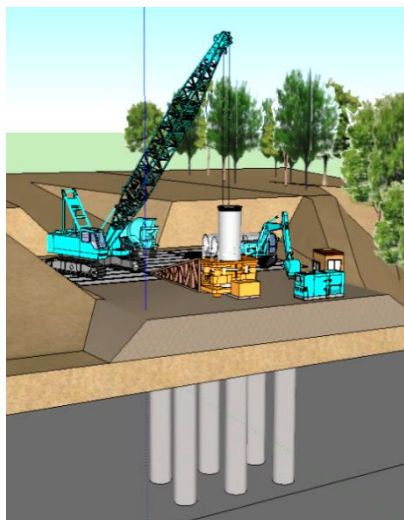

9月14、15日の2日間  
地元高校生の勤労体験  
(インターンシップ)  
を実施しました。  
測量体験やPCソフトの  
3D体験等興味を持って  
いたようです。

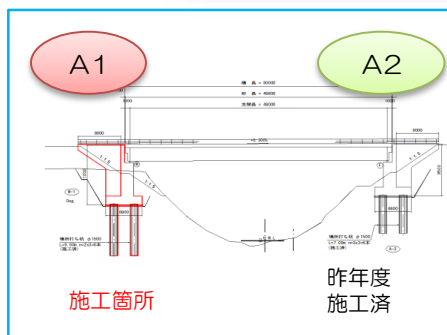

## (現場コメント)

土工作業は8月から9月上旬にかけて前線の通過や台風の影響もありましたが、このところの天候で、ほぼ完了に近づいています。

橋台工の施工は、機械が入り杭の施工が始まります。  
これからクレーン作業や高所作業が増えてくるので、安全作業で  
工事を進めていきます。

追伸  
職業体験に来てくれた高校生  
この仕事に就いてくれたらいいなー

