


# 工事概要

受注者 : 株式会社 上田組  
工事名 : 一般国道335号 標津町 崎無異改良工事




本工事は、標津防災のうち、土砂掘削、盛土、植生、排水構造物、カルバート、橋台の設置を実施しています。

作業期間 : 平成28年5月～平成29年3月  
工事箇所 : 標津町崎無異  
工事内容 : 土砂掘削(土量 25,100m<sup>3</sup>)、盛土(土量21,600m<sup>3</sup>)、植生工、排水構造物工、カルバート工、橋台工 他  
進捗率 : 17.2%(7月末現在)

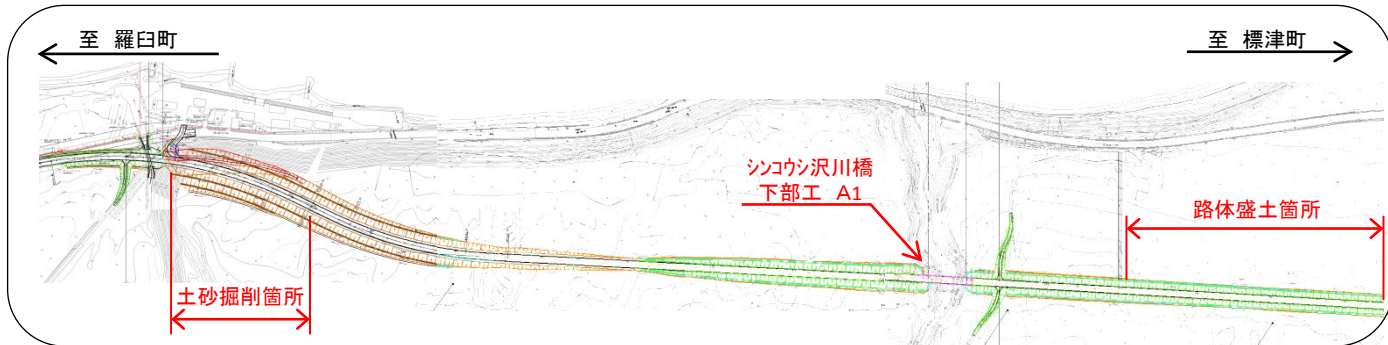

積み込んだ土砂を国道を經由して盛土箇所へ運搬しています

路体盛土の様子

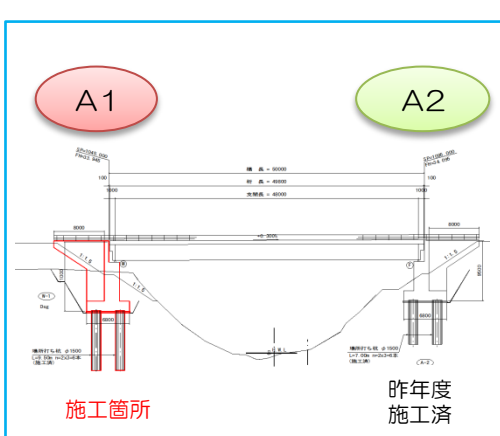

8月のお盆明けから杭基礎の施工が始まります。



(現場コメント)

7月初旬から土砂を掘削し運搬盛土を行っています。土工作业も6割程度進んでいます。7月下旬の梅雨のような雨に少し足踏み状態です。

8月からは、シコウシ沢川橋のA1橋台の施工が始まります。

土砂を運搬するダンプトラックや資材・機材が現場に搬入されるので、工事車両の出入りに十分注意して安全作業で工事を進めていきます。

