

工事概要

受注者: 道路工業株式会社


工事名: 北海道横断自動車道 白糠町 ノイベツ東舗装工事

本工事は、北海道横断自動車道のうち、平成27年度開通予定区間の白糠町ノイベツ地区のアスファルト舗装・道路付属物(ガードレール等)の工事を実施しています。

作業期間 : 平成27年5月～11月

工事箇所 : 白糠町ノイベツ

工事内容 : アスファルト舗装工事 (延長 1,510m)
路盤工、アスファルト舗装工、防護柵工(ガードレール)

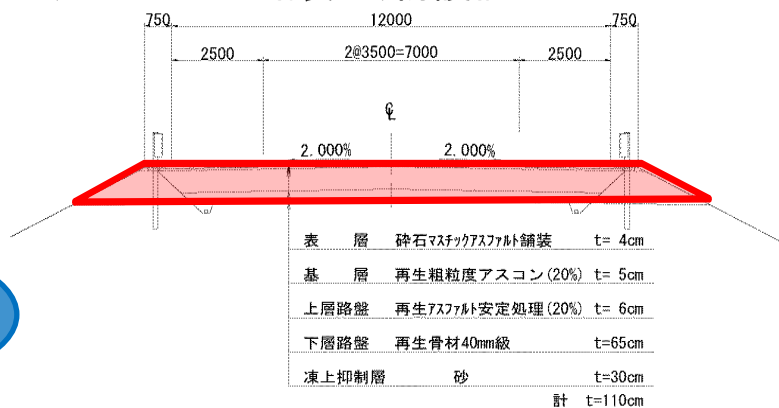

工事進捗率

81%

(9月末現在)



(現場コメント)

舗装工事のメイン工種である表層工は最高の天気のもとで施工することができて、仕上がりも良好でした。残りわずかですが最後まで気を抜かず安全作業を行います。

(施工状況について)

10月以降は区画線、ガードレール、ラバーポール等の施工を行ない、10月中旬には工事完了の予定です。

工事概要

受注者: 白崎建設株式会社

工事名: 北海道横断自動車道 釧路市 舌辛改良工事


本工事は、北海道横断自動車道のうち、国道240号と交差する橋梁下部工と阿寒ICランプの補強土壁を設置するものです。

作業期間 : 平成27年4月～12月

工事箇所 : 釧路市阿寒町下舌辛

工事内容 : 橋梁下部工(A1、A2)、補強土壁工、土工

当工事(舌辛改良工事)は、主に国道240号を交差する橋を作る工事です。

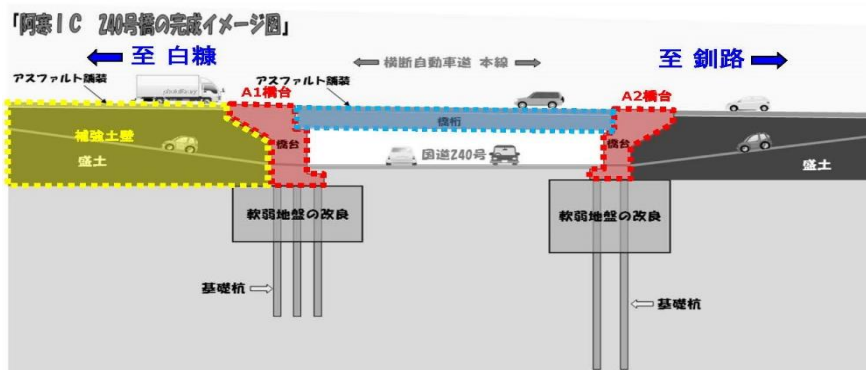

工事進捗率

65%

(9月末現在)

橋をつくる工程



▼白糠側からA1橋台～A2橋台



▼A1橋台背面側 補強土壁施工



現場コメント:

現在、阿寒ICに係わる工事は10社で行っています。9月15、16日にかけて、(株)釧路製作所で工事している橋の桁が架かりました。

国道240号をお通りの際は工事車両が頻繁に行き来しており、ご迷惑をおかけしております。ご理解・ご協力をお願いいたします。

工事関係車両は黄色いゼッケンをつけて走行しています

TOPIC～ 阿寒IC240号橋架設状況

舌辛改良工事で8月に完成させた橋台の上に、240号上部工を受注した(株)釧路製作所が桁を架けました。

桁は(株)釧路製作所が自社工場で作したものです。

桁架設施工中



桁架設完了



※ゼッケン番号は工事毎に割り振り、識別しています。
