

再評価結果（平成26年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局国道・防災課
担当課長名：茅野 牧夫

事業名 <small>どうおうけんれんらく</small> 道央圏連絡道路（一般国道337号） <small>なかじゆりん</small> 中樹林道路	事業 一般国道 区分	事業 国土交通省 主体 北海道開発局			
起終点 自：北海道空知郡南幌町南15線西 <small>ほっかいどうそらち なんぼろ みなみ せんにし</small> 至：北海道江別市江別太 <small>ほっかいどうえべつ えべつぶと</small>	延長 7.3 km				
事業概要 道央圏連絡道路は、千歳市を起点とし、小樽市に至る延長約80kmの地域高規格道路である。 このうち中樹林道路は、北海道縦貫自動車道江別東ICと接続し、高速ネットワークの拡充による札幌圏の連絡機能の強化を図り、地域間交流の活性化及び、拠点空港新千歳空港、国際拠点港湾苫小牧港等への物流効率化等の支援を目的とした、南幌ランプから江別市江別太に至る延長7.3kmの事業である。					
H21年度事業化	H1年度都市計画決定 (H1年度変更)	H25年度用地着手	H25年度工事着手		
全体事業費	約204億円	事業進捗率	7%	供用済延長	0.0km
計画交通量	13,300台/日				
費用対効果 分析結果	B/C <small>(事業全体)</small> 2.0 <small>(残事業)</small> 2.3	総費用 <small>(残事業)/(事業全体)</small> 170/194億円 事業費：145/169億円 維持管理費：25/25億円	総便益 <small>(残事業)/(事業全体)</small> 389/389億円 (走行時間短縮便益：275/275億円) (走行経費減少便益：75/75億円) (交通事故減少便益：38/38億円)	基準年 平成25年	
感度分析の結果 【事業全体】交通量：B/C=1.7~2.3（交通量±10%） 事業費：B/C=1.9~2.2（事業費±10%） 事業期間：B/C=1.9~2.1（事業期間±20%） 【残事業】交通量：B/C=2.0~2.6（交通量±10%） 事業費：B/C=2.1~2.5（事業費±10%） 事業期間：B/C=2.2~2.4（事業期間±20%）					
事業の効果等 事業の必要性及び効果 ①物流拠点間の利便性向上 ・石狩湾新港と苫小牧港間の所要時間が夏期で11分（冬期は10分）短縮され、物流輸送の利便性向上、地域間交流の活性化が期待される。 ②国際拠点港湾苫小牧港への流通利便性向上 ・並行道路を通過する貨物車の当該道路への転換が見込まれ、交通事故が減少するなど、苫小牧港への流通利便性向上が期待される。 ③拠点空港新千歳空港への利便性向上 <観光・地域産業への支援> ・旭川市からの所要時間が夏期で1分短縮され、新千歳空港への利便性向上が期待される。 <航空貨物の物流利便性向上> ・新千歳空港へ輸送される農水産品（生ホタテ約740t/年度、スターチス約846万本/年度）などの流通利便性向上が期待される。 ④救急搬送の安定性向上 ・南幌町から江別市や札幌市の高次医療施設までの所要時間が夏期で9分（冬期は11分）短縮し、救急搬送の安定性向上が期待される。 ⑤交通混雑の緩和 ・札幌市内へ流入する通過交通の分散が図られるとともに、並行道路である国道337号の交通混雑の緩和が期待される。 ⑥道路交通の安全性向上 ・国道337号を通過する交通の当該道路への転換が見込まれ、交通事故の減少など、道路交通の安全性の向上が期待される。 ⑦日常活動圏中心都市への利便性向上 ・南幌町から札幌市や江別市への所要時間が夏期で9分（冬期は11分）短縮し、日常活動圏中心都市への利便性向上が期待される。					

⑧冬期走行環境の安全性向上

- ・冬期視程障害が緩和され、冬期走行環境の安全性向上が期待される。

⑨CO₂排出量の削減

- ・自動車からのCO₂排出量1,993(t-CO₂/年)の削減が期待される。

関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

江別市など5市3町の首長等で構成される「道央圏連絡道路整備促進期成会」等より整備促進の要望を受けている。

知事の意見：

北海道縦貫自動車道江別東ICと接続し、高速ネットワークの拡充による札幌圏の連絡機能の強化を図り、地域間交流の活性化及び、拠点空港新千歳空港、国際拠点港湾苫小牧港への物流の効率化等の支援が図られ、道民生活の向上や経済・社会活動の活性化に寄与することから、当該事業の継続について異議はない。

なお、事業の実施にあたっては、平成19年12月25日付け環政第1171号「地域高規格道路 道央圏連絡道路 長沼町～江別市間環境影響評価準備書について」における知事意見を遵守すること。また、徹底したコスト削減を図るとともに、これまで以上に効率的・効果的に執行し、早期供用を図ること。

事業評価監視委員会の意見

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

- ・道央圏連絡道路が江別東IC～蕨岱ランプ、新千歳空港ランプ～中央ランプまで開通
- ・北海道横断自動車道が夕張IC～トナムICまで開通
- ・北海道縦貫自動車道 新千歳空港ICが開通
- ・新千歳空港 国際ターミナルが開業
- ・石狩湾新港 石狩LNG基地が稼働

事業の進捗状況、残事業の内容等

平成25年度に工事着手して、用地進捗率0%、事業進捗率7%となっている。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。

施設の構造や工法の変更等

施設の構造や工法等の変更はないが、引き続きコスト削減に取り組んで行く。


対応方針

事業継続

対応方針決定の理由

事業の必要性・重要性は変化なく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。

事業概要図

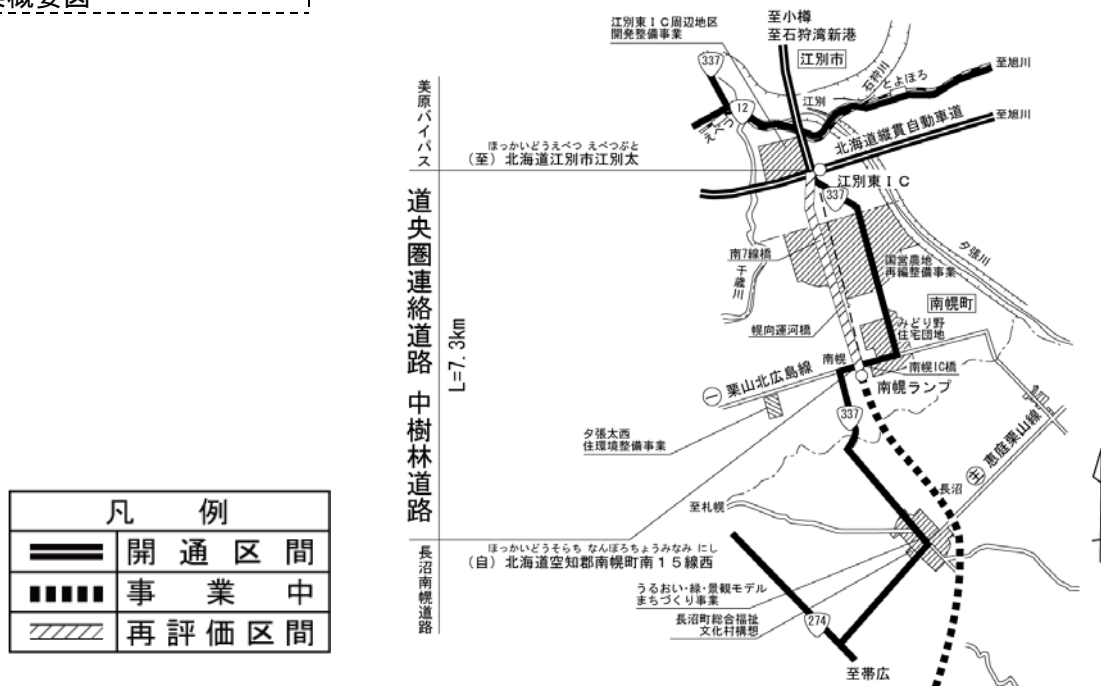

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。
