


# 1. 平成21年度の実施予定

# 1-1. 旧川復元の施工年次計画

平成21年度、旧川に河道切り替えし、平成22年度、直線河道の埋め戻しを行い工事完了の予定。


項目 \ 年度		H18	H19	H20	H21	H22	
施工 工程	仮設工	[H18-H20]				[H21]	[H22]
	右岸残土撤去(400m)		[H19]	[H20]			
	旧川復元(旧川掘削、直線河道締切)		[H19-H20]	[H21]	[H22]		
	右岸残土撤去・直線河道埋戻し				[H21]	[H22]	

旧川河道に切替予定

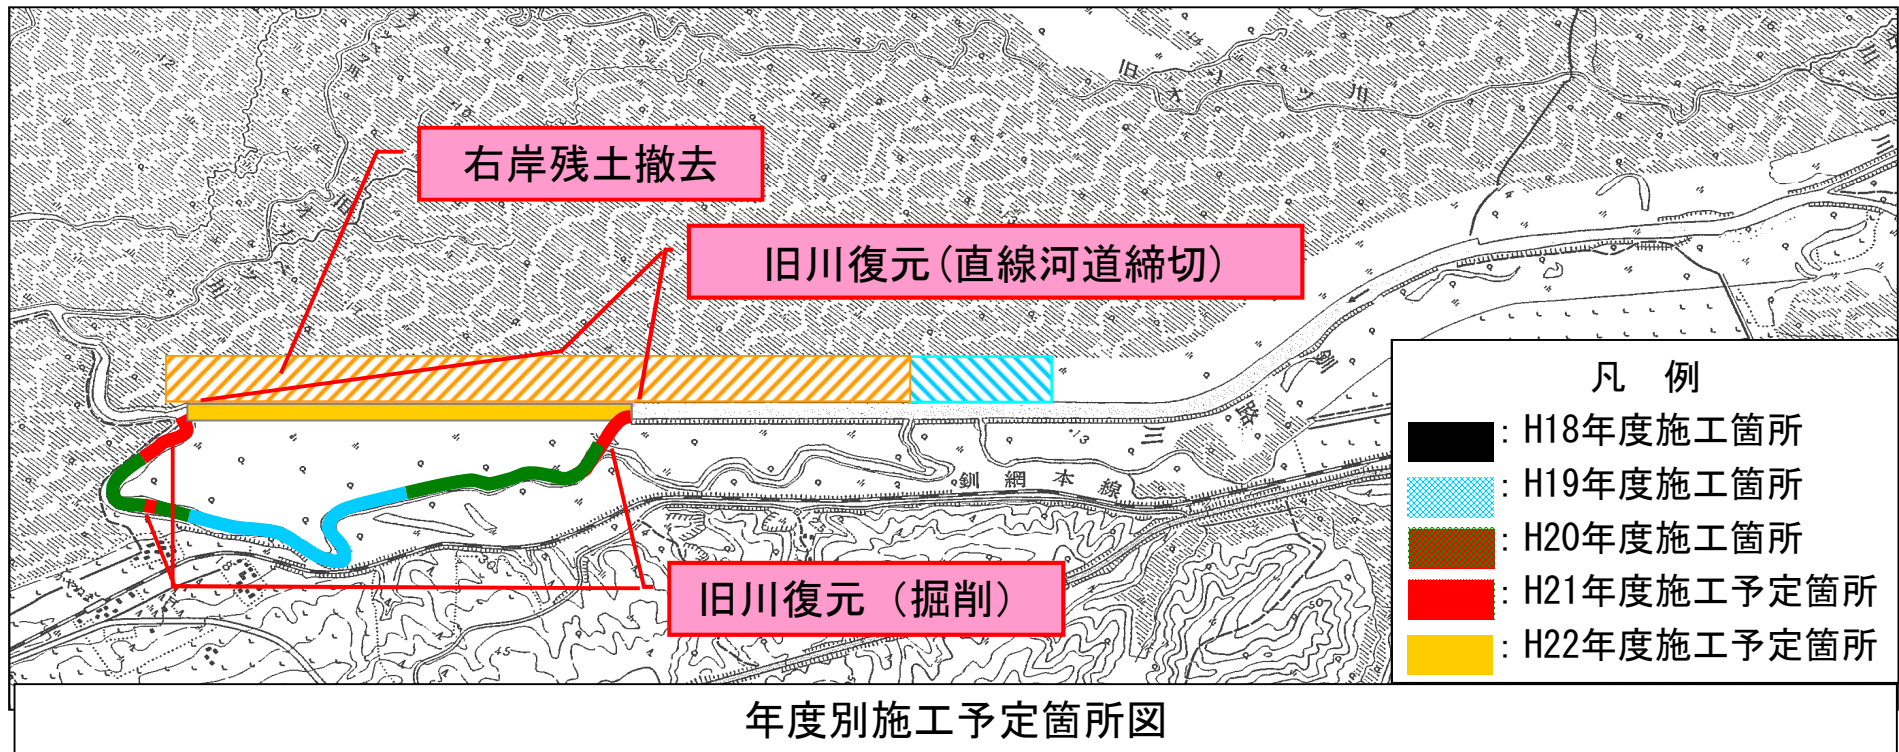

## 1-2. 平成21年度の実施予定概要

平成21年度は、旧川上・下流端の掘削および直線河道の締切り等を実施し、旧川に河道切替えの予定。

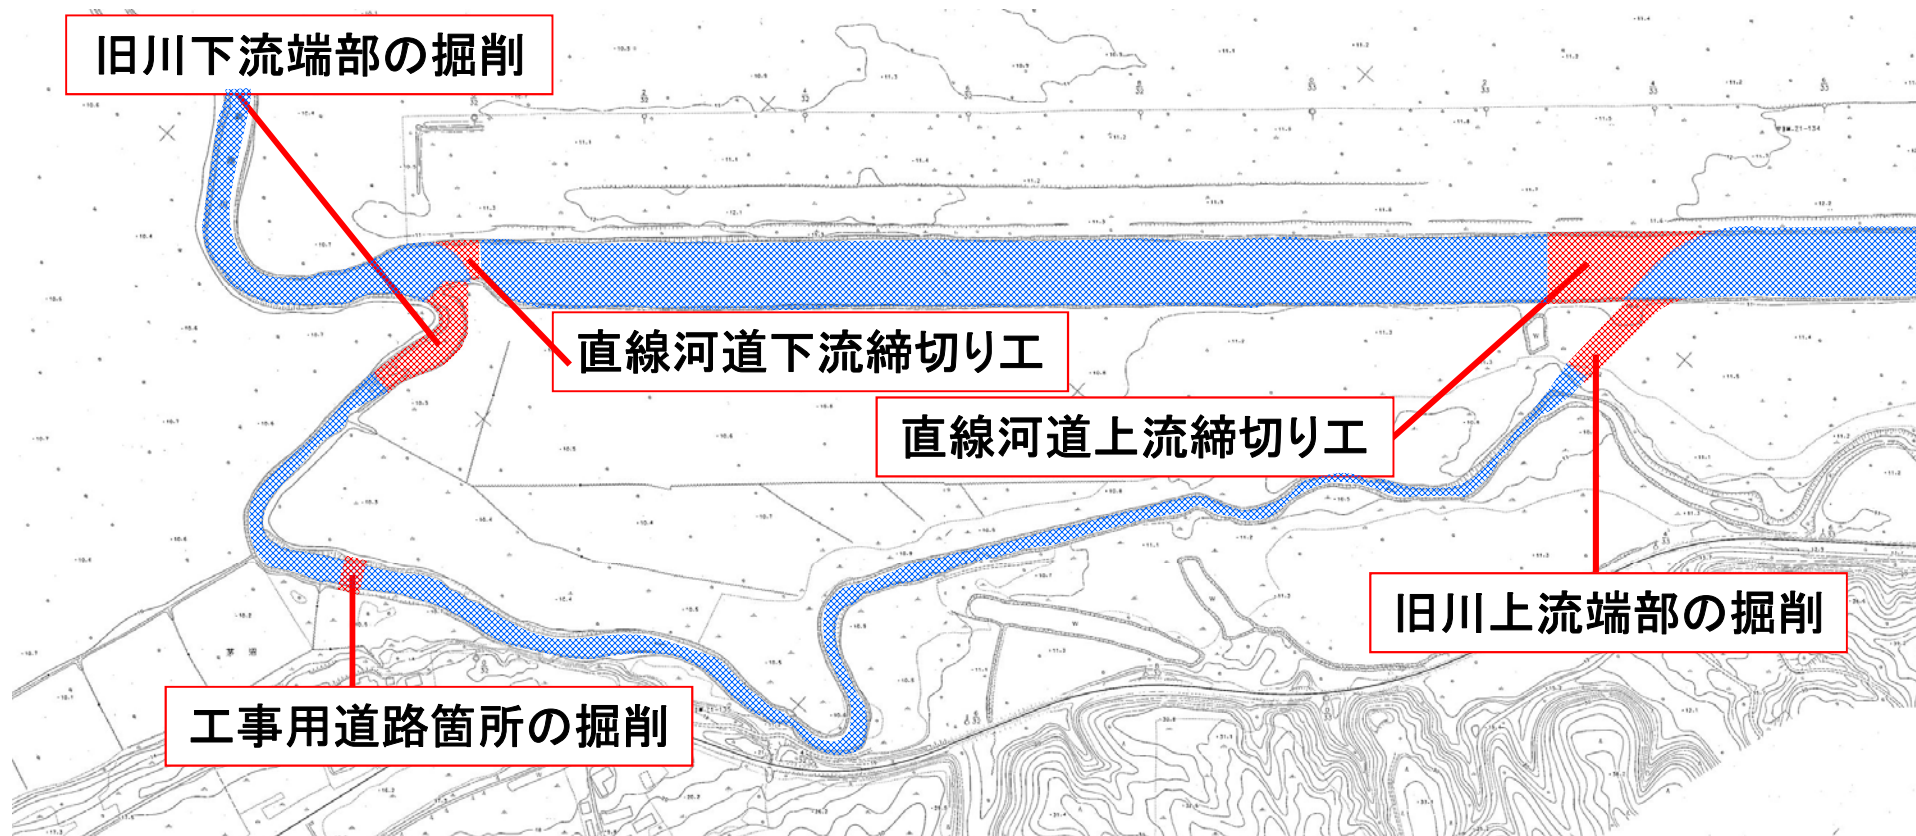

平成21年度の施工予定箇所図
