

乙部防災事業 工事レポート



令和7年5月

工事内容：令和3年6月に発生した岩盤崩壊により通行止めとなっている区間を回避する新たな国道整備を行うための工事です。

【現在の状況】


- ① 鳥山トンネルを掘るための設備が北側坑口部に完成し、トンネル掘削を開始しました。安全第一で鋭意工事を進めます。
- ② 鳥山トンネル南側坑口部と館浦トンネル北側坑口部の土を削る作業（切土）とコンクリートや緑化で法面（のりめん）保護する作業が完了しました。
- ③ 館浦トンネルは、現在通行止めとなっている館の岬トンネルの南側から入って途中から分岐するトンネルです。
分岐部分は、トンネル同士が近いことから掘削の影響を受けやすく、掘削時に崩れたり変形をするおそれがあるため、安全に工事ができるよう、事前に館の岬トンネルの一部を土などで埋めて補強する作業を行っています。
なお、館浦トンネルは今年度に工事着手予定です。

①鳥山トンネル 北側坑口部

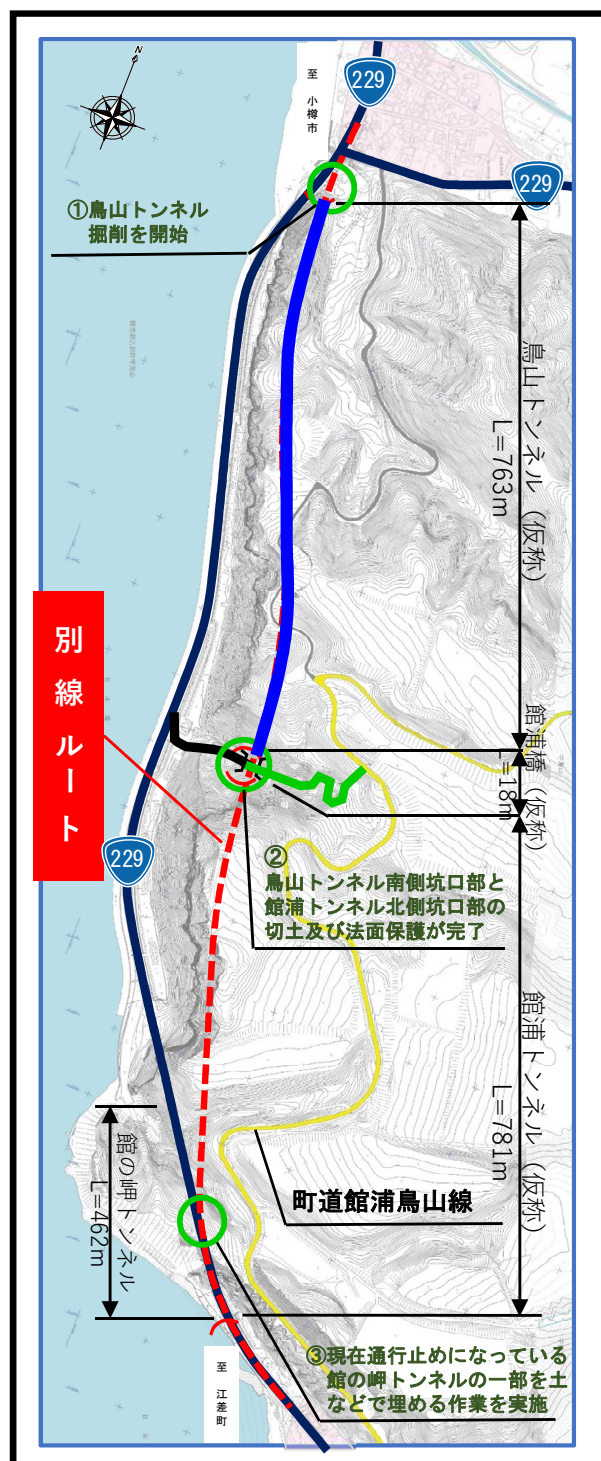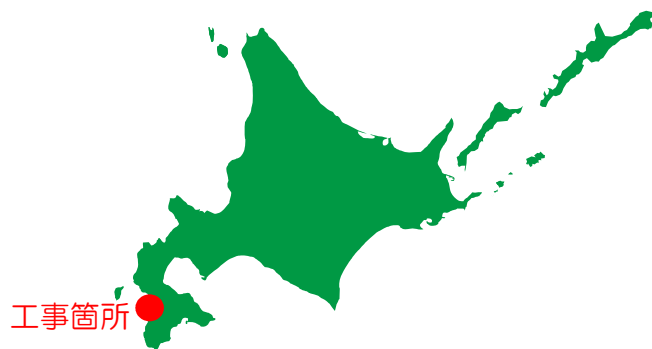


②鳥山トンネル 南側坑口部 館浦トンネル 北側坑口部

切土・法面保護 着手前

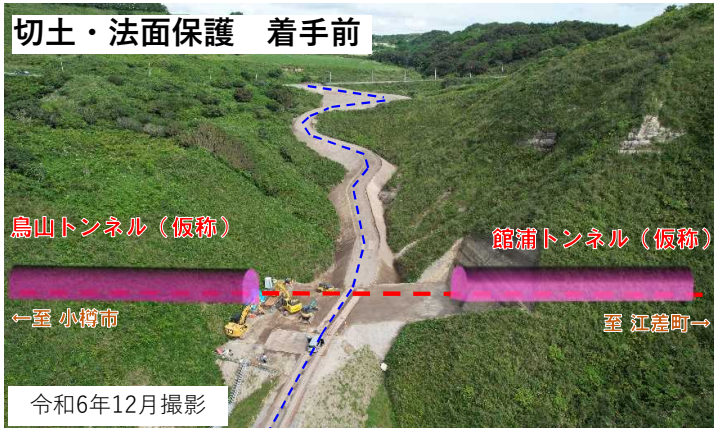


切土・法面保護 着手後

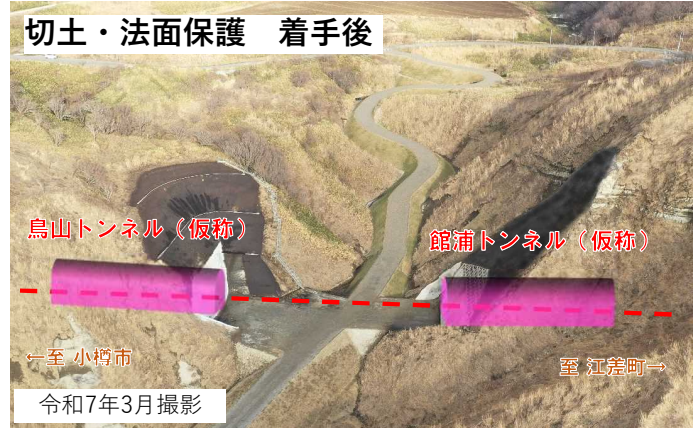

③館浦トンネル 南側坑口部

館の岬トンネル 南側坑口

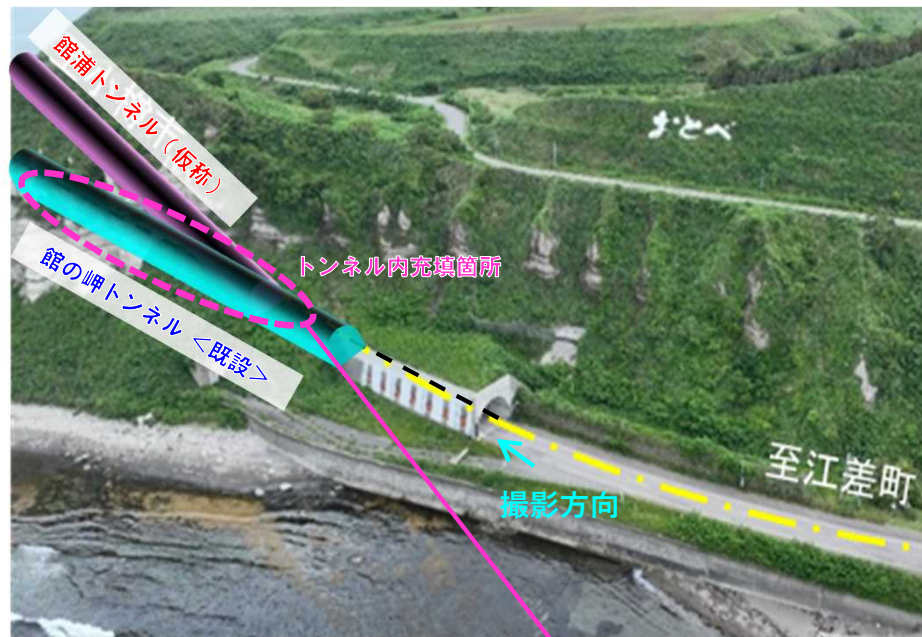

館の岬トンネル内充填 着手前



館の岬トンネル内充填 着手後

