

工事概要

受注者:株式会社 本田組

工事名:一般国道38号 釧路市 星が浦北通高架橋下部工事



当工事は、釧路新道の4車線化に必要な星が浦高架橋を架ける工事のうち、橋を支える橋脚を造る工事です。

作業期間 :平成28年3月～平成29年1月

工事箇所 :釧路市大楽毛

工事内容 :既製杭工 P2 (L=51.0m) N=20本, P5 (L=51.0m) N=20本
壁式橋脚 P3 V=212m³, P5 V=219m³

進捗率 : 97.5%(11月末現在)

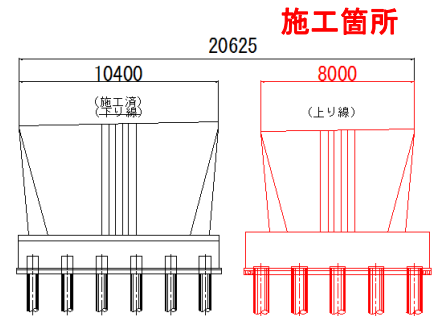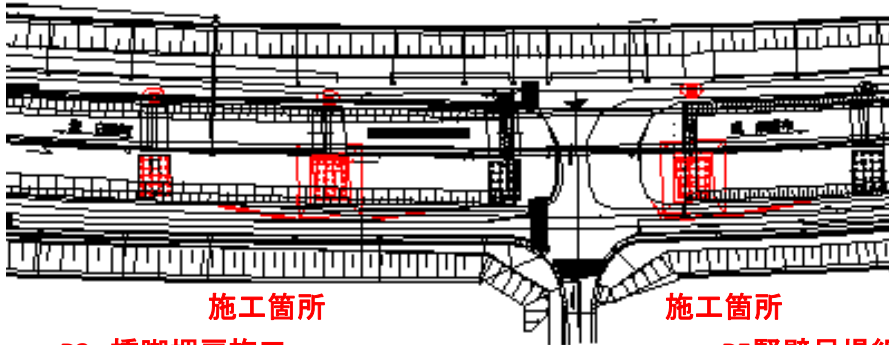

P3 橋脚埋戻し施工

P5 壁式橋脚組立完了



施工区間 全景写真



(現場コメント)

早いもので今年も残すところ一ヶ月を切り、寒さも一段と厳しさを増して雪の降る日もちらほらとなっておりまいた。道路の路面状態もアイスバーンになっていることもありますので、交通事故には十分注意して下さい。

現場も最終期を迎え、現在は埋戻し作業・舗装工事を施工しております。道路脇での作業となっていますので、お車を運転される方々には大変ご迷惑をお掛けしております。工事完成まで無事故・無災害に努めて参りますので、ご協力をお願い致します。
