

工事概要

受注者：株式会社 上田組
工事名：一般国道335号 標津町 崎無異改良工事



本工事は、標津防災のうち、土砂掘削、盛土、植生、排水構造物、カルバート、橋台の設置を実施しています。



作業期間：平成28年5月～平成29年3月
工事箇所：標津町崎無異
工事内容：土砂掘削(土量 25,100m³)、盛土(土量21,600m³)、植生工、排水構造物工、カルバート工、橋台工 他
進捗率：56.3%(10月末現在)

A1橋台の場所打ち杭の施工が10月中旬に終了しました。

(路体盛土箇所)
路体盛土の整形作業が終了し、すき取土の張付け作業をしています。



A1橋台は冬季施工に入るため養生囲いを行いコンクリートの品質管理に努めます。

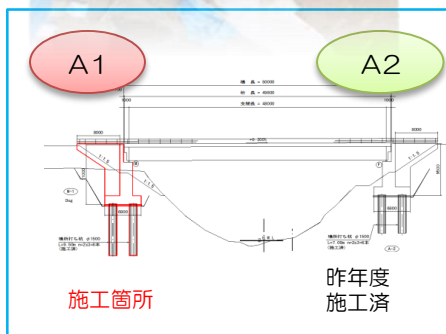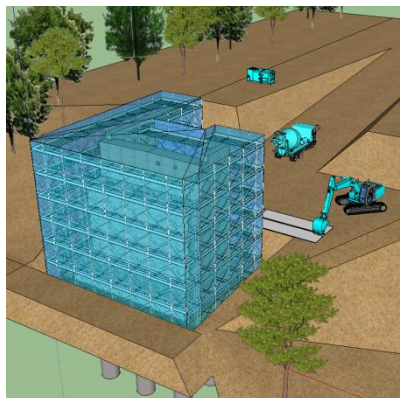

(現場コメント)

土工作业は、台風や悪天候の影響もありましたが、厳冬期前に概ね終了しそうです。

橋台工の施工は、場所打杭が終了し、掘削作業も終わったので、本格的に本体のコンクリート工が始まります。

足場上の作業など高所作業が増えてくるので、安全作業で工事を進めていきます。

道路路面が雪や氷により滑る時期に入るため通勤時の交通事故にも気を付けます。また、鹿にも注意しましょう。

