

工事概要

受注者: 村井建設株式会社

工事名: 一般国道44号 根室市 ホロモシリ1号橋下部工事



本工事は、根室道路事業のホロモシリ川に架かる橋の橋台を造る工事です。

作業期間 : 平成28年3月～平成28年12月

工事箇所 : 根室市幌茂尻

工事内容 : 橋台工(A-2橋台)、杭基礎(φ1500 L=8.0m N=12本)

進捗率 : 93.0%(10月末現在)

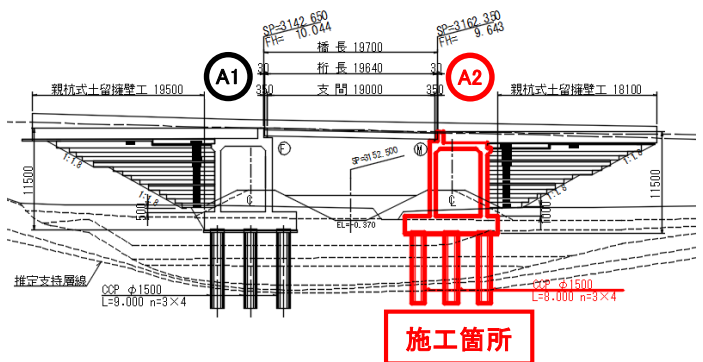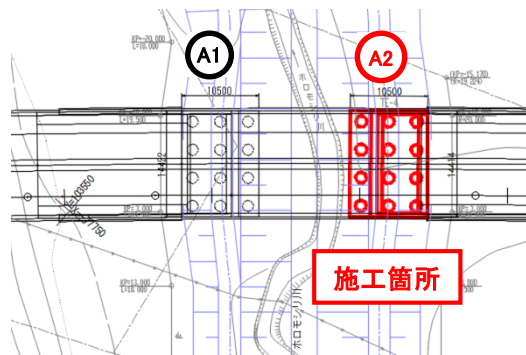

ホロモシリ1号橋は橋長19.7m、下部工橋台2基、上部工PCプレテン単純中空床版のうち本工事は橋台1基の完成となります。

(現場コメント)

5月中旬から着手し、躯体コンクリート迄完了致しました、残りの埋戻し・鋼矢板引抜作業を行い11月中旬に完了する予定です。
