

工事概要

受注者: 村井建設株式会社

工事名: 一般国道44号 根室市 ホロモシリ1号橋下部工事



本工事は、根室道路事業のホロモシリ川に架かる橋の橋台を造る工事です。

作業期間 : 平成28年3月～平成28年12月

工事箇所 : 根室市幌茂尻

工事内容 : 橋台工(A-2橋台)、杭基礎(φ1500 L=8.0m N=12本)

進捗率 : 77.0%(9月末現在)

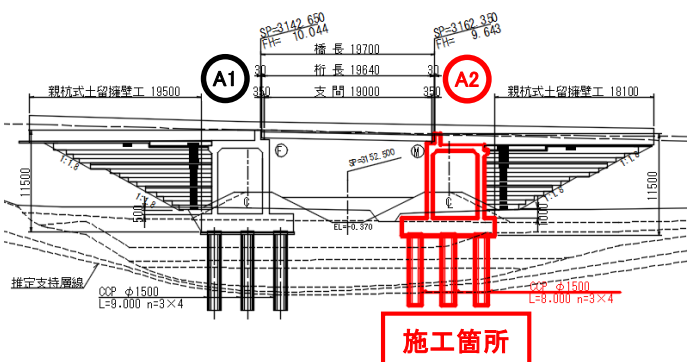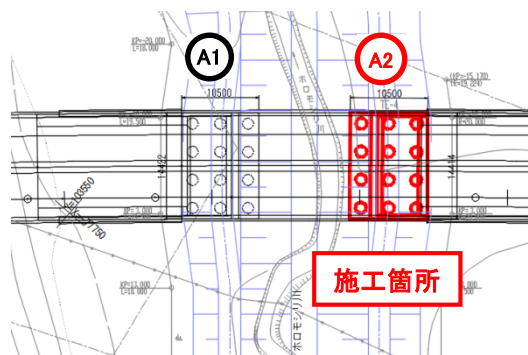

ホロモシリ1号橋は橋長19.7m、下部工橋台2基、上部工PCプレテン単純中空床版のうち本工事は橋台1基の完成となります。

(現場コメント)

8月の台風及び低気圧の影響で大工・鉄筋工の確保が難しくなり、工程が遅れてきてますが工期内に無事故で終わらせたいと思います。
