

工事概要

受注者:株式会社 本田組


工事名:一般国道44号 根室市 幌茂尻改良工事

本工事は、根室道路のうち、幌茂尻地区の土工、法面工、排水構造物工の工事を実施しています。

作業期間 平成27年4月～平成27年12月

工事場所 根室市幌茂尻


工事内容 道路土工、法面工、排水構造物工、仮設工

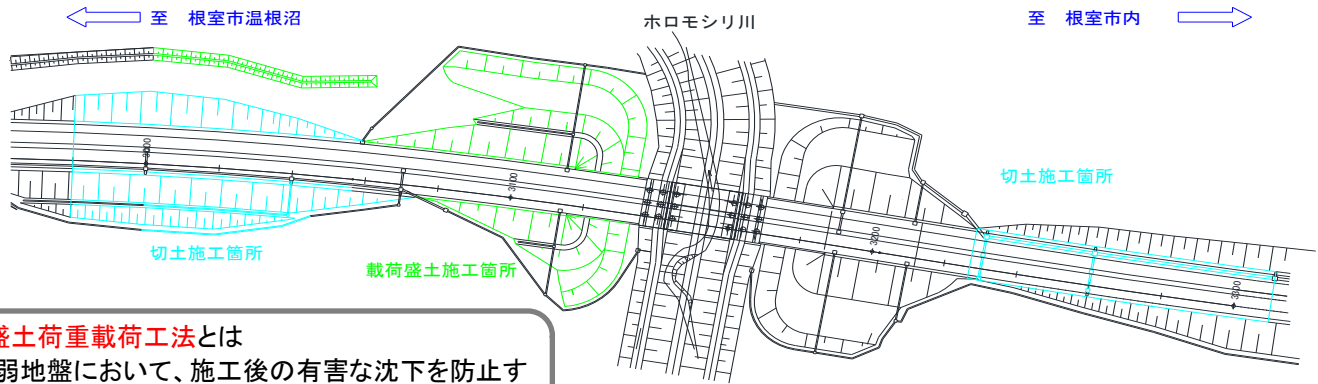

進捗率:77.2%(8月末現在)

盛土荷重载荷工法とは

軟弱地盤において、施工後の有害な沈下を防止する為、あらかじめ载荷盛土の施工により、圧密沈下を促進させる工法です。

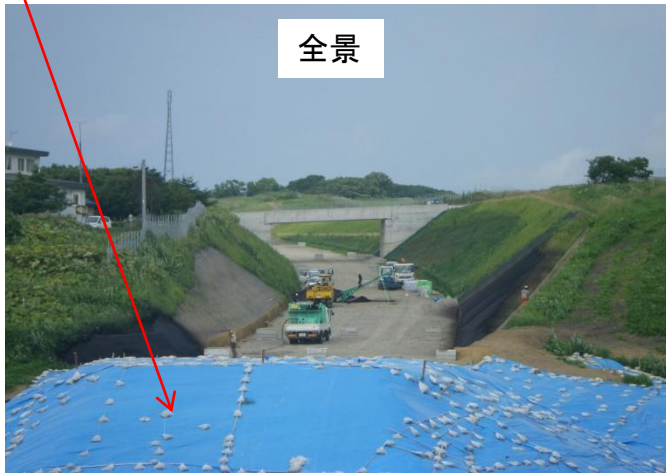

イメージアップの一環として国道44号線沿いに大型電光掲示板(LED照明)を設置し、交通事故防止の啓発を実施しています。



(現場コメント)

国道44号根室道路の開通に向けて、利用する皆様にとって走りやすい道路を作るため、日々の施工を行っております。

また、安全面につきましても、「現場の笑顔 チームワークで安全・安心」をスローガンに掲げ、作業従事者一同無事故無災害で竣工できるように取り組んで参ります。
