



令和 6 年 3 月 25 日

帯 広 開 発 建 設 部

帯広排水機場における重油の流出について（第 16 報）

～重油浸透箇所の監視を継続しています～

6 月 23 日に発生した帯広排水機場の敷地内における重油の流出について、本日 14:00 現在の対応状況をお知らせします。

1 事実関係

- ・ 流 出 場 所 : 帯広市東 12 条南 2 丁目地先 帯広排水機場
- ・ 流出物及び流出量 : A 重油 7,450 リットル（推定）
- ・ 被 害 の 有 無 : 現時点においても、施設敷地外や河川への流出は確認されていません。

2 時系列

- ・ 6 月 23 日（金） 帯広排水機場の敷地内で重油の漏れを確認
（重油漏れ箇所は補修済み、排水機場は稼働可能に復旧済み）
- ・ 6 月 23 日（金）～ 継続中
土砂撤去等の重油回収作業、定期監視、オイルフェンス設置（予防措置）
（別紙 1 参照）
（大型土のう 174 袋分の土砂撤去により、概ねの汚染土砂の掘削は終了しましたが、掘削範囲や周辺の土壌について監視を継続しています）
- ・ 6 月 29 日（木） 排水機場の擁壁の継目（別紙 2①）から重油の染み出しが確認されたため、止水セメントによる対策を実施。
- ・ 7 月 16 日（日） 排水機場の擁壁の継目（別紙 2②）及び下端（別紙 2③）から一時的に重油の染み出しが確認されたため、オイルマットによる対策を実施。
- ・ 7 月 21 日（金） 安定した燃料供給を目的に屋外の燃料タンクから排水機場の間に仮設の燃料配管を敷設しました。
また、定期点検に伴う水位上昇時に備えて排水機場擁壁下端（別紙 2③）に土のうを設置しました。
- ・ 7 月 26 日（水）～ 27 日（木）
排水機場設備の定期点検を実施し、設備に異常がないことを確認しました。
また、点検に伴う水位上昇時に、擁壁等に付着していたと思われる、ごく少量の油の浮き出しを確認しましたが、オイルマットによる回収を行っており、施設敷地外や河川への流出は確認されていません。

- ・ 8 月 2 3 日 (水) 排水機場設備の定期点検を実施し、設備に異常がないことを確認しました。
また、点検に伴う水位上昇時に、擁壁等に付着していたと思われる、ごく少量の油の浮き出しを確認しましたが、オイルマットによる回収を行っており、施設敷地外や河川への流出は確認されていません。
- ・ 9 月 2 0 日 (水) 排水機場設備の定期点検を実施し、設備に異常がないことを確認しました。
なお、油の浮き出しや、流出は確認されませんでした。
- ・ 1 0 月 1 8 日 (水) 排水機場設備の定期点検を実施し、設備に異常がないことを確認しました。
なお、油の浮き出しや、流出は確認されませんでした。
- ・ 1 1 月 1 3 日 (月) 土砂撤去作業では回収が難しい建物周辺に残留している重油を回収するため、ボーリング孔の掘削及び準備工を開始しました。
- ・ 1 2 月 4 日 (月) ボーリング孔の掘削が終了し、重油回収のための準備が完了したことから吸引による重油の回収を開始しました。(別紙 3)
- ・ 1 2 月 1 3 日 (水) 仮置きしていた重油を含んだ土砂の処分を開始し、1 5 日 (金) に大型土のう 1 7 4 袋分全てを撤去しました。
- ・ 1 2 月 2 7 日 (水) 引き続き吸引による重油の回収作業を行うとともに、施設敷地外や河川への流出は確認されていませんが予防措置としてオイルフェンスの設置を継続しています。なお、排水機場の擁壁の継目 (別紙 2 ①②) に見られたごく少量の油の染み出しは現在止まっていますが、予防措置としてパイプ管とオイルマットによる拡散防止対策を行っているところです。
- ・ 3 月 2 5 日 (月) 1 2 月 4 日に開始した吸引による重油回収作業を継続し、約 3 2 0 リットルの重油を回収しました。
重油は漏れた箇所近接した建物周辺で回収されており、施設敷地外や河川への流出は現在確認されていません。(別紙 3)
当初確認されていた排水機場の擁壁の継目 (別紙 2 ①②) からの重油の染み出しは現在止まっていますが、予防措置としてパイプ管とオイルマットによる拡散防止対策を継続して実施しています。

3 今後の対応

吸引による重油の回収作業は順調に進んでおり今後も継続して回収を行っていきます。

次報については、現地作業状況の変化がありましたら随時お知らせします。

なお、引き続き定期的に点検及び監視するとともに、排水機場の樋門周辺のオイルフェンス設置を継続して行います。

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部

- ・ 全般的な問い合わせ

公物管理課 課長 市川 直也 (電話 0155-24-4102)

- ・ 重油回収作業について

帯広河川事務所 副所長 渡邊 智明 (電話 0155-25-1294)

帯広開発建設部ホームページ <https://www.hkd.mlit.go.jp/ob/index.html>

土砂撤去箇所の状況（3/21撮影）




撤去土砂174袋分の搬出後状況（3/21撮影）




オイルフェンス設置状況（3/21撮影）



染み出し対策箇所

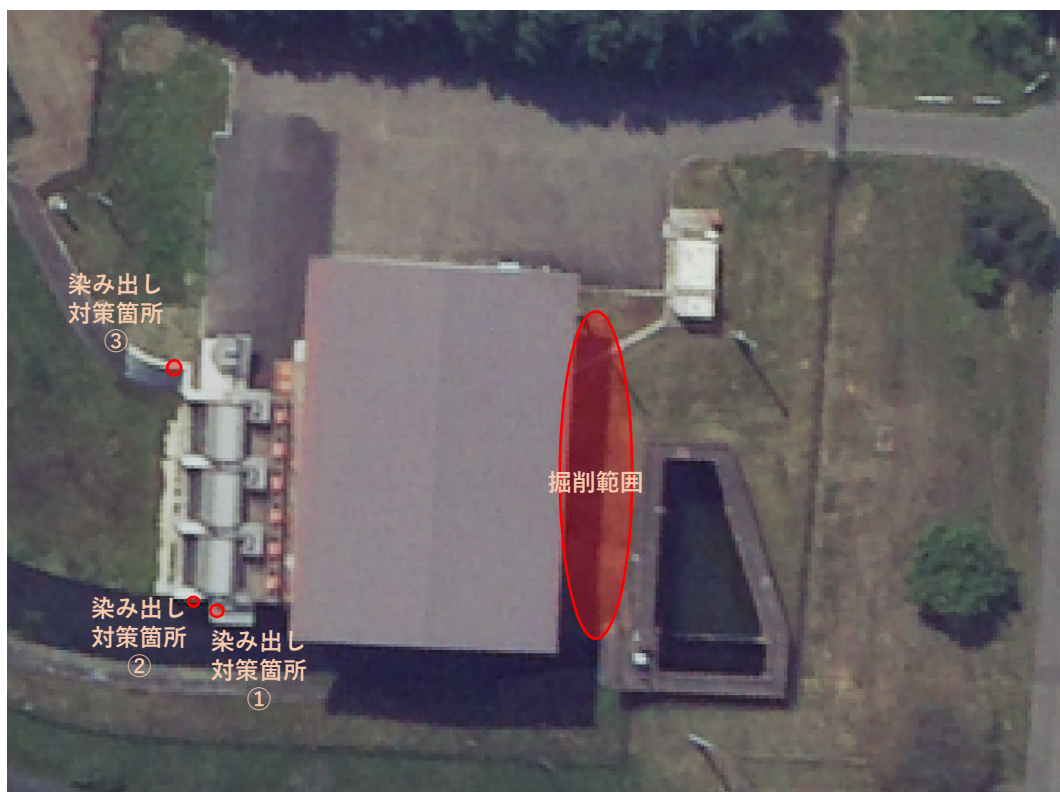

染み出し対策箇所①②の状況
(3/21撮影)

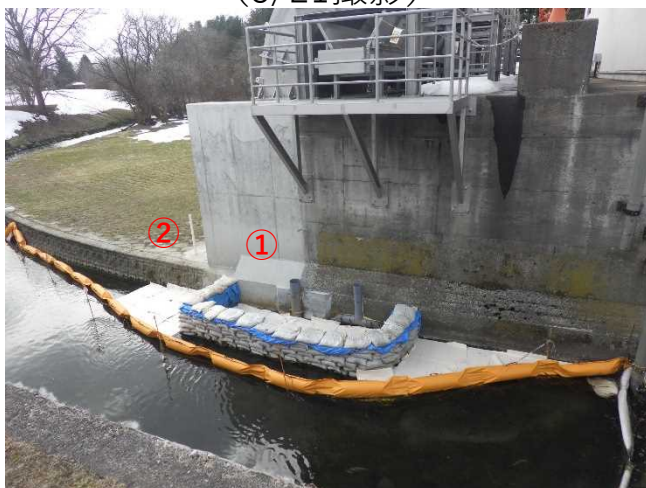

染み出し対策箇所③の状況
(3/21撮影)



現在は染み出しが無い状況

ボーリング孔による重油回収箇所



○：現在、重油が確認されていない箇所

重油回収作業の実施状況

