

石狩川（上流）出水の緊急復旧工事について（第3報）

～平成30年7月6日18：00時点～

石狩川水系石狩川愛別町11線地先において、7月2日からの出水の影響による河岸侵食が発生したため、次の出水に備え、24時間体制で平成30年7月7日（土）中の完了を目指して根固めブロックを投入する等、緊急復旧工事を実施しております。

平成30年7月6日18：00時点の進捗状況をお知らせいたします。

- 水系名 石狩川水系
河川名 石狩川
被災箇所 KP184.0付近左岸（愛別町豊愛橋上流）
被災状況 7月2日からの出水の影響による河岸侵食
着手日時 平成30年7月4日（水）18：30
工事内容 根固ブロック投入 550個
完了見込 平成30年7月7日（土）
進捗率 70%

【問合せ先】

国土交通省 北海道開発局 旭川開発建設部

治水課 課長 横田 尚之（電話番号 0166-32-4234）

旭川河川事務所 所長 高橋 慶久（電話番号 0166-48-2131）

旭川開発建設部ホームページ <http://www.hkd.mlit.go.jp/as>

旭川開発建設部公式 Twitter アカウント @mlit_hkd_as




石狩川(上流)出水の緊急復旧工事について(第3報) 国土交通省

【H30 7/6(金) 18:00時点】

石狩川水系石狩川の国管理区間において、7月2日からの出水の影響による河岸侵食が発生したため、次の出水に備え、24時間体制で平成30年7月7日(土)中の完了を目指して根固めブロックを投入する等、緊急復旧工事を実施しております。



石狩川

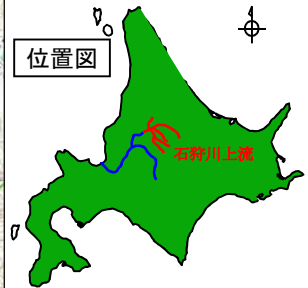

位置図



旭川市



河岸侵食箇所
侵食延長 約130m
愛別町11線地先(豊愛橋上流左岸)



石狩川

- 【凡例】
- X 被災箇所
 - 緊急復旧箇所(工事中)
