

市民団体からの要請による忠別川における堆積土の除去作業の実施について

平成27年5月22日
旭川開発建設部治水課

旭川開発建設部では、河川環境の整備と保全を目的に、忠別川に堆積した土砂の除去作業を実施しました。

実施にあたっての経緯や作業内容は以下のとおりです。

1. 経緯


- あさひかわサケの会をはじめとする地域の市民団体等から、忠別川のサケ産卵床に土砂が堆積していることから、稚魚の解放のため5月中旬を目処に、重機による堆積土砂の除去作業を要請（4/14）
- 専門家による現地確認、意見聴取を実施（5/15）
- 専門家の意見を踏まえ、地域の市民団体等や専門家立ち会いのもと、当該箇所の堆積土砂の除去作業を実施（5/22）

2. 除去作業の概要

- ①実施場所
 - ・別紙参照
- ②実施日時
 - ・平成27年5月22日（金） 13：00～17：00
- ③実施の概要
 - ・重機により、サケ産卵床下流部の土砂を除去し、流水の作用で堆積土砂を排出。
 - ・濁水対策としてシルトフェンスを設置。
 - ・実施にあたって、地域の市民団体等や専門家との協議を行い、その意見を踏まえて実施。

別紙



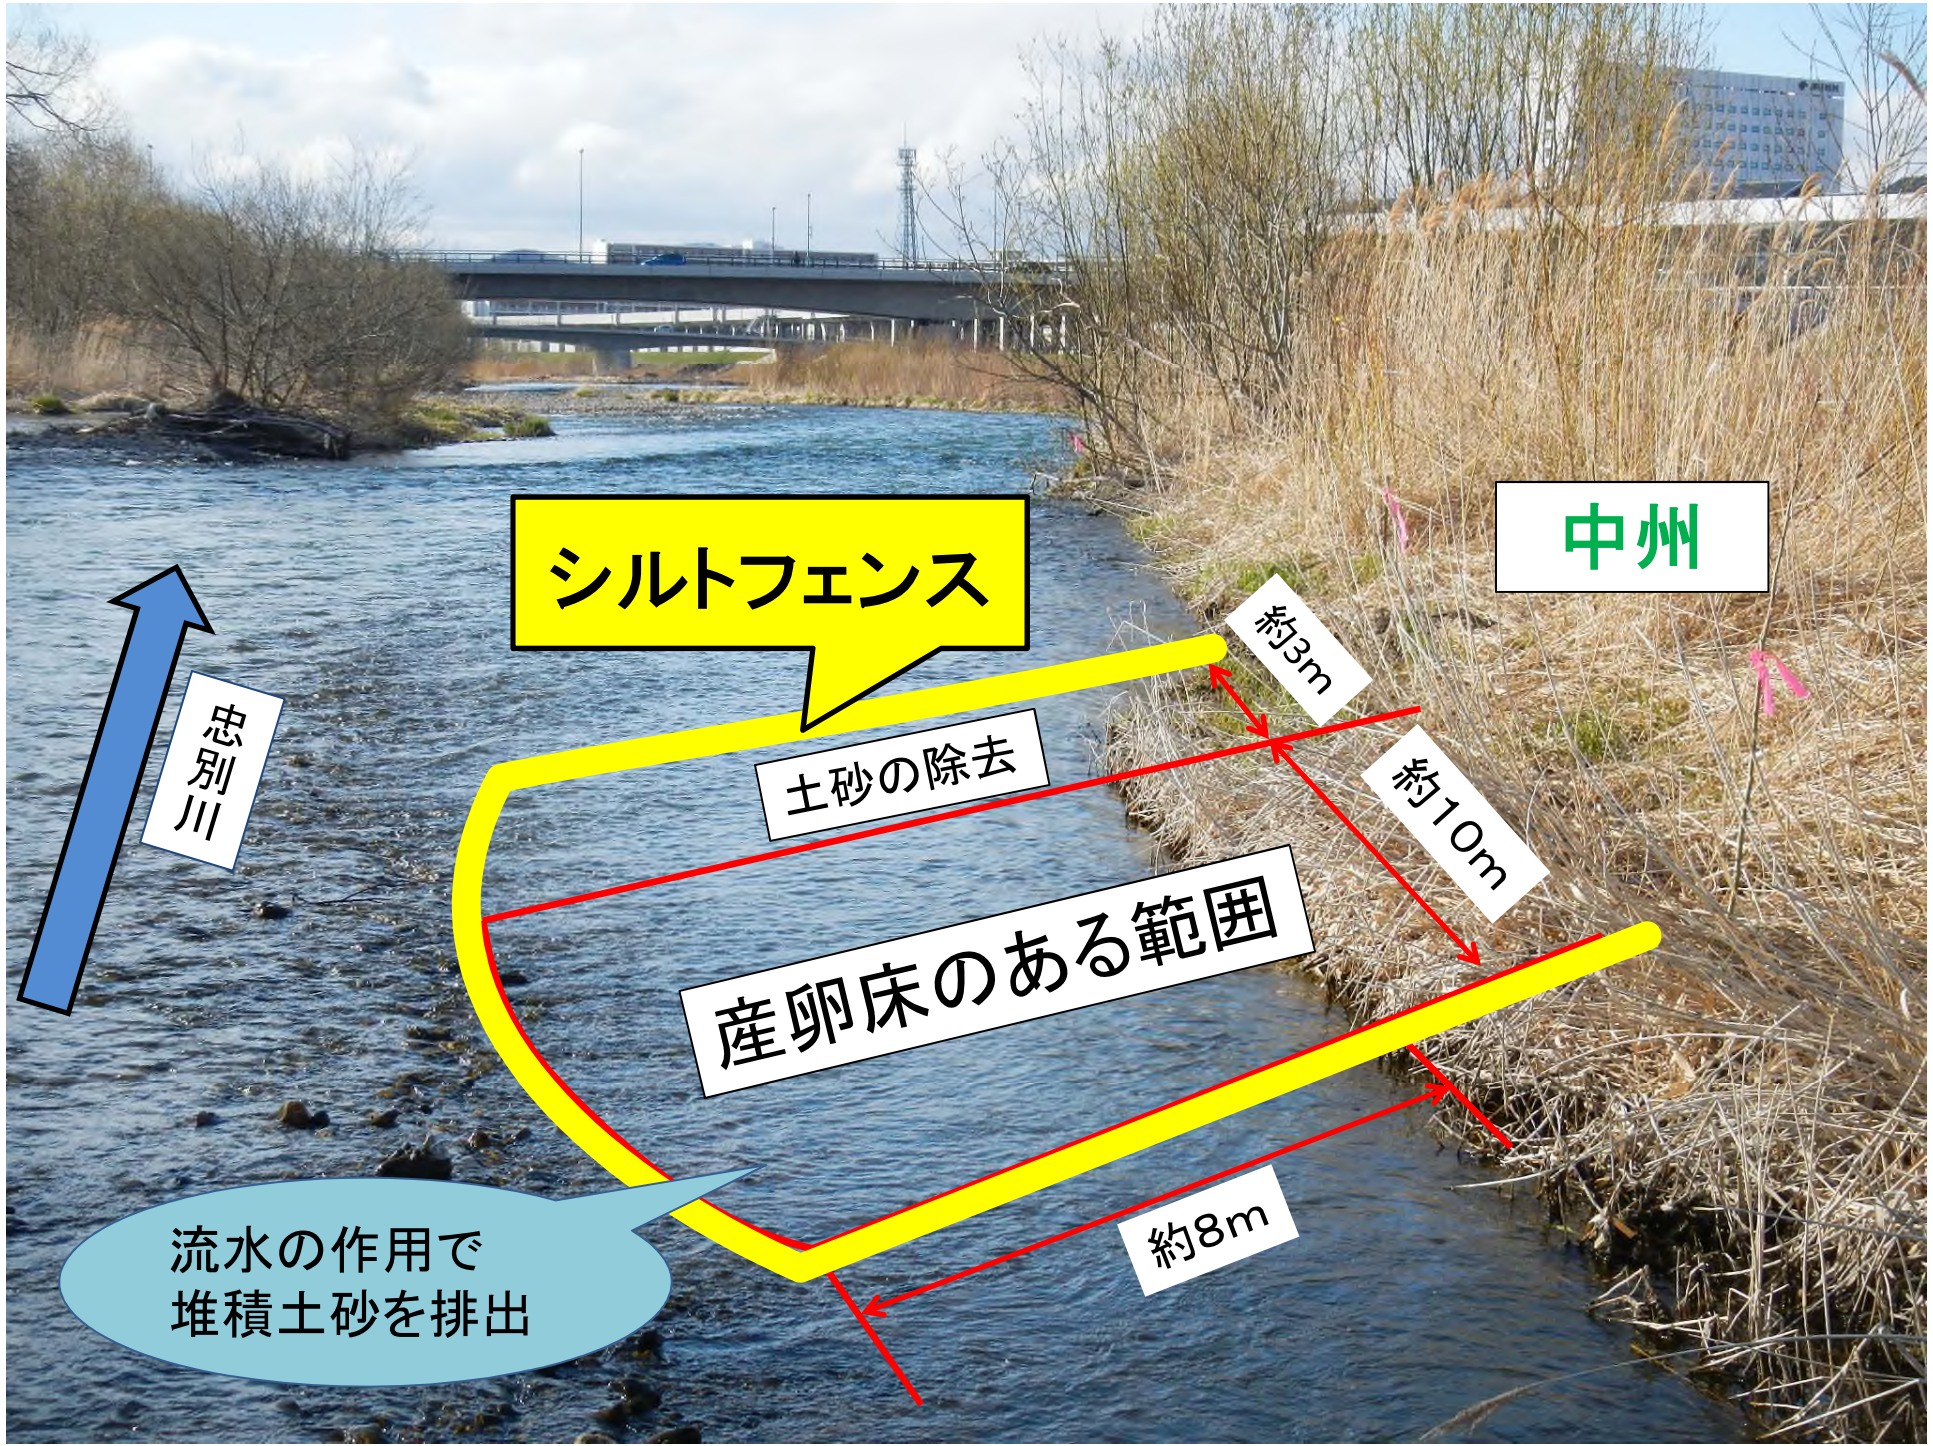

忠別川

シルトフェンス

中州

土砂の除去

産卵床のある範囲

流水の作用で
堆積土砂を排出

約3m

約10m

約8m
