

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道334号 真鯉道路
事業主体	北海道開発局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	<input type="checkbox"/> 便益が費用を上回っている	○費用 ・事業全体：事業費254億円（12億円）、維持管理費4.9億円（0.73億円） ○効果 ①走行時間の短縮等 103億円（24億円） ②災害による被害の回避等 96億円（56億円） ・岩盤崩壊などによる通行止め時の迂回の解消 ・救急搬送の効率化及び遅延の回避 ・余裕時間の短縮 ③地域住民の不安感の解消 282億円（282億円） ・走行時の安心確保・不安解消 ※（ ）内の数値は残事業の効果 ※ 四捨五入の関係で合計値があわない場合がある。 (注1) 事業の効果に記載している金額は、防災面の効果を完成後50年間の便益額として現在価値化して算出した値であり、試算値を含む。 (注2) 費用に記載している金額は、現在価値化して算出した値。

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更）	指標チェックの根拠	
1. 活力 円滑なモビリティの確保	<input type="checkbox"/> 現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率		
	<input type="checkbox"/> 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される		
	<input type="checkbox"/> 現道又は並行区間における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上踏切道の除却もしくは交通改善が期待される		
	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	・利便性向上が期待されるバス路線：知床線、知床エアポートライナー、イーグルライナー ・1日の便数：23便	
	<input type="checkbox"/> 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる		
	<input type="checkbox"/> 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる		
	物流効率化の支援	<input type="checkbox"/> 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	
		<input checked="" type="checkbox"/> 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる	・農林水産業を主体とする自治体：斜里町 【さけ】ウトロ漁港から斜里町→札幌・釧路・根室方面へ。斜里町のさけ・ます漁獲量：29.0千t。全国一位の漁獲量
		<input type="checkbox"/> 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	
	都市の再生	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
<input type="checkbox"/> 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する			
<input type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり			
<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する			
<input type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である			
<input type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する			
<input type="checkbox"/> 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発（300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上）への連絡道路となる			
国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけあり		
	<input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり		

		<input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		<input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	
	個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
		<input type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	・アクセス向上が期待される主な観光地：知床地域（斜里町） ・年間入り込み客数：知床地域 118万人（H23）
		<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	
2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上全ての該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り	
		<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
	安全で安心できる暮らしの確保	<input type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	
3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	<input checked="" type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	・知床峠の冬期通行止め時における、当該道路通行止め時のウトロの孤立化を解消する ・通行止め時のウトロと斜里町間の知床峠経由の大幅な迂回を解消する（通常：33分 迂回 126分）
		<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業5ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	・計画名：北海道緊急輸送道路ネットワーク計画書 ・位置付け：第二次緊急輸送道路
		<input type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	・10箇所の防災点検要対策箇所が解消する
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	・土砂崩落、落石による通行規制17.7km区間を解消
4. 環境	地球環境の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	・CO2排出削減量：602（t-CO2/年）
	生活環境の改善・保全	<input type="checkbox"/> 現道等における自動車からのNO2排出削減率	
		<input type="checkbox"/> 現道等における自動車からのSPM排出削減率	
		<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	
		<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
		<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拵・BP・その他の別
一般国道334号	真鯉道路	L=14.4Km	一次改築	その他

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
3,200	2	北海道開発局

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成25年度		
単純合計	183億円	13億円	196億円
うち残事業分	13億円	1.9億円	15億円
基準年における 現在価値(C)	254億円	4.9億円	259億円
うち残事業分	12億円	0.73億円	13億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成25年度			
供用年	平成29年度			
単年便益 (初年便益)	5.7億円	0.27億円	-0.01億円	6.0億円
基準年における 現在価値(B)	98億円	4.8億円	-0.17億円	103億円
うち残事業分	23億円	1.1億円	0.10億円	24億円

交通状況の変化（事業全体）

様式－3①

事業名：真鯉道路


（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)
①新設・改築道路 【真鯉道路】 14.4km	交通量	[台/日]	3,200	3,200
	走行時間	[分]	26.0	17.4
	走行時間費用	[億円/年]	15.33	10.25
③その他道路合計 26023.9km	走行時間費用	[億円/年]	22,735.22	22,734.99

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：26038.3km	走行時間短縮便益	[億円/年]	22,750.55	22,745.24	5.31

事業名：真鯉道路

(2) 図面 (①、②)に該当する道路を明示すること

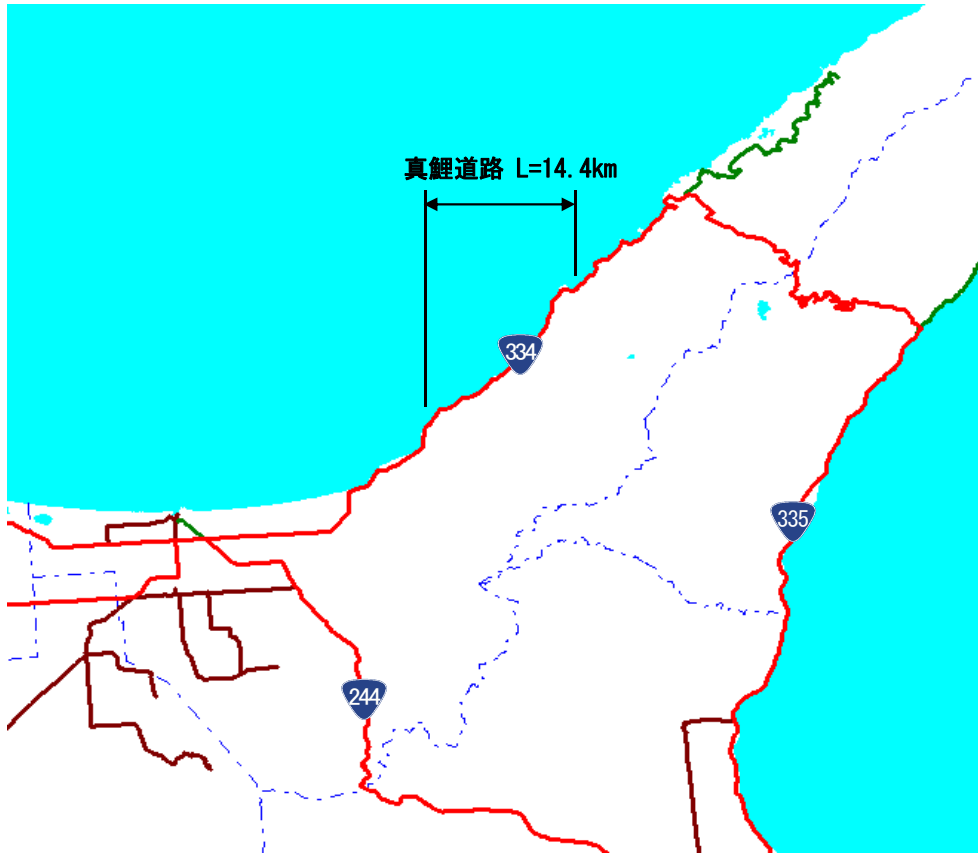

交通状況の変化（残事業）

様式－3①

事業名：真鯉道路


（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)
①新設・改築道路 【真鯉道路】 2.3km	交通量	[台/日]	3,200	3,200
	走行時間	[分]	19.4	17.4
	走行時間費用	[億円/年]	11.45	10.25
③その他道路合計 26036.0km	走行時間費用	[億円/年]	22,735.04	22,734.99

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：26038.3km	走行時間短縮便益	[億円/年]	22,746.49	22,745.24	1.25

事業名：真鯉道路

(2) 図面 (①、②)に該当する道路を明示すること)

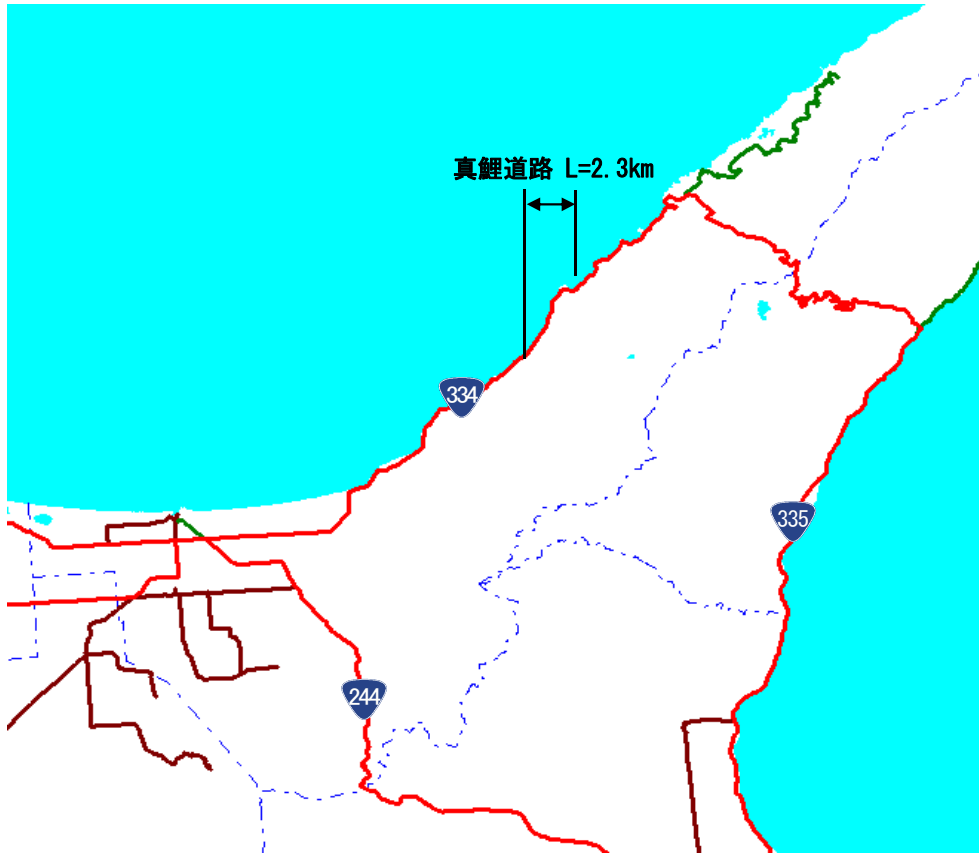

費用便益分析の条件

事業名：真鯉道路

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成25年	
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H42)	
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	いずれかのみ推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載	
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H17センサス)	
	その他()	<input type="checkbox"/>	
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
	有	<input type="checkbox"/>	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)			
その他()		<input type="checkbox"/>	
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載 交通容量未滿・以上の路線が混在した配分結果となっているため、便益算出においては、速度差の生ずる加重平均速度を用いた。		
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>	
採用理由を記載			
その他()		<input type="checkbox"/>	

交通流推計

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数	() %
	休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載			
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数	() 日
			採用した通行止め日数の考え方を記載	
	とり止め交通の考慮する		<input type="checkbox"/>	
	とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載			
	冬期交通の影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
		考慮する	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数	(121) 日
採用した冬期日数の考え方を記載				
北海道における気温や初雪、積雪状況等の出現状況や冬期通行規制期間を踏まえ、4ヶ月と設定。				
冬期の走行速度と交通容量の関係				
設定の考え方を記載				
Vmax、Vminについて低減。				
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ()	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
その他				

費用の現在価値算定表(事業全体)

箇所名:一般国道334号 真經道路

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
				0.019	14.4	0.27	
-29年目	S 63	2.6658	101.5	0.91	2.19	0.00	0.00
-28年目	H 1	2.5633	104.2	1.49	3.37	0.00	0.00
-27年目	H 2	2.4647	106.5	1.83	3.89	0.00	0.00
-26年目	H 3	2.3699	109.1	3.08	6.17	0.00	0.00
-25年目	H 4	2.2788	110.6	10.37	19.68	0.00	0.00
-24年目	H 5	2.1911	110.9	10.19	18.54	0.00	0.00
-23年目	H 6	2.1068	110.8	10.67	18.69	0.00	0.00
-22年目	H 7	2.0258	109.9	10.12	17.18	0.00	0.00
-21年目	H 8	1.9479	109.5	7.21	11.81	0.00	0.00
-20年目	H 9	1.8730	110.4	3.37	5.26	0.00	0.00
-19年目	H 10	1.8009	109.9	10.48	15.81	0.00	0.00
-18年目	H 11	1.7317	108.4	1.62	2.38	0.00	0.00
-17年目	H 12	1.6651	107.2	3.30	4.72	0.00	0.00
-16年目	H 13	1.6010	105.7	5.05	7.04	0.00	0.00
-15年目	H 14	1.5395	103.8	3.54	4.84	0.00	0.00
-14年目	H 15	1.4802	102.3	1.32	1.77	0.00	0.00
-13年目	H 16	1.4233	101.0	10.76	13.97	0.00	0.00
-12年目	H 17	1.3686	99.6	2.67	3.38	0.00	0.00
-11年目	H 18	1.3159	98.7	6.64	8.15	0.00	0.00
-10年目	H 19	1.2653	97.6	6.20	7.41	0.00	0.00
-9年目	H 20	1.2167	96.8	15.20	17.60	0.00	0.00
-8年目	H 21	1.1699	95.6	14.53	16.38	0.00	0.00
-7年目	H 22	1.1249	93.7	7.87	8.71	0.00	0.00
-6年目	H 23	1.0816	92.1	9.00	9.74	0.00	0.00
-5年目	H 24	1.0400	92.1	7.32	7.61	0.00	0.00
-4年目	H 25	1.0000	92.1	5.14	5.14	0.00	0.00
-3年目	H 26	0.9615	92.1	6.61	6.35	0.00	0.00
-2年目	H 27	0.9246	92.1	4.20	3.88	0.00	0.00
-1年目	H 28	0.8890	92.1	2.56	2.28	0.00	0.00
供用開始年	H 29	0.8548	92.1	0.00	0.00	0.26	0.22
1年目	H 30	0.8219	92.1	0.00	0.00	0.26	0.21
2年目	H 31	0.7903	92.1	0.00	0.00	0.26	0.20
3年目	H 32	0.7599	92.1	0.00	0.00	0.26	0.20
4年目	H 33	0.7307	92.1	0.00	0.00	0.26	0.19
5年目	H 34	0.7026	92.1	0.00	0.00	0.26	0.18
6年目	H 35	0.6756	92.1	0.00	0.00	0.26	0.17
7年目	H 36	0.6496	92.1	0.00	0.00	0.26	0.17
8年目	H 37	0.6246	92.1	0.00	0.00	0.26	0.16
9年目	H 38	0.6006	92.1	0.00	0.00	0.26	0.15
10年目	H 39	0.5775	92.1	0.00	0.00	0.26	0.15
11年目	H 40	0.5553	92.1	0.00	0.00	0.26	0.14
12年目	H 41	0.5339	92.1	0.00	0.00	0.26	0.14
13年目	H 42	0.5134	92.1	0.00	0.00	0.26	0.13
14年目	H 43	0.4936	92.1	0.00	0.00	0.26	0.13
15年目	H 44	0.4746	92.1	0.00	0.00	0.26	0.12
16年目	H 45	0.4564	92.1	0.00	0.00	0.26	0.12
17年目	H 46	0.4388	92.1	0.00	0.00	0.26	0.11
18年目	H 47	0.4220	92.1	0.00	0.00	0.26	0.11
19年目	H 48	0.4057	92.1	0.00	0.00	0.26	0.10
20年目	H 49	0.3901	92.1	0.00	0.00	0.26	0.10
21年目	H 50	0.3751	92.1	0.00	0.00	0.26	0.10
22年目	H 51	0.3607	92.1	0.00	0.00	0.26	0.09
23年目	H 52	0.3468	92.1	0.00	0.00	0.26	0.09
24年目	H 53	0.3335	92.1	0.00	0.00	0.26	0.09
25年目	H 54	0.3207	92.1	0.00	0.00	0.26	0.08
26年目	H 55	0.3083	92.1	0.00	0.00	0.26	0.08
27年目	H 56	0.2965	92.1	0.00	0.00	0.26	0.08
28年目	H 57	0.2851	92.1	0.00	0.00	0.26	0.07
29年目	H 58	0.2741	92.1	0.00	0.00	0.26	0.07
30年目	H 59	0.2636	92.1	0.00	0.00	0.26	0.07
31年目	H 60	0.2534	92.1	0.00	0.00	0.26	0.07
32年目	H 61	0.2437	92.1	0.00	0.00	0.26	0.06
33年目	H 62	0.2343	92.1	0.00	0.00	0.26	0.06
34年目	H 63	0.2253	92.1	0.00	0.00	0.26	0.06
35年目	H 64	0.2166	92.1	0.00	0.00	0.26	0.06
36年目	H 65	0.2083	92.1	0.00	0.00	0.26	0.05
37年目	H 66	0.2003	92.1	0.00	0.00	0.26	0.05
38年目	H 67	0.1926	92.1	0.00	0.00	0.26	0.05
39年目	H 68	0.1852	92.1	0.00	0.00	0.26	0.05
40年目	H 69	0.1780	92.1	0.00	0.00	0.26	0.05
41年目	H 70	0.1712	92.1	0.00	0.00	0.26	0.04
42年目	H 71	0.1646	92.1	0.00	0.00	0.26	0.04
43年目	H 72	0.1583	92.1	0.00	0.00	0.26	0.04
44年目	H 73	0.1522	92.1	0.00	0.00	0.26	0.04
45年目	H 74	0.1463	92.1	0.00	0.00	0.26	0.04
46年目	H 75	0.1407	92.1	0.00	0.00	0.26	0.04
47年目	H 76	0.1353	92.1	0.00	0.00	0.26	0.03
48年目	H 77	0.1301	92.1	0.00	0.00	0.26	0.03
49年目	H 78	0.1251	92.1	-2.44	-0.30	0.26	0.03
合計				180.82	253.64	12.86	4.91

単純事業費計		183.26	12.86
--------	--	--------	-------

注1) 事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表(残事業)

箇所名: 一般国道334号 真鯉道路

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
				0.017	2.3	0.04	
-3年目	H 26	0.9615	92.1	6.61	6.35	0.00	0.00
-2年目	H 27	0.9246	92.1	4.20	3.88	0.00	0.00
-1年目	H 28	0.8890	92.1	2.56	2.28	0.00	0.00
供用開始年	H 29	0.8548	92.1	0.00	0.00	0.04	0.03
1年目	H 30	0.8219	92.1	0.00	0.00	0.04	0.03
2年目	H 31	0.7903	92.1	0.00	0.00	0.04	0.03
3年目	H 32	0.7599	92.1	0.00	0.00	0.04	0.03
4年目	H 33	0.7307	92.1	0.00	0.00	0.04	0.03
5年目	H 34	0.7026	92.1	0.00	0.00	0.04	0.03
6年目	H 35	0.6756	92.1	0.00	0.00	0.04	0.03
7年目	H 36	0.6496	92.1	0.00	0.00	0.04	0.02
8年目	H 37	0.6246	92.1	0.00	0.00	0.04	0.02
9年目	H 38	0.6006	92.1	0.00	0.00	0.04	0.02
10年目	H 39	0.5775	92.1	0.00	0.00	0.04	0.02
11年目	H 40	0.5553	92.1	0.00	0.00	0.04	0.02
12年目	H 41	0.5339	92.1	0.00	0.00	0.04	0.02
13年目	H 42	0.5134	92.1	0.00	0.00	0.04	0.02
14年目	H 43	0.4936	92.1	0.00	0.00	0.04	0.02
15年目	H 44	0.4746	92.1	0.00	0.00	0.04	0.02
16年目	H 45	0.4564	92.1	0.00	0.00	0.04	0.02
17年目	H 46	0.4388	92.1	0.00	0.00	0.04	0.02
18年目	H 47	0.4220	92.1	0.00	0.00	0.04	0.02
19年目	H 48	0.4057	92.1	0.00	0.00	0.04	0.02
20年目	H 49	0.3901	92.1	0.00	0.00	0.04	0.01
21年目	H 50	0.3751	92.1	0.00	0.00	0.04	0.01
22年目	H 51	0.3607	92.1	0.00	0.00	0.04	0.01
23年目	H 52	0.3468	92.1	0.00	0.00	0.04	0.01
24年目	H 53	0.3335	92.1	0.00	0.00	0.04	0.01
25年目	H 54	0.3207	92.1	0.00	0.00	0.04	0.01
26年目	H 55	0.3083	92.1	0.00	0.00	0.04	0.01
27年目	H 56	0.2965	92.1	0.00	0.00	0.04	0.01
28年目	H 57	0.2851	92.1	0.00	0.00	0.04	0.01
29年目	H 58	0.2741	92.1	0.00	0.00	0.04	0.01
30年目	H 59	0.2636	92.1	0.00	0.00	0.04	0.01
31年目	H 60	0.2534	92.1	0.00	0.00	0.04	0.01
32年目	H 61	0.2437	92.1	0.00	0.00	0.04	0.01
33年目	H 62	0.2343	92.1	0.00	0.00	0.04	0.01
34年目	H 63	0.2253	92.1	0.00	0.00	0.04	0.01
35年目	H 64	0.2166	92.1	0.00	0.00	0.04	0.01
36年目	H 65	0.2083	92.1	0.00	0.00	0.04	0.01
37年目	H 66	0.2003	92.1	0.00	0.00	0.04	0.01
38年目	H 67	0.1926	92.1	0.00	0.00	0.04	0.01
39年目	H 68	0.1852	92.1	0.00	0.00	0.04	0.01
40年目	H 69	0.1780	92.1	0.00	0.00	0.04	0.01
41年目	H 70	0.1712	92.1	0.00	0.00	0.04	0.01
42年目	H 71	0.1646	92.1	0.00	0.00	0.04	0.01
43年目	H 72	0.1583	92.1	0.00	0.00	0.04	0.01
44年目	H 73	0.1522	92.1	0.00	0.00	0.04	0.01
45年目	H 74	0.1463	92.1	0.00	0.00	0.04	0.01
46年目	H 75	0.1407	92.1	0.00	0.00	0.04	0.01
47年目	H 76	0.1353	92.1	0.00	0.00	0.04	0.01
48年目	H 77	0.1301	92.1	0.00	0.00	0.04	0.00
49年目	H 78	0.1251	92.1	-1.72	-0.22	0.04	0.00
合計				11.65	12.30	1.90	0.73

単純事業費計		13.37	1.90
--------	--	-------	------

注1) 事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表(事業全体)

箇所名:一般国道334号 真鯉道路

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (北海道ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)				走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)		合計 (億円)			
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 29	0.99462	0.98512	0.99462	0.99319	0.8548	92.1	3.95	1.11	0.67	5.74	4.90	0.15	0.05	0.07	0.27	0.23	-0.01	-0.01	6.00	5.13
1年目	H 30	0.99459	0.98489	0.99459	0.99314	0.8219	92.1	3.93	1.09	0.67	5.69	4.68	0.15	0.05	0.07	0.27	0.22	-0.01	-0.01	5.95	4.89
2年目	H 31	0.99456	0.98466	0.99456	0.99309	0.7903	92.1	3.91	1.08	0.67	5.65	4.47	0.15	0.05	0.07	0.27	0.21	-0.01	-0.01	5.91	4.67
3年目	H 32	0.99507	0.98889	1.00084	0.99498	0.7599	92.1	3.89	1.06	0.66	5.61	4.26	0.15	0.05	0.07	0.27	0.20	-0.01	-0.01	5.87	4.46
4年目	H 33	0.99505	0.98877	1.00084	0.99496	0.7307	92.1	3.87	1.05	0.66	5.58	4.08	0.15	0.04	0.07	0.27	0.19	-0.01	-0.01	5.84	4.26
5年目	H 34	0.99502	0.98864	1.00083	0.99493	0.7026	92.1	3.85	1.04	0.66	5.55	3.90	0.15	0.04	0.07	0.26	0.19	-0.01	-0.01	5.80	4.08
6年目	H 35	0.99500	0.98851	1.00083	0.99490	0.6756	92.1	3.83	1.02	0.66	5.52	3.73	0.15	0.04	0.07	0.26	0.18	-0.01	-0.01	5.77	3.90
7年目	H 36	0.99497	0.98838	1.00083	0.99488	0.6496	92.1	3.81	1.01	0.67	5.49	3.57	0.15	0.04	0.07	0.26	0.17	-0.01	-0.01	5.74	3.73
8年目	H 37	0.99495	0.98824	1.00083	0.99485	0.6246	92.1	3.79	1.00	0.67	5.46	3.41	0.15	0.04	0.07	0.26	0.16	-0.01	-0.01	5.71	3.57
9年目	H 38	0.99492	0.98810	1.00083	0.99483	0.6006	92.1	3.77	0.99	0.67	5.43	3.26	0.15	0.04	0.07	0.26	0.16	-0.01	-0.01	5.68	3.41
10年目	H 39	0.99490	0.98796	1.00083	0.99480	0.5775	92.1	3.75	0.98	0.67	5.40	3.12	0.14	0.04	0.07	0.26	0.15	-0.01	-0.01	5.65	3.26
11年目	H 40	0.99487	0.98781	1.00083	0.99477	0.5553	92.1	3.74	0.96	0.67	5.37	2.98	0.14	0.04	0.07	0.26	0.14	-0.01	-0.01	5.62	3.12
12年目	H 41	0.99485	0.98766	1.00083	0.99474	0.5339	92.1	3.72	0.95	0.67	5.34	2.85	0.14	0.04	0.07	0.26	0.14	-0.01	0.00	5.58	2.98
13年目	H 42	0.99206	0.99278	1.00104	0.99351	0.5134	92.1	3.70	0.94	0.67	5.31	2.72	0.14	0.04	0.07	0.25	0.13	-0.01	0.00	5.55	2.85
14年目	H 43	0.99200	0.99273	1.00104	0.99347	0.4936	92.1	3.67	0.93	0.67	5.27	2.60	0.14	0.04	0.07	0.25	0.12	-0.01	0.00	5.52	2.72
15年目	H 44	0.99194	0.99268	1.00104	0.99343	0.4746	92.1	3.64	0.93	0.67	5.24	2.49	0.14	0.04	0.07	0.25	0.12	-0.01	0.00	5.48	2.60
16年目	H 45	0.99187	0.99262	1.00104	0.99339	0.4564	92.1	3.61	0.92	0.67	5.20	2.37	0.14	0.04	0.07	0.25	0.11	-0.01	0.00	5.44	2.48
17年目	H 46	0.99180	0.99257	1.00104	0.99334	0.4388	92.1	3.58	0.91	0.67	5.17	2.27	0.14	0.04	0.07	0.25	0.11	-0.01	0.00	5.41	2.37
18年目	H 47	0.99174	0.99251	1.00104	0.99330	0.4220	92.1	3.55	0.91	0.67	5.13	2.16	0.14	0.04	0.07	0.25	0.10	-0.01	0.00	5.37	2.27
19年目	H 48	0.99167	0.99246	1.00104	0.99325	0.4057	92.1	3.52	0.90	0.67	5.09	2.07	0.14	0.04	0.07	0.25	0.10	-0.01	0.00	5.33	2.16
20年目	H 49	0.99160	0.99240	1.00104	0.99321	0.3901	92.1	3.49	0.89	0.67	5.06	1.97	0.13	0.04	0.07	0.25	0.10	-0.01	0.00	5.30	2.07
21年目	H 50	0.99153	0.99234	1.00104	0.99316	0.3751	92.1	3.46	0.89	0.67	5.02	1.88	0.13	0.04	0.07	0.24	0.09	-0.01	0.00	5.26	1.97
22年目	H 51	0.99145	0.99228	1.00103	0.99311	0.3607	92.1	3.43	0.88	0.67	4.99	1.80	0.13	0.04	0.07	0.24	0.09	-0.01	0.00	5.22	1.88
23年目	H 52	0.99138	0.99222	1.00103	0.99306	0.3468	92.1	3.40	0.87	0.68	4.95	1.72	0.13	0.04	0.07	0.24	0.08	-0.01	0.00	5.19	1.80
24年目	H 53	0.99130	0.99216	1.00103	0.99302	0.3335	92.1	3.37	0.87	0.68	4.92	1.64	0.13	0.04	0.07	0.24	0.08	-0.01	0.00	5.15	1.72
25年目	H 54	0.99123	0.99210	1.00103	0.99297	0.3207	92.1	3.35	0.86	0.68	4.88	1.57	0.13	0.04	0.07	0.24	0.08	-0.01	0.00	5.11	1.64
26年目	H 55	0.99115	0.99204	1.00103	0.99292	0.3083	92.1	3.32	0.85	0.68	4.85	1.49	0.13	0.04	0.07	0.24	0.07	-0.01	0.00	5.08	1.56
27年目	H 56	0.99107	0.99197	1.00103	0.99287	0.2965	92.1	3.29	0.85	0.68	4.81	1.43	0.13	0.04	0.07	0.24	0.07	-0.01	0.00	5.04	1.49
28年目	H 57	0.99099	0.99191	1.00103	0.99282	0.2851	92.1	3.26	0.84	0.68	4.78	1.36	0.13	0.04	0.07	0.23	0.07	-0.01	0.00	5.00	1.43
29年目	H 58	0.99091	0.99184	1.00103	0.99276	0.2741	92.1	3.23	0.83	0.68	4.74	1.30	0.12	0.04	0.07	0.23	0.06	-0.01	0.00	4.96	1.36
30年目	H 59	0.99083	0.99177	1.00103	0.99271	0.2636	92.1	3.20	0.83	0.68	4.70	1.24	0.12	0.04	0.07	0.23	0.06	-0.01	0.00	4.93	1.30
31年目	H 60	0.99074	0.99171	1.00102	0.99266	0.2534	92.1	3.17	0.82	0.68	4.67	1.18	0.12	0.03	0.07	0.23	0.06	-0.01	0.00	4.89	1.24
32年目	H 61	0.99065	0.99164	1.00102	0.99260	0.2437	92.1	3.14	0.81	0.68	4.63	1.13	0.12	0.03	0.07	0.23	0.06	-0.01	0.00	4.85	1.18
33年目	H 62	0.99057	0.99157	1.00102	0.99255	0.2343	92.1	3.11	0.81	0.68	4.60	1.08	0.12	0.03	0.07	0.23	0.05	-0.01	0.00	4.82	1.13
34年目	H 63	0.99048	0.99149	1.00102	0.99249	0.2253	92.1	3.08	0.80	0.68	4.56	1.03	0.12	0.03	0.07	0.23	0.05	-0.01	0.00	4.78	1.08
35年目	H 64	0.99038	0.99142	1.00102	0.99244	0.2166	92.1	3.05	0.79	0.68	4.53	0.98	0.12	0.03	0.07	0.22	0.05	-0.01	0.00	4.74	1.03
36年目	H 65	0.99029	0.99135	1.00102	0.99238	0.2083	92.1	3.02	0.79	0.68	4.49	0.94	0.12	0.03	0.07	0.22	0.05	-0.01	0.00	4.71	0.98
37年目	H 66	0.99020	0.99127	1.00102	0.99232	0.2003	92.1	2.99	0.78	0.69	4.46	0.89	0.12	0.03	0.07	0.22	0.04	-0.01	0.00	4.67	0.94
38年目	H 67	0.99010	0.99120	1.00102	0.99226	0.1926	92.1	2.96	0.77	0.69	4.42	0.85	0.11	0.03	0.07	0.22	0.04	-0.01	0.00	4.63	0.89
39年目	H 68	0.99000	0.99112	1.00102	0.99220	0.1852	92.1	2.93	0.76	0.69	4.39	0.81	0.11	0.03	0.07	0.22	0.04	-0.01	0.00	4.60	0.85
40年目	H 69	0.98990	0.99104	1.00101	0.99214	0.1780	92.1	2.90	0.76	0.69	4.35	0.77	0.11	0.03	0.07	0.22	0.04	-0.01	0.00	4.56	0.81
41年目	H 70	0.98980	0.99096	1.00101	0.99208	0.1712	92.1	2.88	0.75	0.69	4.31	0.74	0.11	0.03	0.07	0.22	0.04	-0.01	0.00	4.52	0.77
42年目	H 71	0.98969	0.99087	1.00101	0.99201	0.1646	92.1	2.85	0.74	0.69	4.28	0.70	0.11	0.03	0.07	0.22	0.04	-0.01	0.00	4.49	0.74
43年目	H 72	0.98958	0.99079	1.00101	0.99195	0.1583	92.1	2.82	0.74	0.69	4.24	0.67	0.11	0.03	0.07	0.21	0.03	-0.01	0.00	4.45	0.70
44年目	H 73	0.98947	0.99070	1.00101	0.99188	0.1522	92.1	2.79	0.73	0.69	4.21	0.64	0.11	0.03	0.07	0.21	0.03	-0.01	0.00	4.41	0.67
45年目	H 74	0.98936	0.99062	1.00101	0.99182	0.1463	92.1	2.76	0.72	0.69	4.17	0.61	0.11	0.03	0.07	0.21	0.03	-0.01	0.00	4.38	0.64
46年目	H 75	0.98925	0.99053	1.00101	0.99175	0.1407	92.1	2.73	0.72	0.69	4.14	0.58	0.10	0.03	0.07	0.21	0.03	-0.01	0.00	4.34	0.61
47年目	H 76	0.98913	0.99044	1.00101	0.99168	0.1353	92.1	2.70	0.71	0.69	4.10	0.56	0.10	0.03	0.07	0.21	0.03	-0.01	0.00	4.30	0.58
48年目	H 77	0.98901	0.99035	1.00101	0.99161	0.1301	92.1	2.67	0.70												

便益の現在価値算定表(残事業)

箇所名:一般国道334号 真鯉道路

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (北海道ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	割引率4%
供用開始年次	H 29	0.99462	0.98512	0.99462	0.99319	0.8548	92.1	0.94	0.25	0.16	1.35	1.15	0.04	0.01	0.02	0.06	0.05	0.01	0.00	1.41	1.21
1年目	H 30	0.99459	0.98489	0.99459	0.99314	0.8219	92.1	0.93	0.24	0.16	1.34	1.10	0.04	0.01	0.02	0.06	0.05	0.01	0.00	1.40	1.15
2年目	H 31	0.99456	0.98466	0.99456	0.99309	0.7903	92.1	0.93	0.24	0.16	1.33	1.05	0.04	0.01	0.02	0.06	0.05	0.01	0.00	1.39	1.10
3年目	H 32	0.99507	0.98889	1.00084	0.99498	0.7599	92.1	0.92	0.24	0.16	1.32	1.00	0.04	0.01	0.02	0.06	0.05	0.01	0.00	1.38	1.05
4年目	H 33	0.99505	0.98877	1.00084	0.99496	0.7307	92.1	0.92	0.23	0.16	1.31	0.96	0.04	0.01	0.02	0.06	0.04	0.01	0.00	1.38	1.01
5年目	H 34	0.99502	0.98864	1.00083	0.99493	0.7026	92.1	0.92	0.23	0.16	1.30	0.92	0.04	0.01	0.02	0.06	0.04	0.01	0.00	1.37	0.96
6年目	H 35	0.99500	0.98851	1.00083	0.99490	0.6756	92.1	0.91	0.23	0.16	1.30	0.88	0.04	0.01	0.02	0.06	0.04	0.01	0.00	1.36	0.92
7年目	H 36	0.99497	0.98838	1.00083	0.99488	0.6496	92.1	0.91	0.23	0.16	1.29	0.84	0.04	0.01	0.02	0.06	0.04	0.01	0.00	1.35	0.88
8年目	H 37	0.99495	0.98824	1.00083	0.99485	0.6246	92.1	0.90	0.22	0.16	1.28	0.80	0.04	0.01	0.02	0.06	0.04	0.01	0.00	1.35	0.84
9年目	H 38	0.99492	0.98810	1.00083	0.99483	0.6006	92.1	0.90	0.22	0.16	1.28	0.77	0.04	0.01	0.02	0.06	0.04	0.01	0.00	1.34	0.80
10年目	H 39	0.99490	0.98796	1.00083	0.99480	0.5775	92.1	0.89	0.22	0.16	1.27	0.73	0.04	0.01	0.02	0.06	0.03	0.01	0.00	1.33	0.77
11年目	H 40	0.99487	0.98781	1.00083	0.99477	0.5553	92.1	0.89	0.21	0.16	1.26	0.70	0.04	0.01	0.02	0.06	0.03	0.01	0.00	1.33	0.74
12年目	H 41	0.99485	0.98766	1.00083	0.99474	0.5339	92.1	0.88	0.21	0.16	1.25	0.67	0.04	0.01	0.02	0.06	0.03	0.01	0.00	1.32	0.70
13年目	H 42	0.99206	0.99278	1.00104	0.99351	0.5134	92.1	0.88	0.21	0.16	1.25	0.64	0.03	0.01	0.02	0.06	0.03	0.01	0.00	1.31	0.67
14年目	H 43	0.99200	0.99273	1.00104	0.99347	0.4936	92.1	0.87	0.21	0.16	1.24	0.61	0.03	0.01	0.02	0.06	0.03	0.01	0.00	1.30	0.64
15年目	H 44	0.99194	0.99268	1.00104	0.99343	0.4746	92.1	0.86	0.21	0.16	1.23	0.58	0.03	0.01	0.02	0.06	0.03	0.01	0.00	1.29	0.61
16年目	H 45	0.99187	0.99262	1.00104	0.99339	0.4564	92.1	0.86	0.21	0.16	1.22	0.56	0.03	0.01	0.02	0.06	0.03	0.01	0.00	1.28	0.59
17年目	H 46	0.99180	0.99257	1.00104	0.99334	0.4388	92.1	0.85	0.20	0.16	1.21	0.53	0.03	0.01	0.02	0.06	0.02	0.01	0.00	1.28	0.56
18年目	H 47	0.99174	0.99251	1.00104	0.99330	0.4220	92.1	0.84	0.20	0.16	1.21	0.51	0.03	0.01	0.02	0.06	0.02	0.01	0.00	1.27	0.53
19年目	H 48	0.99167	0.99246	1.00104	0.99325	0.4057	92.1	0.84	0.20	0.16	1.20	0.49	0.03	0.01	0.02	0.06	0.02	0.01	0.00	1.26	0.51
20年目	H 49	0.99160	0.99240	1.00104	0.99321	0.3901	92.1	0.83	0.20	0.16	1.19	0.46	0.03	0.01	0.02	0.06	0.02	0.01	0.00	1.25	0.49
21年目	H 50	0.99153	0.99234	1.00104	0.99316	0.3751	92.1	0.82	0.20	0.16	1.18	0.44	0.03	0.01	0.02	0.06	0.02	0.01	0.00	1.24	0.47
22年目	H 51	0.99145	0.99228	1.00103	0.99311	0.3607	92.1	0.82	0.20	0.16	1.17	0.42	0.03	0.01	0.02	0.05	0.02	0.00	0.00	1.23	0.44
23年目	H 52	0.99138	0.99222	1.00103	0.99306	0.3468	92.1	0.81	0.19	0.16	1.16	0.40	0.03	0.01	0.02	0.05	0.02	0.00	0.00	1.22	0.42
24年目	H 53	0.99130	0.99216	1.00103	0.99302	0.3335	92.1	0.80	0.19	0.16	1.16	0.39	0.03	0.01	0.02	0.05	0.02	0.00	0.00	1.22	0.41
25年目	H 54	0.99123	0.99210	1.00103	0.99297	0.3207	92.1	0.80	0.19	0.16	1.15	0.37	0.03	0.01	0.02	0.05	0.02	0.00	0.00	1.21	0.39
26年目	H 55	0.99115	0.99204	1.00103	0.99292	0.3083	92.1	0.79	0.19	0.16	1.14	0.35	0.03	0.01	0.02	0.05	0.02	0.00	0.00	1.20	0.37
27年目	H 56	0.99107	0.99197	1.00103	0.99287	0.2965	92.1	0.78	0.19	0.16	1.13	0.34	0.03	0.01	0.02	0.05	0.02	0.00	0.00	1.19	0.35
28年目	H 57	0.99099	0.99191	1.00103	0.99282	0.2851	92.1	0.77	0.19	0.16	1.12	0.32	0.03	0.01	0.02	0.05	0.02	0.00	0.00	1.18	0.34
29年目	H 58	0.99091	0.99184	1.00103	0.99276	0.2741	92.1	0.77	0.19	0.16	1.11	0.31	0.03	0.01	0.02	0.05	0.01	0.00	0.00	1.17	0.32
30年目	H 59	0.99083	0.99177	1.00103	0.99271	0.2636	92.1	0.76	0.18	0.16	1.11	0.29	0.03	0.01	0.02	0.05	0.01	0.00	0.00	1.16	0.31
31年目	H 60	0.99074	0.99171	1.00102	0.99266	0.2534	92.1	0.75	0.18	0.16	1.10	0.28	0.03	0.01	0.02	0.05	0.01	0.00	0.00	1.15	0.29
32年目	H 61	0.99065	0.99164	1.00102	0.99260	0.2437	92.1	0.75	0.18	0.16	1.09	0.27	0.03	0.01	0.02	0.05	0.01	0.00	0.00	1.15	0.28
33年目	H 62	0.99057	0.99157	1.00102	0.99255	0.2343	92.1	0.74	0.18	0.16	1.08	0.25	0.03	0.01	0.02	0.05	0.01	0.00	0.00	1.14	0.27
34年目	H 63	0.99048	0.99149	1.00102	0.99249	0.2253	92.1	0.73	0.18	0.16	1.07	0.24	0.03	0.01	0.02	0.05	0.01	0.00	0.00	1.13	0.25
35年目	H 64	0.99038	0.99142	1.00102	0.99244	0.2166	92.1	0.73	0.18	0.16	1.06	0.23	0.03	0.01	0.02	0.05	0.01	0.00	0.00	1.12	0.24
36年目	H 65	0.99029	0.99135	1.00102	0.99238	0.2083	92.1	0.72	0.17	0.16	1.06	0.22	0.03	0.01	0.02	0.05	0.01	0.00	0.00	1.11	0.23
37年目	H 66	0.99020	0.99127	1.00102	0.99232	0.2003	92.1	0.71	0.17	0.16	1.05	0.21	0.03	0.01	0.02	0.05	0.01	0.00	0.00	1.10	0.22
38年目	H 67	0.99010	0.99120	1.00102	0.99226	0.1926	92.1	0.70	0.17	0.16	1.04	0.20	0.03	0.01	0.02	0.05	0.01	0.00	0.00	1.09	0.21
39年目	H 68	0.99000	0.99112	1.00102	0.99220	0.1852	92.1	0.70	0.17	0.16	1.03	0.19	0.03	0.01	0.02	0.05	0.01	0.00	0.00	1.09	0.20
40年目	H 69	0.98990	0.99104	1.00101	0.99214	0.1780	92.1	0.69	0.17	0.16	1.02	0.18	0.03	0.01	0.02	0.05	0.01	0.00	0.00	1.08	0.19
41年目	H 70	0.98980	0.99096	1.00101	0.99208	0.1712	92.1	0.68	0.17	0.16	1.01	0.17	0.03	0.01	0.02	0.05	0.01	0.00	0.00	1.07	0.18
42年目	H 71	0.98969	0.99087	1.00101	0.99201	0.1646	92.1	0.68	0.17	0.16	1.01	0.17	0.03	0.01	0.02	0.05	0.01	0.00	0.00	1.06	0.17
43年目	H 72	0.98958	0.99079	1.00101	0.99195	0.1583	92.1	0.67	0.16	0.16	1.00	0.16	0.03	0.01	0.02	0.05	0.01	0.00	0.00	1.05	0.17
44年目	H 73	0.98947	0.99070	1.00101	0.99188	0.1522	92.1	0.66	0.16	0.16	0.99	0.15	0.03	0.01	0.02	0.05	0.01	0.00	0.00	1.04	0.16
45年目	H 74	0.98936	0.99062	1.00101	0.99182	0.1463	92.1	0.66	0.16	0.16	0.98	0.14	0.03	0.01	0.02	0.05	0.01	0.00	0.00	1.03	0.15
46年目	H 75	0.98925	0.99053	1.00101	0.99175	0.1407	92.1	0.65	0.16	0.16	0.97	0.14	0.03	0.01	0.02	0.05	0.01	0.00	0.00	1.02	0.14
47年目	H 76	0.98913	0.99044	1.00101	0.99168	0.1353	92.1	0.64	0.16	0.16	0.96	0.13	0.03	0.01	0.02	0.05	0.01	0.00	0.00	1.02	0.14
48年目	H 77	0.98901	0.99035	1.00101	0.99161	0.1301	92.1	0.63	0.16	0.17	0.96	0.12	0.03	0.01	0.02	0.05	0.01	0.00	0.00	1.01	0.13
49年目	H 78	0.98889	0.99025	1.00101	0.99154	0.1251	92.1	0.63	0.16												
