

(事後評価)

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道334号 真鯉道路
事業区分	一般国道（一次改築）
事業主体	北海道開発局

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指標（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更）	指標チェックの根拠
1. 活力		
	円滑なモビリティの確保	
	<input type="radio"/> 現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率	
	<input type="radio"/> 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満であった区間の旅行速度の改善状況	
	<input type="radio"/> 現道又は並行区間等における踏切道の除却もしくは交通改善の状況	
	<input checked="" type="radio"/> 当該路線の整備によるバス路線の利便性向上の状況	利便性向上が期待されるバス路線：知床線、知床エアポートライナー、イーグルライナー、知床浪漫ふれあい号 1日の便数：22便
	<input type="radio"/> 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上の状況	
	<input type="radio"/> 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上の状況	
	物流効率化の支援	
	<input type="radio"/> 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上の状況	
	<input checked="" type="radio"/> 農林水産業を主体とする地域における農林水産品の流通の利便性向上の状況	自治体：斜里町 【水産品】ウトロ漁港から斜里魚菜卸売市場・斜里町水産加工場 ウトロ漁港漁獲高：約33億円 ウトロ漁港さけ出荷額：約26億円（さけの漁獲量日本一）
	<input type="checkbox"/> 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間が解消	
	都市の再生	
	<input type="radio"/> 都市再生プロジェクトの支援に関する効果	
	国土・地域ネットワークの構築	
	<input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	
	<input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
	<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消	

	<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消	
	<input type="radio"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上の状況	
	個性ある地域の形成	
	<input type="radio"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されていた地区の一体的発展への寄与の状況	
	<input type="radio"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントの支援に関する効果	
	<input checked="" type="radio"/> 主要な観光地へのアクセス向上による効果	主要な観光地：ウトロ地区（斜里町） 年間入り込み客数：斜里町 約87万人（R5）
	<input type="radio"/> 新規整備の公共公益施設と直結されたことによる効果	
2. 暮らし		
	歩行者・自転車のための生活空間の形成	
	<input type="radio"/> 自転車利用空間が整備されたことによる当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性向上の状況	
	<input type="checkbox"/> 交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成	
	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけあり	
	<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
	安全で安心できるくらしの確保	
	<input type="radio"/> 二次医療施設へのアクセス向上の状況	
3. 安全		
	安全な生活環境の確保	
	<input type="radio"/> 現道等における交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等による安全性向上の状況	
	<input type="radio"/> 歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置されたことによる安全性向上の状況	
	災害への備え	
	<input checked="" type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	知床峠の冬期通行止め時における、当該道路通行止め時のウトロ地区の孤立化を解消 通行止め時のウトロ地区と斜里町市街地間の知床峠経由の大幅な迂回を解消（通常：43分 迂回 117分）
	<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置付けがある、又は地震防災緊急事業5ヶ年計画に位置付けのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	計画名：北海道緊急輸送道路ネットワーク計画 位置付け：第二次緊急輸送道路
	<input type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成	
	<input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消	
	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消	10箇所の防災点検箇所が解消 （岩盤崩壊3か所、落石・崩壊7か所）
4. 環境		
	地球環境の保全	
	<input type="radio"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	
	生活環境の改善・保全	
	<input type="radio"/> 現道等における自動車からのNO2排出削減率	
	<input type="radio"/> 現道等における自動車からのSPM排出削減率	

		<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過していた区間の騒音レベルの改善の状況	
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果	
5. その他	他のプロジェクトとの関係		
		<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業との一体的整備の必要性または一体的整備による効果	
		<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに関する効果	
		<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現払・BP・その他の別
一般国道334号	真鯉道路	L=14.4Km	一次改築	その他

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
2,000	2	北海道開発局

① 費用

	事業費	維持管理費	更新費	合計
基準年	令和6年度			
単純合計	217億円	8.2億円		225億円
基準年における 現在価値(C)	463億円	4.3億円		467億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和6年度			
供用年	令和2年度			
単年便益 (初年便益)	3.9億円	0.19億円	0.01億円	4.1億円
基準年における 現在価値(B)	91億円	4.8億円	0.23億円	96億円

注)費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

交通状況の変化

事業名:真鯉道路


(推計時点 R22年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] 14.4km	交通量	[台/日]	2,000	2,000	
	走行時間	[分]	22.4	14.9	
	走行時間費用	[億円/年]	9.22	6.21	
②主な 周辺道路 国道335号 28.1km	交通量	[台/日]	2,400	2,400	
	走行時間	[分]	42.6	42.6	
	走行時間費用	[億円/年]	20.61	20.46	
③その他道路合計 26,431.7km		走行時間費用	[億円/年]	20,625.47	20,625.26

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計: 26,474.2km	走行時間短縮便益	[億円/年]	20,655.30	20,651.93	3.37

事業名:真鯉道路

【 図面(①、②に該当する道路を明示すること)】

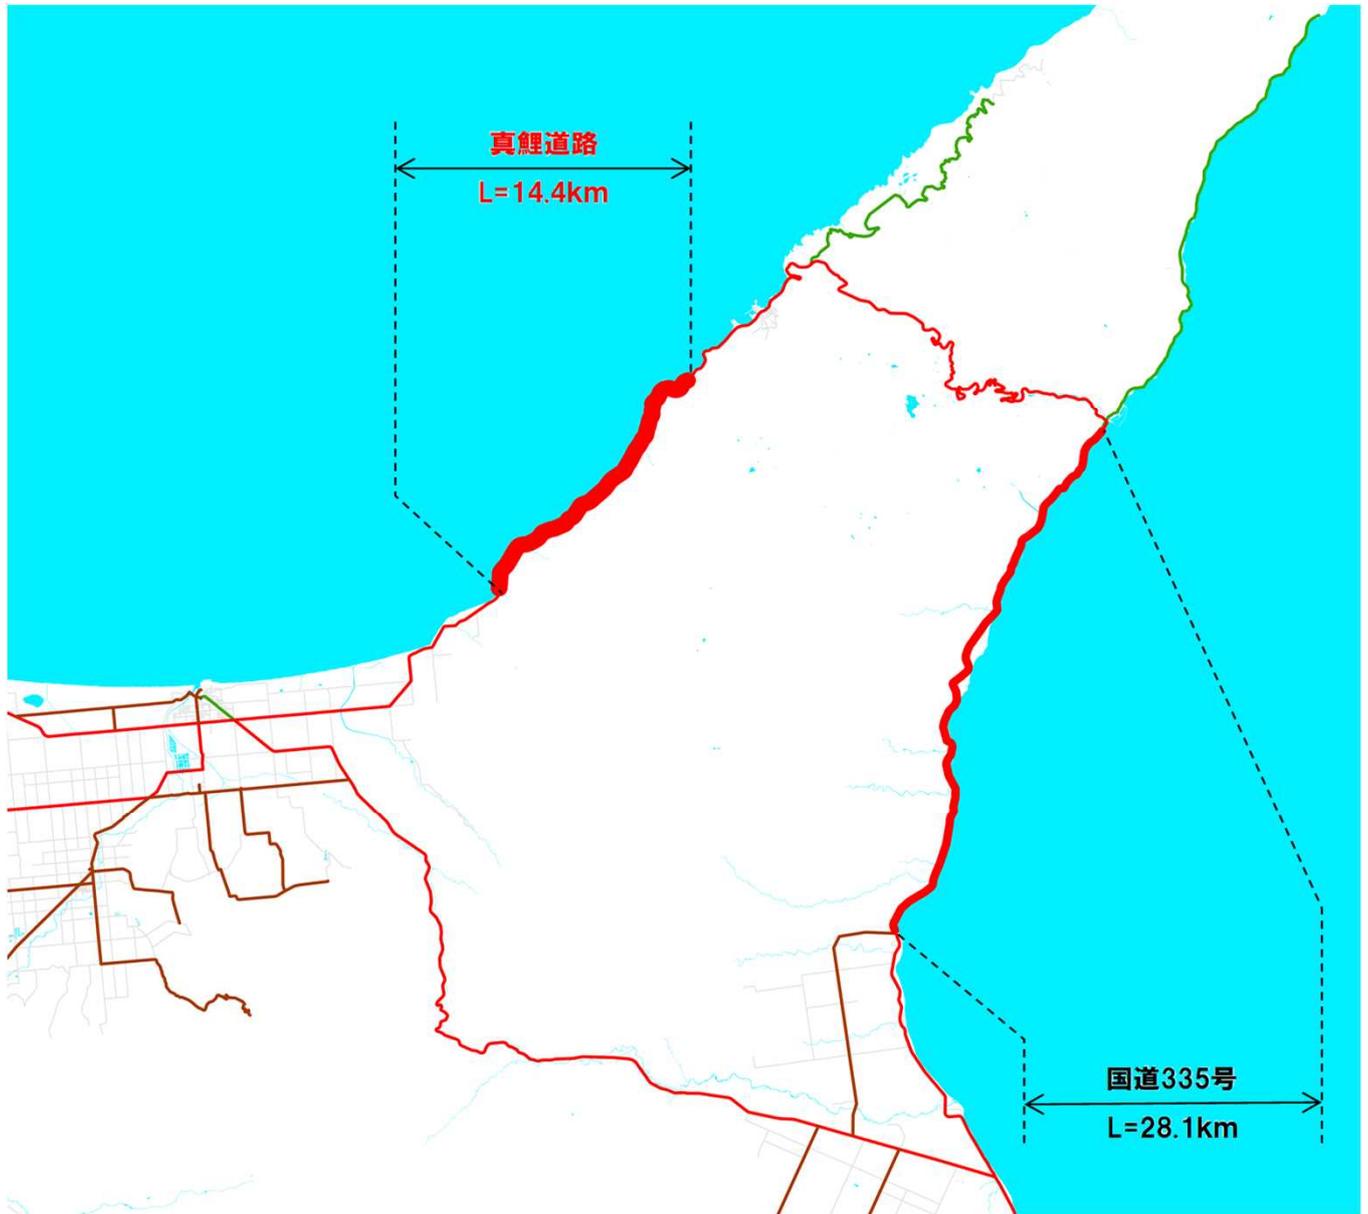

費用便益分析の条件

事業名：真鯉道路

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和5年12月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間	
	社会的割引率	4%	
	比較のための参考とすべき値	-	
	基準年次	令和6年	
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (R22)	
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載	
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H27センサス)	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
	その他()	<input type="checkbox"/>	
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
	有	<input type="checkbox"/>	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載	
交通流推計	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の 採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
		その他()	
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)			
その他()	<input type="checkbox"/>		
速度設定の 考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載	交通容量未満・以上の路線が混在した配分結果となっているため、便益算出においては速度差の生ずる加重平均速度を用いた。	
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載		
その他()	<input type="checkbox"/>		

事業名: 真鯉道路

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数	()%
	休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載			
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
		考慮する	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数	(0.4)日
			採用した通行止め日数の考え方を記載 当該区間の通行止め実績を踏まえ、0.4日/年と設定	
とり止め交通を考慮する		<input type="checkbox"/>		
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載				
冬期交通の影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>		
	考慮する	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する場合のみ	採用した冬期日数	(112)日	
		採用した冬期日数の考え方を記載 当該地域の直近3か年(令和3年~令和5年)における最低気温0℃以下かつ積雪1cm以上を満たす日数とし、112日と設定		
		冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載 Vmax、Vminについて低減		
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ()	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
その他				

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:一般国道334号 真鯉道路

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.013	14.4	0.18

年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純単価	現在単価	単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
-32年目	S 63	4%	4.1039	104.70	0.91	3.65				
-31年目	H 1	4%	3.9461	107.46	1.49	5.61				
-30年目	H 2	4%	3.7943	109.89	1.83	6.48				
-29年目	H 3	4%	3.6484	112.53	3.08	10.27				
-28年目	H 4	4%	3.5081	114.08	10.37	32.75				
-27年目	H 5	4%	3.3731	114.41	10.19	30.86				
-26年目	H 6	4%	3.2434	114.30	10.67	31.09				
-25年目	H 7	4%	3.1187	113.70	10.12	28.50				
-24年目	H 8	4%	2.9987	113.20	7.21	19.61				
-23年目	H 9	4%	2.8834	114.20	3.37	8.73				
-22年目	H 10	4%	2.7725	113.60	10.48	26.26				
-21年目	H 11	4%	2.6658	112.00	1.62	3.96				
-20年目	H 12	4%	2.5633	110.70	3.30	7.85				
-19年目	H 13	4%	2.4647	109.40	5.05	11.68				
-18年目	H 14	4%	2.3699	107.60	3.54	8.02				
-17年目	H 15	4%	2.2788	106.10	1.32	2.92				
-16年目	H 16	4%	2.1911	105.00	10.76	23.07				
-15年目	H 17	4%	2.1068	103.70	2.67	5.57				
-14年目	H 18	4%	2.0258	103.00	6.64	13.41				
-13年目	H 19	4%	1.9479	102.10	6.20	12.15				
-12年目	H 20	4%	1.8730	101.60	15.20	28.78				
-11年目	H 21	4%	1.8009	100.30	14.53	26.79				
-10年目	H 22	4%	1.7317	98.60	7.87	14.20				
- 9年目	H 23	4%	1.6651	97.20	9.00	15.83				
- 8年目	H 24	4%	1.6010	96.40	7.32	12.48				
- 7年目	H 25	4%	1.5395	96.40	5.02	8.23				
- 6年目	H 26	4%	1.4802	98.70	5.40	8.32				
- 5年目	H 27	4%	1.4233	100.20	8.70	12.69				
- 4年目	H 28	4%	1.3686	100.20	4.11	5.76				
- 3年目	H 29	4%	1.3159	100.50	13.11	17.63				
- 2年目	H 30	4%	1.2653	100.40	8.80	11.38				
- 1年目	R 1	4%	1.2167	101.20	7.05	8.70				
供用開始年次	R 2	4%	1.1699	101.90			0.16	0.19		
1年目	R 3	4%	1.1249	101.80			0.16	0.19		
2年目	R 4	4%	1.0816	102.70			0.16	0.18		
3年目	R 5	4%	1.0400	102.70			0.16	0.17		
4年目	R 6	4%	1.0000	102.70			0.16	0.16		
5年目	R 7	4%	0.9615	102.70			0.16	0.16		
6年目	R 8	4%	0.9246	102.70			0.16	0.15		
7年目	R 9	4%	0.8890	102.70			0.16	0.15		
8年目	R 10	4%	0.8548	102.70			0.16	0.14		
9年目	R 11	4%	0.8219	102.70			0.16	0.13		
10年目	R 12	4%	0.7903	102.70			0.16	0.13		
11年目	R 13	4%	0.7599	102.70			0.16	0.12		
12年目	R 14	4%	0.7307	102.70			0.16	0.12		
13年目	R 15	4%	0.7026	102.70			0.16	0.11		
14年目	R 16	4%	0.6756	102.70			0.16	0.11		
15年目	R 17	4%	0.6496	102.70			0.16	0.11		
16年目	R 18	4%	0.6246	102.70			0.16	0.10		
17年目	R 19	4%	0.6006	102.70			0.16	0.10		
18年目	R 20	4%	0.5775	102.70			0.16	0.09		
19年目	R 21	4%	0.5553	102.70			0.16	0.09		
20年目	R 22	4%	0.5339	102.70			0.16	0.09		
21年目	R 23	4%	0.5134	102.70			0.16	0.08		
22年目	R 24	4%	0.4936	102.70			0.16	0.08		
23年目	R 25	4%	0.4746	102.70			0.16	0.08		
24年目	R 26	4%	0.4564	102.70			0.16	0.07		
25年目	R 27	4%	0.4388	102.70			0.16	0.07		
26年目	R 28	4%	0.4220	102.70			0.16	0.07		
27年目	R 29	4%	0.4057	102.70			0.16	0.07		
28年目	R 30	4%	0.3901	102.70			0.16	0.06		
29年目	R 31	4%	0.3751	102.70			0.16	0.06		
30年目	R 32	4%	0.3607	102.70			0.16	0.06		
31年目	R 33	4%	0.3468	102.70			0.16	0.06		
32年目	R 34	4%	0.3335	102.70			0.16	0.05		
33年目	R 35	4%	0.3207	102.70			0.16	0.05		
34年目	R 36	4%	0.3083	102.70			0.16	0.05		
35年目	R 37	4%	0.2965	102.70			0.16	0.05		
36年目	R 38	4%	0.2851	102.70			0.16	0.05		
37年目	R 39	4%	0.2741	102.70			0.16	0.04		
38年目	R 40	4%	0.2636	102.70			0.16	0.04		
39年目	R 41	4%	0.2534	102.70			0.16	0.04		
40年目	R 42	4%	0.2437	102.70			0.16	0.04		
41年目	R 43	4%	0.2343	102.70			0.16	0.04		
42年目	R 44	4%	0.2253	102.70			0.16	0.04		
43年目	R 45	4%	0.2166	102.70			0.16	0.04		
44年目	R 46	4%	0.2083	102.70			0.16	0.03		
45年目	R 47	4%	0.2003	102.70			0.16	0.03		
46年目	R 48	4%	0.1926	102.70			0.16	0.03		
47年目	R 49	4%	0.1852	102.70			0.16	0.03		
48年目	R 50	4%	0.1780	102.70			0.16	0.03		
49年目	R 51	4%	0.1712	102.70	-0.72	-0.13	0.16	0.03		
合計					216.20	463.13	8.18	4.28	0.00	0.00
単純事業費計					216.92		8.18		0.00	

注1)事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道334号 真鯉道路

年次	年度 (基準年) R6	総走行台キロの年次別伸び率 (北海道ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)			合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車				乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値	
																							③
供用開始年次	R 2	0.99536	0.97677	0.99872	0.99324	4%	1.1699	101.90	1.51	0.94	1.45	3.90	4.59	0.04	0.02	0.14	0.19	0.23	0.01	0.01	0.01	4.10	4.83
1年目	R 3	0.99534	0.97622	0.99871	0.99319	4%	1.1249	101.80	1.50	0.91	1.45	3.87	4.39	0.04	0.02	0.14	0.19	0.22	0.01	0.01	0.01	4.07	4.62
2年目	R 4	0.99531	0.97564	0.99871	0.99314	4%	1.0816	102.70	1.49	0.89	1.45	3.83	4.15	0.04	0.02	0.14	0.19	0.21	0.01	0.01	0.01	4.04	4.37
3年目	R 5	0.99529	0.97503	0.99871	0.99310	4%	1.0400	102.70	1.49	0.87	1.45	3.80	3.96	0.04	0.02	0.14	0.19	0.20	0.01	0.01	0.01	4.01	4.17
4年目	R 6	0.99527	0.97439	0.99871	0.99305	4%	1.0000	102.70	1.48	0.85	1.44	3.77	3.77	0.04	0.02	0.14	0.19	0.19	0.01	0.01	0.01	3.97	3.97
5年目	R 7	0.99525	0.97372	0.99871	0.99300	4%	0.9615	102.70	1.47	0.83	1.44	3.74	3.60	0.04	0.02	0.14	0.19	0.18	0.01	0.01	0.01	3.94	3.79
6年目	R 8	0.99523	0.97301	0.99871	0.99295	4%	0.9246	102.70	1.47	0.81	1.44	3.71	3.43	0.04	0.02	0.14	0.19	0.18	0.01	0.01	0.01	3.91	3.62
7年目	R 9	0.99520	0.97226	0.99870	0.99290	4%	0.8890	102.70	1.46	0.78	1.44	3.68	3.27	0.04	0.02	0.14	0.19	0.17	0.01	0.01	0.01	3.88	3.45
8年目	R 10	0.99518	0.97147	0.99870	0.99285	4%	0.8548	102.70	1.45	0.76	1.44	3.65	3.12	0.04	0.01	0.14	0.19	0.16	0.01	0.01	0.01	3.85	3.29
9年目	R 11	0.99516	0.97063	0.99870	0.99280	4%	0.8219	102.70	1.45	0.74	1.43	3.62	2.98	0.04	0.01	0.14	0.19	0.15	0.01	0.01	0.01	3.82	3.14
10年目	R 12	0.99401	0.98507	0.99820	0.99354	4%	0.7903	102.70	1.44	0.72	1.43	3.59	2.84	0.04	0.01	0.14	0.19	0.15	0.01	0.01	0.01	3.79	2.99
11年目	R 13	0.99397	0.98484	0.99820	0.99349	4%	0.7599	102.70	1.43	0.71	1.43	3.57	2.71	0.04	0.01	0.14	0.19	0.14	0.01	0.01	0.01	3.76	2.86
12年目	R 14	0.99393	0.98461	0.99820	0.99345	4%	0.7307	102.70	1.42	0.70	1.43	3.55	2.59	0.04	0.01	0.14	0.19	0.14	0.01	0.01	0.01	3.74	2.73
13年目	R 15	0.99390	0.98437	0.99819	0.99341	4%	0.7026	102.70	1.41	0.69	1.43	3.52	2.48	0.04	0.01	0.14	0.18	0.13	0.01	0.01	0.01	3.72	2.61
14年目	R 16	0.99386	0.98412	0.99819	0.99337	4%	0.6756	102.70	1.40	0.68	1.42	3.50	2.37	0.04	0.01	0.14	0.18	0.12	0.01	0.01	0.01	3.70	2.50
15年目	R 17	0.99382	0.98386	0.99819	0.99332	4%	0.6496	102.70	1.40	0.66	1.42	3.48	2.26	0.04	0.01	0.14	0.18	0.12	0.01	0.01	0.01	3.67	2.39
16年目	R 18	0.99378	0.98360	0.99818	0.99328	4%	0.6246	102.70	1.39	0.65	1.42	3.46	2.16	0.03	0.01	0.14	0.18	0.11	0.01	0.01	0.01	3.65	2.28
17年目	R 19	0.99374	0.98332	0.99818	0.99323	4%	0.6006	102.70	1.38	0.64	1.41	3.44	2.06	0.03	0.01	0.13	0.18	0.11	0.01	0.01	0.01	3.63	2.18
18年目	R 20	0.99370	0.98304	0.99818	0.99318	4%	0.5775	102.70	1.37	0.63	1.41	3.41	1.97	0.03	0.01	0.13	0.18	0.10	0.01	0.00	0.00	3.60	2.08
19年目	R 21	0.99366	0.98275	0.99817	0.99314	4%	0.5553	102.70	1.36	0.62	1.41	3.39	1.88	0.03	0.01	0.13	0.18	0.10	0.01	0.00	0.00	3.58	1.99
20年目	R 22	0.99132	0.99191	0.99934	0.99287	4%	0.5339	102.70	1.35	0.61	1.41	3.37	1.80	0.03	0.01	0.13	0.18	0.10	0.01	0.00	0.00	3.56	1.90
21年目	R 23	0.99124	0.99184	0.99934	0.99282	4%	0.5134	102.70	1.34	0.61	1.41	3.35	1.72	0.03	0.01	0.13	0.18	0.09	0.01	0.00	0.00	3.54	1.82
22年目	R 24	0.99116	0.99177	0.99934	0.99277	4%	0.4936	102.70	1.33	0.60	1.41	3.34	1.65	0.03	0.01	0.13	0.18	0.09	0.01	0.00	0.00	3.52	1.74
23年目	R 25	0.99108	0.99171	0.99934	0.99272	4%	0.4746	102.70	1.32	0.60	1.40	3.32	1.57	0.03	0.01	0.13	0.18	0.08	0.01	0.00	0.00	3.50	1.66
24年目	R 26	0.99100	0.99164	0.99934	0.99266	4%	0.4564	102.70	1.31	0.59	1.40	3.30	1.51	0.03	0.01	0.13	0.18	0.08	0.01	0.00	0.00	3.49	1.59
25年目	R 27	0.99092	0.99157	0.99934	0.99261	4%	0.4388	102.70	1.29	0.59	1.40	3.28	1.44	0.03	0.01	0.13	0.18	0.08	0.01	0.00	0.00	3.47	1.52
26年目	R 28	0.99084	0.99149	0.99934	0.99256	4%	0.4220	102.70	1.28	0.58	1.40	3.26	1.38	0.03	0.01	0.13	0.18	0.07	0.01	0.00	0.00	3.45	1.46
27年目	R 29	0.99075	0.99142	0.99933	0.99250	4%	0.4057	102.70	1.27	0.58	1.40	3.25	1.32	0.03	0.01	0.13	0.18	0.07	0.01	0.00	0.00	3.43	1.39
28年目	R 30	0.99067	0.99135	0.99933	0.99244	4%	0.3901	102.70	1.26	0.57	1.40	3.23	1.26	0.03	0.01	0.13	0.18	0.07	0.01	0.00	0.00	3.41	1.33
29年目	R 31	0.99058	0.99127	0.99933	0.99239	4%	0.3751	102.70	1.25	0.57	1.40	3.21	1.20	0.03	0.01	0.13	0.18	0.07	0.01	0.00	0.00	3.40	1.27
30年目	R 32	0.99049	0.99119	0.99933	0.99233	4%	0.3607	102.70	1.23	0.56	1.40	3.19	1.15	0.03	0.01	0.13	0.18	0.06	0.01	0.00	0.00	3.38	1.22
31年目	R 33	0.99040	0.99112	0.99933	0.99227	4%	0.3468	102.70	1.22	0.56	1.40	3.18	1.10	0.03	0.01	0.13	0.17	0.06	0.01	0.00	0.00	3.36	1.17
32年目	R 34	0.99031	0.99104	0.99933	0.99221	4%	0.3335	102.70	1.21	0.55	1.40	3.16	1.05	0.03	0.01	0.13	0.17	0.06	0.01	0.00	0.00	3.34	1.11
33年目	R 35	0.99021	0.99096	0.99933	0.99215	4%	0.3207	102.70	1.20	0.55	1.40	3.14	1.01	0.03	0.01	0.13	0.17	0.06	0.01	0.00	0.00	3.32	1.07
34年目	R 36	0.99011	0.99087	0.99933	0.99208	4%	0.3083	102.70	1.19	0.54	1.39	3.12	0.96	0.03	0.01	0.13	0.17	0.05	0.01	0.00	0.00	3.30	1.02
35年目	R 37	0.99002	0.99079	0.99933	0.99202	4%	0.2965	102.70	1.18	0.54	1.39	3.11	0.92	0.03	0.01	0.13	0.17	0.05	0.01	0.00	0.00	3.29	0.97
36年目	R 38	0.98991	0.99070	0.99933	0.99196	4%	0.2851	102.70	1.16	0.53	1.39	3.09	0.88	0.03	0.01	0.13	0.17	0.05	0.01	0.00	0.00	3.27	0.93
37年目	R 39	0.98981	0.99062	0.99933	0.99189	4%	0.2741	102.70	1.15	0.53	1.39	3.07	0.84	0.03	0.01	0.13	0.17	0.05	0.01	0.00	0.00	3.25	0.89
38年目	R 40	0.98971	0.99053	0.99933	0.99182	4%	0.2636	102.70	1.14	0.52	1.39	3.05	0.80	0.03	0.01	0.13	0.17	0.05	0.01	0.00	0.00	3.23	0.85
39年目	R 41	0.98960	0.99044	0.99933	0.99176	4%	0.2534	102.70	1.13	0.52	1.39	3.04	0.77	0.03	0.01	0.13	0.17	0.04	0.01	0.00	0.00	3.21	0.81
40年目	R 42	0.98949	0.99034	0.99933	0.99169	4%	0.2437	102.70	1.12	0.51	1.39	3.02	0.74	0.03	0.01	0.13	0.17	0.04	0.01	0.00	0.00	3.20	0.78
41年目	R 43	0.98938	0.99025	0.99933	0.99162	4%	0.2343	102.70	1.11	0.51	1.39	3.00	0.70	0.03	0.01	0.13	0.17	0.04	0.01	0.00	0.00	3.18	0.74
42年目	R 44	0.98926	0.99015	0.99933	0.99155	4%	0.2253	102.70	1.09	0.50	1.39	2.98	0.67	0.03	0.01	0.13	0.17	0.04	0.01	0.00	0.00	3.16	0.71
43年目	R 45	0.98915	0.99006	0.99933	0.99148	4%	0.2166	102.70	1.08	0.50	1.39	2.97	0.64	0.03	0.01	0.13	0.17	0.04	0.01	0.00	0.00	3.14	0.68
44年目	R 46	0.98903	0.98996	0.99933	0.99140	4%	0.2083	102.70	1.07	0.49	1.38	2.95	0.61	0.03	0.01	0.13	0.17	0.04	0.01	0.00	0.00	3.12	0.65
45年目	R 47	0.98891	0.98985	0.99933	0.99133	4%	0.2003																
