

平成28年 8月23日

## 石狩川（上流）出水の対応状況について（第1報）

～平成28年8月23日7：00時点～

石狩川水系石狩川常盤地区において、8月20日出水の影響による低水護岸の被災を発生し、応急復旧工事を実施しました。

○水系名 石狩川水系

河川名 石狩川

被災箇所 常盤地区（石狩川KP156.5付近左岸）

被災状況 8月20日出水の影響により低水護岸が破損

発見日時 平成28年8月22日（月）9：20頃

応急復旧 ブルーシート敷設＋根固ブロック投入

平成28年8月22日（月）19：30開始

平成28年8月23日（火） 2：20完了

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 旭川開発建設部

治水課 課長 いっぼうし たかみつ 一法師 隆充（ダイヤルイン番号 0166-32-4234）


治水課 課長補佐 みうら かつよし 三浦 勝義（ダイヤルイン番号 0166-32-4457）

広報官 小林 智也（ダイヤルイン電話 0166-32-3097）



# 石狩川(上流)出水の対応状況 【H28 8/23(火)7:00時点】

国管理の石狩川水系石狩川において、常盤地区で低水護岸の被災を22日9:20に発見しました。現地調査後、同日19:30より応急復旧を開始し、23日2:20に工事を完了しました。

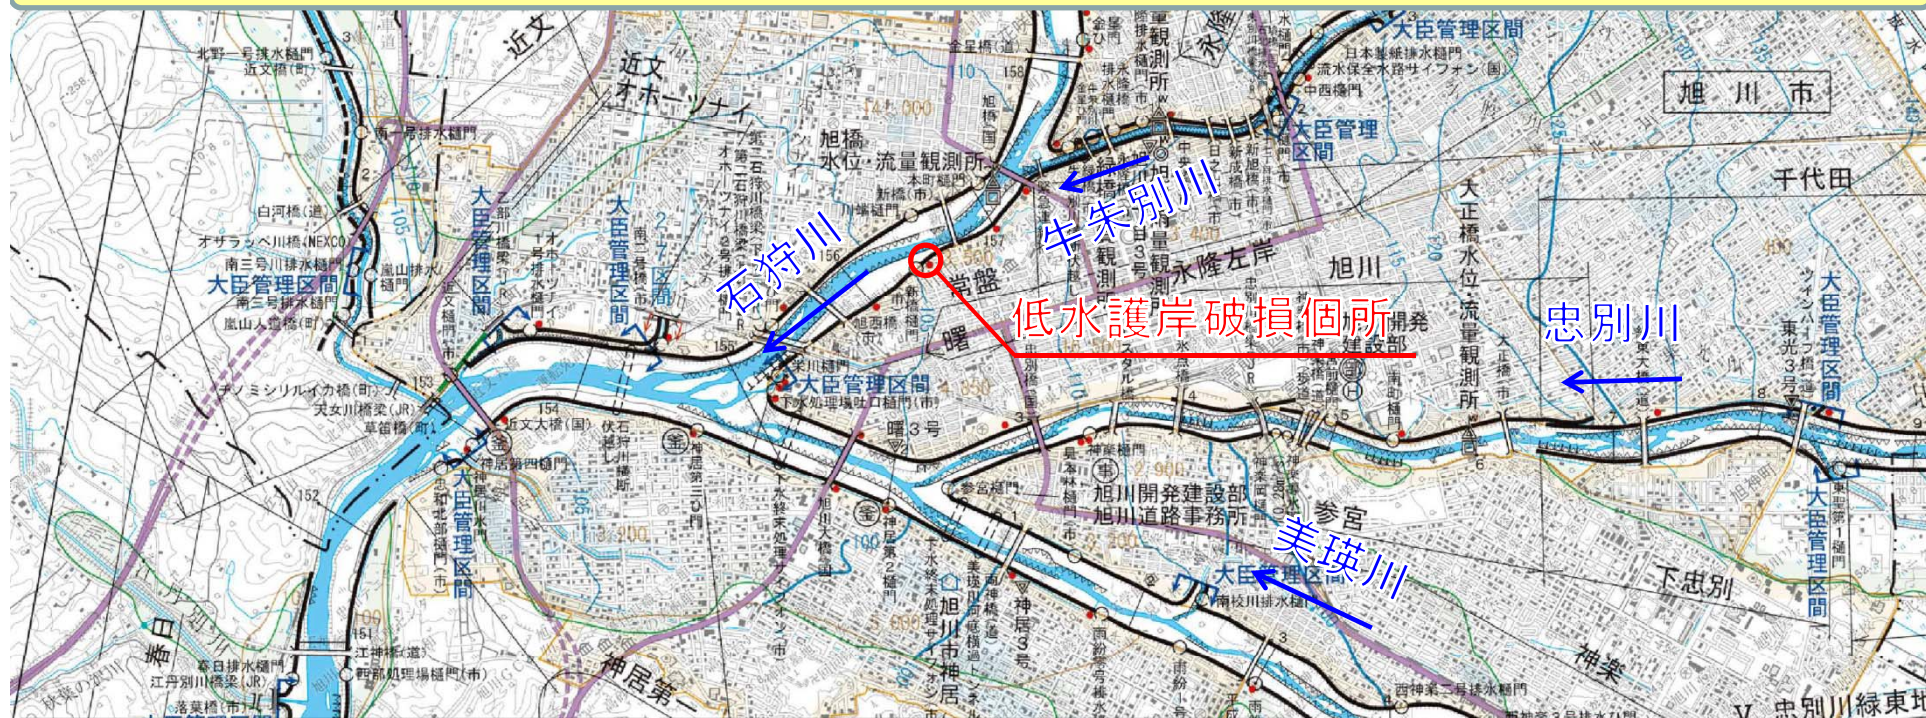



# 石狩川(上流)出水の対応状況【H28 8/23(火)7:00時点】

低水護岸破損箇所及び高水敷洗掘箇所にブルーシートを敷設し、その後に根固めブロック(110個)を投入することで河岸を応急的に保護しています。





照明車による現地夜間照明  
(開始 8/22 19:30)



50tクレーンを配置しブロックを投入



協定業者により投入作業を実施

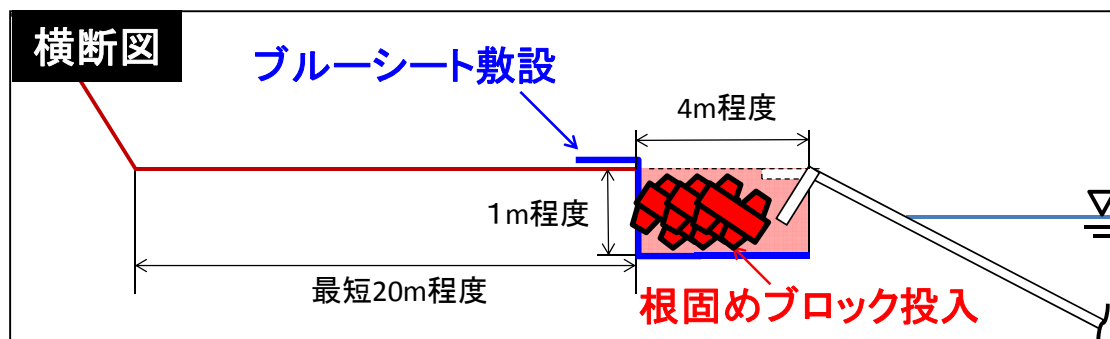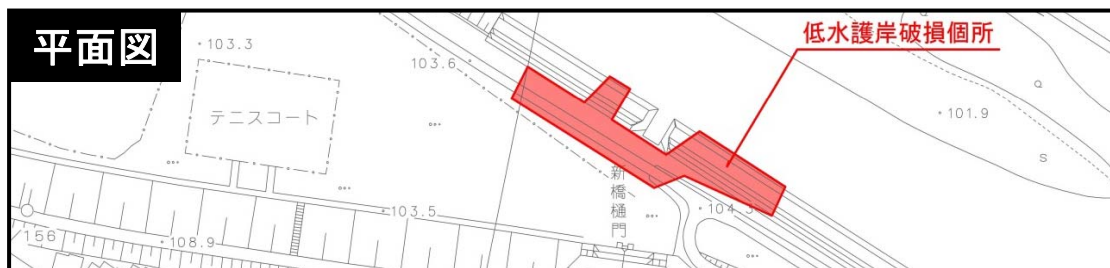

応急復旧完了  
(完了 8/23 2:20)
