

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道274号 徹別道路
事業主体	北海道開発局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	費用便益比 (B/C) = 1.2

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更)	指標チェックの根拠	
1. 活力	円滑なモビリティの確保	<input type="checkbox"/> 現道等の年間渋滞損失時間(人・時間)及び削減率	
		<input type="checkbox"/> 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
		<input type="checkbox"/> 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
		<input type="checkbox"/> 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	
		<input type="checkbox"/> 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	
		<input checked="" type="checkbox"/> 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	対象空港：釧路空港 対象地域：弟子屈町、標茶町、斜里町、小清水町等 釧路空港乗降客数：90.9万人(H18)
	物流効率化の支援	<input type="checkbox"/> 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	
		<input checked="" type="checkbox"/> 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる	農林水産業を主体とする地域名：釧路市阿寒町、標茶町 【生乳・飼肥料】生乳：生乳生産農家～乳業工場（釧路市）、飼肥料：飼肥料工場（釧路西港）～生乳生産農家 【地場特産（エゾシカ・ダチョウ）の飼育加工販売】養鹿牧場（釧路市阿寒町）・ダチョウ牧場（標茶町）～食肉加工工場（布伏内工業団地）～道内・道外へ
		<input type="checkbox"/> 現道等における、総重量25tの車両もしくはIS0規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	
	都市の再生	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
	国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	
		<input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する		通行不能区間：3.4km（釧路市阿寒町仁々志別地区） 通行不能区間の解消により、釧路市阿寒町と弟子屈町・標茶町間を結ぶ新たなルートを形成	
<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する			
	<input type="checkbox"/> 日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる		

1. 活力	個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	布伏内工業団地（釧路市阿寒町）、釧路市内陸標茶工業団地（標茶町）
		<input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	アクセス向上が期待される地域：釧路空港～釧路湿原～知床 主要な観光地：摩周湖(83万人)・川湯温泉(96万人)・硫黄山(96万人)、細岡展望台(14万人)、知床(238万人)
		<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	
2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上全ての全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけあり	
		<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）等の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
	安全で安心できるくらしの確保	<input type="checkbox"/> 二次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	
3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は児童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
		<input type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業5ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	
		<input checked="" type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	代替する緊急輸送道路：国道391号、道道53号 代替する区間：釧路市～弟子屈町・標茶町
		<input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
	<input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する		
4. 環境	地球環境の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量：1,906t/年
	生活環境の改善・保全	<input type="checkbox"/> 現道等における自動車からのNO2排出削減率	
		<input type="checkbox"/> 現道等における自動車からのSPM排出削減率	
		<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
	<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される		
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input checked="" type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	関連する大規模道路事業：北海道横断自動車道（本別～釧路間） 釧路市阿寒町から標茶町など釧路圏北部を結ぶ幹線道路として、北海道横断自動車道との一体的な整備が必要
		<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
	その他	<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が期待される	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BPの別
一般国道274号	徹別道路	L = 25.3 km	一次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
2,500	2	北海道開発局

① 費用

	改築費	維持修繕費	合計
基準年	平成19年度		
単純合計	145億円	114億円	259億円
うち残事業分	12億円	12億円	24億円
基準年における 現在価値 (C)	231億円	48億円	279億円
うち残事業分	11億円	5億円	16億円

② 便 益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合 計
基 準 年	平成19年度			
供 用 年	平成24年度			
単年便益 (初年便益)	18億円	1億円	0億円	19億円
基準年における 現在価値 (B)	298億円	22億円	3億円	323億円
うち残事業分	102億円	3億円	2億円	107億円

③ 結 果

費用便益比 (事業全体)	1.2
費用便益比 (残事業)	6.7

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比 (B/C)
交通量	2,500台/日	±10%	6.0~7.4
事業費	12億円	±10%	6.3~7.2
事業期間	4年	±20%	6.6~6.8

交通状況の変化

事業名：徹別道路（事業全体）

（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] : 21.4 km	交通量	[台/日]	0	1,200	
	走行時間	[分]	0	21	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	8.34	
①新設・改築道路 [現道] : 3.9 km	交通量	[台/日]	100	2,300	
	走行時間	[分]	6	4	
	走行時間費用	[億円/年]	0.28	2.86	
②主な周辺道路	主) 釧路 鶴居弟子 屈線 : 23.8 km	交通量	[台/日]	4,800	3,700
		走行時間	[分]	42	39
		走行時間費用	[億円/年]	61.09	44.45
	一) 幌呂 原野鶴居 線 : 15.3 km	交通量	[台/日]	3,300	1,400
		走行時間	[分]	15	15
		走行時間費用	[億円/年]	16.11	6.64
③その他道路合計 : 21843.0 km	走行時間費用	[億円/年]	48267.43	48264.94	

		走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便 益
合計 : 21907.5km	走行時間短縮便益 [億円/年]	48344.91	48327.23	17.68

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

※1：交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※2：走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3：走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4：主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：徹別道路（事業全体）

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】

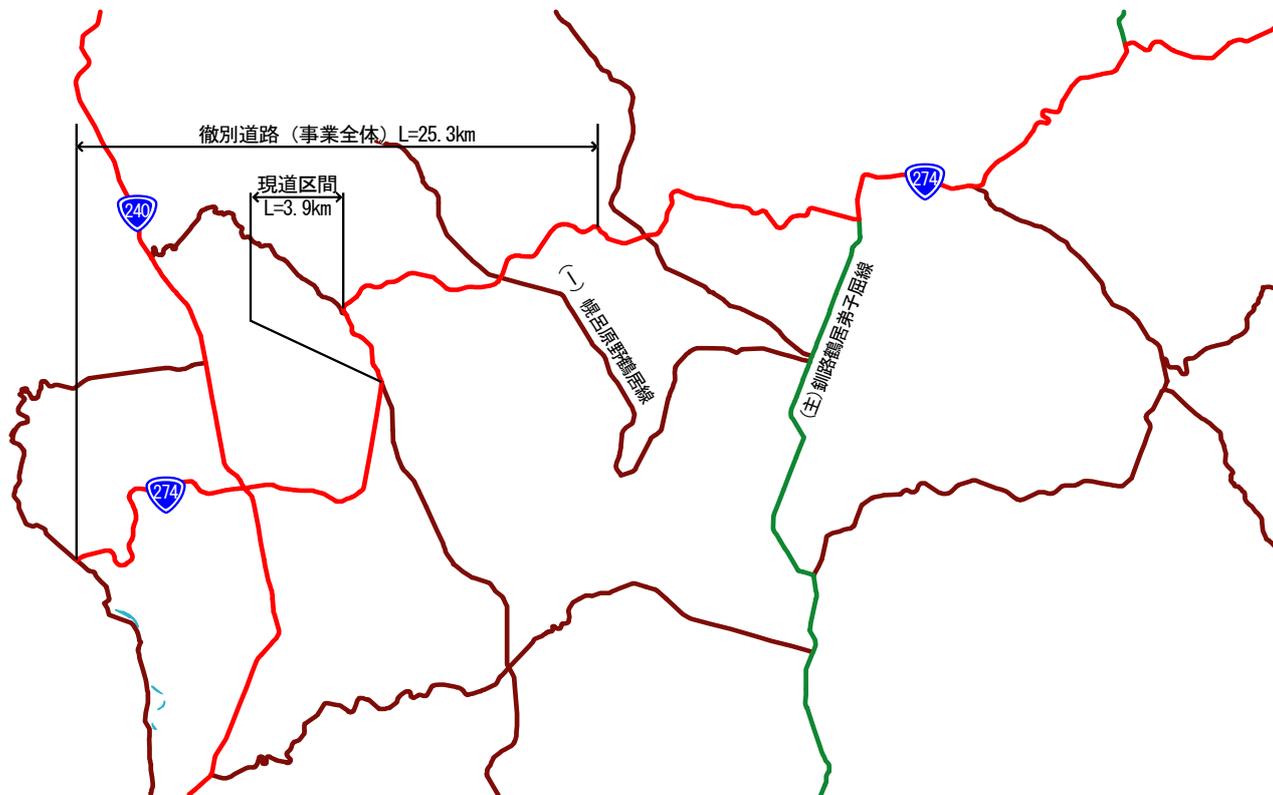

交通状況の変化

事業名：徹別道路（残事業）

（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)
①新設・改築道路 [バイパス等] : 2.3 km	交通量	[台/日]	0	2,500
	走行時間	[分]	0	2
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	1.84
①新設・改築道路 [現道等] : 1.1 km	交通量	[台/日]	1,800	2,300
	走行時間	[分]	2	1
	走行時間費用	[億円/年]	1.13	0.83
②主な周 辺道路 一) 徹別 原野釧路 線 : 9.4 km	交通量	[台/日]	2,000	0
	走行時間	[分]	14	0
	走行時間費用	[億円/年]	8.95	0.00
③その他道路合計 : 21894.7 km	走行時間費用	[億円/年]	48323.19	48324.56

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便 益
合計 : 21907.5km	走行時間短縮便益	[億円/年]	48333.27	48327.23	6.04

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

※1：交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※2：走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3：走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4：主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：徹別道路（残事業）

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】

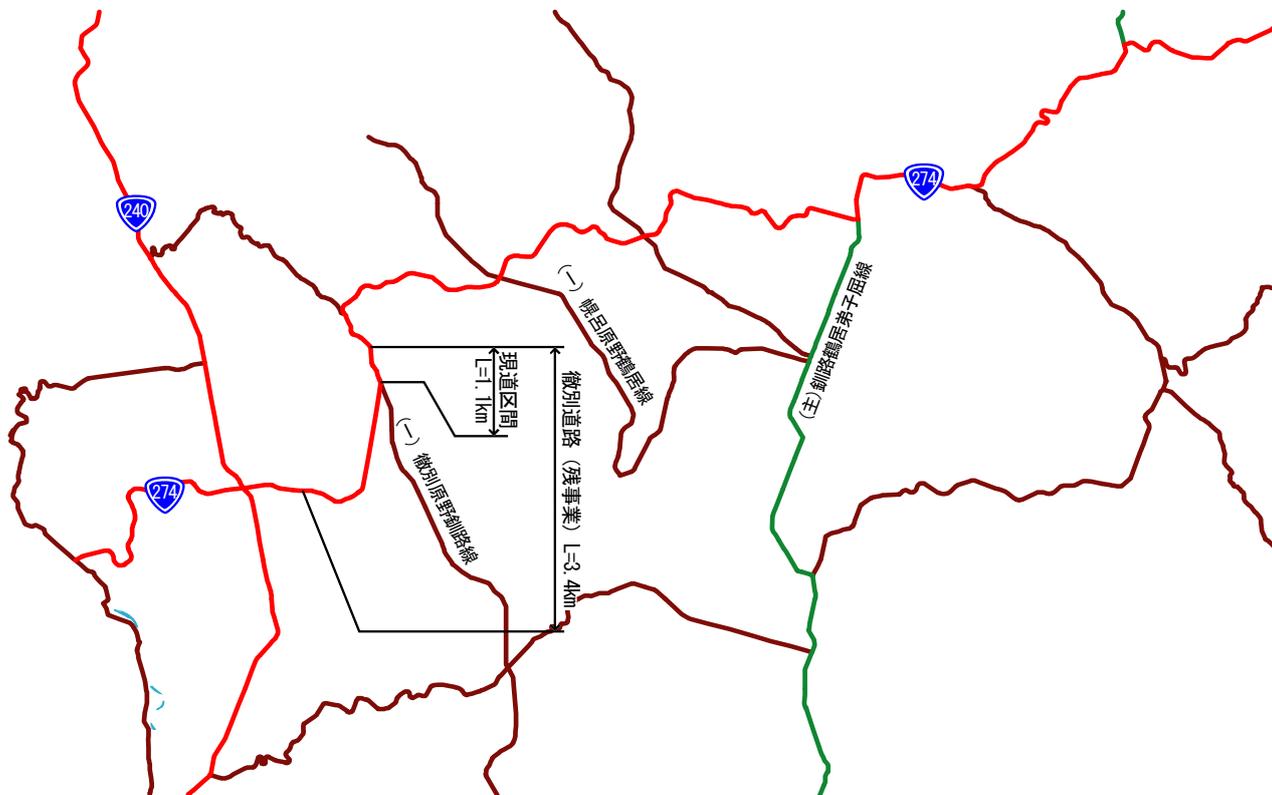

費用便益分析の条件

事業名：徹別道路

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成15年8月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)		
	その他		
分析の基本的事項	分析対象期間	40年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成19年	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計 複数時点での推計	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	
		整備の有無のいずれかのみ推計	有 無
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	(H11センサス)
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	
		その他()	
	開発交通量の考慮	無	
		有	
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載
	配分交通量の推計手法	Q - V式を用いた配分	
Q - V式と転換率式の組合せによる配分			
均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)			
簡易手法			
簡易手法の場合		小規模事業である 山間部海岸部で併行道路が少ない その他()	
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定 採用理由を記載		
	最終配分の速度		
	採用理由を記載 交通容量超過時の最低速度が最高速度の1/2と比較的高い設定であるため。		
	その他()		

費用の現在価値算定表(事業全体)

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:一般国道274号 徹別道路

			採用単価の根拠 実績値			
			単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)	
			0.14	21.4	3.0	
年次	年度	割戻率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
- 29年目	S 58	2.5633	1.61	4.13	0.00	0.00
- 28年目	S 59	2.4647	2.57	6.33	0.00	0.00
- 27年目	S 60	2.3699	1.95	4.62	0.00	0.00
- 26年目	S 61	2.2788	1.88	4.28	0.00	0.00
- 25年目	S 62	2.1911	2.21	4.84	0.00	0.00
- 24年目	S 63	2.1068	5.48	11.55	0.00	0.00
- 23年目	H 1	2.0258	6.97	14.13	0.00	0.00
- 22年目	H 2	1.9479	6.53	12.73	0.00	0.00
- 21年目	H 3	1.8730	7.47	13.99	0.00	0.00
- 20年目	H 4	1.8009	5.46	9.83	0.00	0.00
- 19年目	H 5	1.7317	9.59	16.60	0.00	0.00
- 18年目	H 6	1.6651	6.77	11.27	0.00	0.00
- 17年目	H 7	1.6010	12.48	19.98	0.00	0.00
- 16年目	H 8	1.5395	9.76	15.02	0.00	0.00
- 15年目	H 9	1.4802	10.54	15.61	0.00	0.00
- 14年目	H 10	1.4233	19.66	27.98	0.00	0.00
- 13年目	H 11	1.3686	6.04	8.26	0.00	0.00
- 12年目	H 12	1.3159	4.13	5.43	0.00	0.00
- 11年目	H 13	1.2653	1.63	2.06	0.00	0.00
- 10年目	H 14	1.2167	7.35	8.95	0.00	0.00
- 9年目	H 15	1.1699	0.67	0.79	0.00	0.00
- 8年目	H 16	1.1249	0.24	0.27	0.00	0.00
- 7年目	H 17	1.0816	1.16	1.25	0.00	0.00
- 6年目	H 18	1.0400	0.19	0.20	0.00	0.00
- 5年目	H 19	1.0000	0.19	0.19	0.00	0.00
- 4年目	H 20	0.9615	0.19	0.18	0.00	0.00
- 3年目	H 21	0.9246	5.20	4.81	0.00	0.00
- 2年目	H 22	0.8890	3.22	2.87	0.00	0.00
- 1年目	H 23	0.8548	3.48	2.97	0.00	0.00
供用開始年次	H 24	0.8219	0.00	0.00	2.86	2.35
1年目	H 25	0.7903	0.00	0.00	2.86	2.26
2年目	H 26	0.7599	0.00	0.00	2.86	2.17
3年目	H 27	0.7307	0.00	0.00	2.86	2.09
4年目	H 28	0.7026	0.00	0.00	2.86	2.01
5年目	H 29	0.6756	0.00	0.00	2.86	1.93
6年目	H 30	0.6496	0.00	0.00	2.86	1.86
7年目	H 31	0.6246	0.00	0.00	2.86	1.79
8年目	H 32	0.6006	0.00	0.00	2.86	1.72
9年目	H 33	0.5775	0.00	0.00	2.86	1.65
10年目	H 34	0.5553	0.00	0.00	2.86	1.59
11年目	H 35	0.5339	0.00	0.00	2.86	1.53
12年目	H 36	0.5134	0.00	0.00	2.86	1.47
13年目	H 37	0.4936	0.00	0.00	2.86	1.41
14年目	H 38	0.4746	0.00	0.00	2.86	1.36
15年目	H 39	0.4564	0.00	0.00	2.86	1.31
16年目	H 40	0.4388	0.00	0.00	2.86	1.25
17年目	H 41	0.4220	0.00	0.00	2.86	1.21
18年目	H 42	0.4057	0.00	0.00	2.86	1.16
19年目	H 43	0.3901	0.00	0.00	2.86	1.12
20年目	H 44	0.3751	0.00	0.00	2.86	1.07
21年目	H 45	0.3607	0.00	0.00	2.86	1.03
22年目	H 46	0.3468	0.00	0.00	2.86	0.99
23年目	H 47	0.3335	0.00	0.00	2.86	0.95
24年目	H 48	0.3207	0.00	0.00	2.86	0.92
25年目	H 49	0.3083	0.00	0.00	2.86	0.88
26年目	H 50	0.2965	0.00	0.00	2.86	0.85
27年目	H 51	0.2851	0.00	0.00	2.86	0.82
28年目	H 52	0.2741	0.00	0.00	2.86	0.78
29年目	H 53	0.2636	0.00	0.00	2.86	0.75
30年目	H 54	0.2534	0.00	0.00	2.86	0.72
31年目	H 55	0.2437	0.00	0.00	2.86	0.70
32年目	H 56	0.2343	0.00	0.00	2.86	0.67
33年目	H 57	0.2253	0.00	0.00	2.86	0.64
34年目	H 58	0.2166	0.00	0.00	2.86	0.62
35年目	H 59	0.2083	0.00	0.00	2.86	0.60
36年目	H 60	0.2003	0.00	0.00	2.86	0.57
37年目	H 61	0.1926	0.00	0.00	2.86	0.55
38年目	H 62	0.1852	0.00	0.00	2.86	0.53
39年目	H 63	0.1780	0.00	-0.18	2.86	0.51
合計			144.62	230.93	114.40	48.39
単純事業費計			144.62		114.40	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表(残事業)

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:一般国道274号 徹別道路

採用単価の根拠 実績値

単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.14	2.3	0.32

年次	年度	割引率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
- 4年目	H 20	0.9615	0.19	0.18	0.00	0.00
- 3年目	H 21	0.9246	5.20	4.81	0.00	0.00
- 2年目	H 22	0.8890	3.22	2.87	0.00	0.00
- 1年目	H 23	0.8548	3.48	2.97	0.00	0.00
供用開始年次	H 24	0.8219	0.00	0.00	0.30	0.25
1年目	H 25	0.7903	0.00	0.00	0.30	0.24
2年目	H 26	0.7599	0.00	0.00	0.30	0.23
3年目	H 27	0.7307	0.00	0.00	0.30	0.22
4年目	H 28	0.7026	0.00	0.00	0.30	0.21
5年目	H 29	0.6756	0.00	0.00	0.30	0.20
6年目	H 30	0.6496	0.00	0.00	0.30	0.19
7年目	H 31	0.6246	0.00	0.00	0.30	0.19
8年目	H 32	0.6006	0.00	0.00	0.30	0.18
9年目	H 33	0.5775	0.00	0.00	0.30	0.17
10年目	H 34	0.5553	0.00	0.00	0.30	0.17
11年目	H 35	0.5339	0.00	0.00	0.30	0.16
12年目	H 36	0.5134	0.00	0.00	0.30	0.15
13年目	H 37	0.4936	0.00	0.00	0.30	0.15
14年目	H 38	0.4746	0.00	0.00	0.30	0.14
15年目	H 39	0.4564	0.00	0.00	0.30	0.14
16年目	H 40	0.4388	0.00	0.00	0.30	0.13
17年目	H 41	0.4220	0.00	0.00	0.30	0.13
18年目	H 42	0.4057	0.00	0.00	0.30	0.12
19年目	H 43	0.3901	0.00	0.00	0.30	0.12
20年目	H 44	0.3751	0.00	0.00	0.30	0.11
21年目	H 45	0.3607	0.00	0.00	0.30	0.11
22年目	H 46	0.3468	0.00	0.00	0.30	0.10
23年目	H 47	0.3335	0.00	0.00	0.30	0.10
24年目	H 48	0.3207	0.00	0.00	0.30	0.10
25年目	H 49	0.3083	0.00	0.00	0.30	0.09
26年目	H 50	0.2965	0.00	0.00	0.30	0.09
27年目	H 51	0.2851	0.00	0.00	0.30	0.09
28年目	H 52	0.2741	0.00	0.00	0.30	0.08
29年目	H 53	0.2636	0.00	0.00	0.30	0.08
30年目	H 54	0.2534	0.00	0.00	0.30	0.08
31年目	H 55	0.2437	0.00	0.00	0.30	0.07
32年目	H 56	0.2343	0.00	0.00	0.30	0.07
33年目	H 57	0.2253	0.00	0.00	0.30	0.07
34年目	H 58	0.2166	0.00	0.00	0.30	0.06
35年目	H 59	0.2083	0.00	0.00	0.30	0.06
36年目	H 60	0.2003	0.00	0.00	0.30	0.06
37年目	H 61	0.1926	0.00	0.00	0.30	0.06
38年目	H 62	0.1852	0.00	0.00	0.30	0.06
39年目	H 63	0.1780	0.00	0.00	0.30	0.05
合計			12.09	10.83	12.00	5.08
単純事業費計			12.09		12.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表(事業全体)

箇所名: 一般国道274号 徹別道路

年次	年度 (基準年) H19	総走行台枠の年次別伸び率 (北海道ブロック)			割引率 (A)	走行時間短縮便益(億円)						走行経費減少便益(億円)					事故損出費用(億円)		合計 (億円)		
		乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 × (A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 (A) ×	現在価値 × (A)	費用合計 (-)	現在価値 割引率4%	
供用開始年次	H 24	1.00708	0.99735	1.00461	0.8219	11.53	0.00	1.80	4.21	17.54	14.42	0.51	0.00	0.22	0.57	1.31	1.08	0.17	0.14	19.02	15.63
1年目	H 25	1.00703	0.99734	1.00459	0.7903	11.61	0.00	1.79	4.20	17.61	13.91	0.52	0.00	0.22	0.57	1.31	1.04	0.17	0.14	19.09	15.09
2年目	H 26	1.00698	0.99733	1.00457	0.7599	11.70	0.00	1.79	4.19	17.67	13.43	0.52	0.00	0.22	0.57	1.31	1.00	0.17	0.13	19.16	14.56
3年目	H 27	1.00693	0.99733	1.00455	0.7307	11.78	0.00	1.79	4.17	17.74	12.96	0.52	0.00	0.22	0.57	1.31	0.96	0.18	0.13	19.22	14.05
4年目	H 28	1.00689	0.99732	1.00453	0.7026	11.86	0.00	1.78	4.16	17.80	12.51	0.53	0.00	0.22	0.57	1.31	0.92	0.18	0.12	19.29	13.55
5年目	H 29	1.00684	0.99731	1.00451	0.6756	11.94	0.00	1.78	4.15	17.87	12.07	0.53	0.00	0.22	0.57	1.32	0.89	0.18	0.12	19.36	13.08
6年目	H 30	1.00679	0.99731	1.00449	0.6496	12.02	0.00	1.77	4.14	17.93	11.65	0.53	0.00	0.22	0.56	1.32	0.86	0.18	0.12	19.43	12.62
7年目	H 31	1.00675	0.99730	1.00447	0.6246	12.10	0.00	1.77	4.13	18.00	11.24	0.54	0.00	0.22	0.56	1.32	0.82	0.18	0.11	19.49	12.18
8年目	H 32	1.00670	0.99729	1.00445	0.6006	12.18	0.00	1.76	4.12	18.06	10.85	0.54	0.00	0.22	0.56	1.32	0.79	0.18	0.11	19.56	11.75
9年目	H 33	0.99969	0.99414	0.99837	0.5775	12.18	0.00	1.75	4.09	18.02	10.41	0.54	0.00	0.22	0.56	1.32	0.76	0.18	0.10	19.52	11.27
10年目	H 34	0.99969	0.99410	0.99837	0.5553	12.17	0.00	1.74	4.07	17.99	9.99	0.54	0.00	0.22	0.56	1.31	0.73	0.18	0.10	19.47	10.81
11年目	H 35	0.99969	0.99407	0.99837	0.5339	12.17	0.00	1.73	4.05	17.95	9.58	0.54	0.00	0.21	0.55	1.31	0.70	0.18	0.10	19.43	10.37
12年目	H 36	0.99969	0.99403	0.99837	0.5134	12.17	0.00	1.72	4.02	17.91	9.19	0.54	0.00	0.21	0.55	1.30	0.67	0.18	0.09	19.39	9.95
13年目	H 37	0.99969	0.99400	0.99836	0.4936	12.16	0.00	1.71	4.00	17.87	8.82	0.54	0.00	0.21	0.55	1.30	0.64	0.18	0.09	19.35	9.55
14年目	H 38	0.99969	0.99396	0.99836	0.4746	12.16	0.00	1.70	3.97	17.83	8.46	0.54	0.00	0.21	0.54	1.29	0.61	0.18	0.08	19.30	9.16
15年目	H 39	0.99969	0.99392	0.99836	0.4564	12.16	0.00	1.69	3.95	17.79	8.12	0.54	0.00	0.21	0.54	1.29	0.59	0.18	0.08	19.26	8.79
16年目	H 40	0.99969	0.99389	0.99835	0.4388	12.15	0.00	1.68	3.93	17.76	7.79	0.54	0.00	0.21	0.54	1.28	0.56	0.18	0.08	19.22	8.43
17年目	H 41	0.99969	0.99385	0.99835	0.4220	12.15	0.00	1.67	3.90	17.72	7.48	0.54	0.00	0.21	0.53	1.28	0.54	0.18	0.07	19.17	8.09
18年目	H 42	0.99969	0.99381	0.99835	0.4057	12.14	0.00	1.66	3.88	17.68	7.17	0.54	0.00	0.20	0.53	1.27	0.52	0.18	0.07	19.13	7.76
19年目	H 43	0.99801	0.99542	0.99743	0.3901	12.12	0.00	1.65	3.86	17.63	6.88	0.54	0.00	0.20	0.53	1.27	0.49	0.18	0.07	19.07	7.44
20年目	H 44	0.99801	0.99540	0.99742	0.3751	12.10	0.00	1.64	3.84	17.58	6.59	0.54	0.00	0.20	0.52	1.26	0.47	0.18	0.07	19.02	7.13
21年目	H 45	0.99801	0.99538	0.99741	0.3607	12.07	0.00	1.64	3.82	17.53	6.32	0.54	0.00	0.20	0.52	1.26	0.45	0.18	0.06	18.97	6.84
22年目	H 46	0.99800	0.99536	0.99741	0.3468	12.05	0.00	1.63	3.81	17.48	6.06	0.53	0.00	0.20	0.52	1.25	0.44	0.17	0.06	18.91	6.56
23年目	H 47	0.99800	0.99534	0.99740	0.3335	12.02	0.00	1.62	3.79	17.43	5.81	0.53	0.00	0.20	0.52	1.25	0.42	0.17	0.06	18.86	6.29
24年目	H 48	0.99799	0.99531	0.99739	0.3207	12.00	0.00	1.61	3.77	17.38	5.57	0.53	0.00	0.20	0.51	1.25	0.40	0.17	0.06	18.80	6.03
25年目	H 49	0.99799	0.99529	0.99738	0.3083	11.98	0.00	1.60	3.75	17.33	5.34	0.53	0.00	0.20	0.51	1.24	0.38	0.17	0.05	18.75	5.78
26年目	H 50	0.99799	0.99527	0.99738	0.2965	11.95	0.00	1.60	3.74	17.28	5.12	0.53	0.00	0.20	0.51	1.24	0.37	0.17	0.05	18.69	5.54
27年目	H 51	0.99798	0.99525	0.99737	0.2851	11.93	0.00	1.59	3.72	17.23	4.91	0.53	0.00	0.20	0.51	1.23	0.35	0.17	0.05	18.64	5.31
28年目	H 52	0.99798	0.99522	0.99736	0.2741	11.90	0.00	1.58	3.70	17.18	4.71	0.53	0.00	0.20	0.50	1.23	0.34	0.17	0.05	18.59	5.09
29年目	H 53	0.99706	0.99834	0.99734	0.2636	11.87	0.00	1.58	3.69	17.14	4.52	0.53	0.00	0.20	0.50	1.23	0.32	0.17	0.05	18.54	4.89
30年目	H 54	0.99705	0.99834	0.99734	0.2534	11.83	0.00	1.58	3.69	17.10	4.33	0.53	0.00	0.19	0.50	1.22	0.31	0.17	0.04	18.49	4.69
31年目	H 55	0.99704	0.99834	0.99733	0.2437	11.80	0.00	1.57	3.68	17.05	4.16	0.52	0.00	0.19	0.50	1.22	0.30	0.17	0.04	18.44	4.49
32年目	H 56	0.99703	0.99833	0.99732	0.2343	11.76	0.00	1.57	3.68	17.01	3.99	0.52	0.00	0.19	0.50	1.22	0.29	0.17	0.04	18.40	4.31
33年目	H 57	0.99702	0.99833	0.99732	0.2253	11.73	0.00	1.57	3.67	16.97	3.82	0.52	0.00	0.19	0.50	1.21	0.27	0.17	0.04	18.35	4.13
34年目	H 58	0.99701	0.99833	0.99731	0.2166	11.69	0.00	1.57	3.66	16.92	3.67	0.52	0.00	0.19	0.50	1.21	0.26	0.17	0.04	18.30	3.96
35年目	H 59	0.99700	0.99833	0.99730	0.2083	11.66	0.00	1.56	3.66	16.88	3.52	0.52	0.00	0.19	0.50	1.21	0.25	0.17	0.04	18.26	3.80
36年目	H 60	0.99700	0.99832	0.99729	0.2003	11.62	0.00	1.56	3.65	16.83	3.37	0.52	0.00	0.19	0.50	1.21	0.24	0.17	0.03	18.21	3.65
37年目	H 61	0.99699	0.99832	0.99729	0.1926	11.59	0.00	1.56	3.64	16.79	3.23	0.51	0.00	0.19	0.50	1.20	0.23	0.17	0.03	18.16	3.50
38年目	H 62	0.99698	0.99832	0.99728	0.1852	11.55	0.00	1.56	3.64	16.75	3.10	0.51	0.00	0.19	0.50	1.20	0.22	0.17	0.03	18.12	3.36
39年目	H 63	0.99697	0.99831	0.99727	0.1780	11.52	0.00	1.55	3.63	16.70	2.97	0.51	0.00	0.19	0.50	1.20	0.21	0.17	0.03	18.07	3.22
合計						477.07	0.00	66.46	155.41	698.94	298.07	21.17	0.00	8.22	21.20	50.58	21.69	6.97	2.97	756.50	322.72

便益の現在価値算定表(残事業)

箇所名: 一般国道274号 徹別道路

年次	年度 (基準年) H19	総走行台数の年次別伸び率 (北海道ブロック)			割引率 (A)	走行時間短縮便益(億円)						走行経費減少便益(億円)					事故損出費用(億円)		合計 (億円)		
		乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 × (A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 (A) ×		現在価値 × (A)	費用合計 (-)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 24	1.00708	0.99735	1.00461	0.8219	4.15	0.00	0.50	1.31	5.96	4.90	0.08	0.00	0.04	0.07	0.19	0.16	0.12	0.10	6.27	5.16
1年目	H 25	1.00703	0.99734	1.00459	0.7903	4.18	0.00	0.50	1.31	5.99	4.73	0.08	0.00	0.04	0.07	0.19	0.15	0.12	0.09	6.30	4.98
2年目	H 26	1.00698	0.99733	1.00457	0.7599	4.21	0.00	0.50	1.30	6.01	4.57	0.08	0.00	0.04	0.07	0.19	0.15	0.12	0.09	6.32	4.81
3年目	H 27	1.00693	0.99733	1.00455	0.7307	4.24	0.00	0.50	1.30	6.04	4.41	0.08	0.00	0.04	0.07	0.19	0.14	0.12	0.09	6.35	4.64
4年目	H 28	1.00689	0.99732	1.00453	0.7026	4.27	0.00	0.50	1.30	6.06	4.26	0.08	0.00	0.04	0.07	0.19	0.14	0.12	0.08	6.38	4.48
5年目	H 29	1.00684	0.99731	1.00451	0.6756	4.30	0.00	0.49	1.29	6.09	4.11	0.08	0.00	0.04	0.07	0.20	0.13	0.12	0.08	6.40	4.32
6年目	H 30	1.00679	0.99731	1.00449	0.6496	4.33	0.00	0.49	1.29	6.11	3.97	0.09	0.00	0.04	0.07	0.20	0.13	0.12	0.08	6.43	4.17
7年目	H 31	1.00675	0.99730	1.00447	0.6246	4.36	0.00	0.49	1.29	6.13	3.83	0.09	0.00	0.04	0.07	0.20	0.12	0.12	0.08	6.45	4.03
8年目	H 32	1.00670	0.99729	1.00445	0.6006	4.39	0.00	0.49	1.28	6.16	3.70	0.09	0.00	0.04	0.07	0.20	0.12	0.12	0.07	6.48	3.89
9年目	H 33	0.99969	0.99414	0.99837	0.5775	4.38	0.00	0.49	1.28	6.15	3.55	0.09	0.00	0.04	0.07	0.20	0.11	0.12	0.07	6.46	3.73
10年目	H 34	0.99969	0.99410	0.99837	0.5553	4.38	0.00	0.48	1.27	6.14	3.41	0.09	0.00	0.04	0.07	0.19	0.11	0.12	0.07	6.45	3.58
11年目	H 35	0.99969	0.99407	0.99837	0.5339	4.38	0.00	0.48	1.26	6.12	3.27	0.09	0.00	0.04	0.07	0.19	0.10	0.12	0.06	6.44	3.44
12年目	H 36	0.99969	0.99403	0.99837	0.5134	4.38	0.00	0.48	1.25	6.11	3.14	0.09	0.00	0.04	0.07	0.19	0.10	0.12	0.06	6.43	3.30
13年目	H 37	0.99969	0.99400	0.99836	0.4936	4.38	0.00	0.48	1.25	6.10	3.01	0.09	0.00	0.04	0.07	0.19	0.10	0.12	0.06	6.41	3.17
14年目	H 38	0.99969	0.99396	0.99836	0.4746	4.38	0.00	0.47	1.24	6.09	2.89	0.09	0.00	0.04	0.06	0.19	0.09	0.12	0.06	6.40	3.04
15年目	H 39	0.99969	0.99392	0.99836	0.4564	4.38	0.00	0.47	1.23	6.08	2.77	0.09	0.00	0.04	0.06	0.19	0.09	0.12	0.05	6.39	2.92
16年目	H 40	0.99969	0.99389	0.99835	0.4388	4.37	0.00	0.47	1.22	6.06	2.66	0.09	0.00	0.04	0.06	0.19	0.08	0.12	0.05	6.38	2.80
17年目	H 41	0.99969	0.99385	0.99835	0.4220	4.37	0.00	0.46	1.22	6.05	2.55	0.09	0.00	0.04	0.06	0.19	0.08	0.12	0.05	6.36	2.68
18年目	H 42	0.99969	0.99381	0.99835	0.4057	4.37	0.00	0.46	1.21	6.04	2.45	0.09	0.00	0.04	0.06	0.19	0.08	0.12	0.05	6.35	2.58
19年目	H 43	0.99801	0.99542	0.99743	0.3901	4.36	0.00	0.46	1.20	6.02	2.35	0.09	0.00	0.04	0.06	0.19	0.07	0.12	0.05	6.33	2.47
20年目	H 44	0.99801	0.99540	0.99742	0.3751	4.35	0.00	0.46	1.20	6.01	2.25	0.09	0.00	0.04	0.06	0.19	0.07	0.12	0.04	6.32	2.37
21年目	H 45	0.99801	0.99538	0.99741	0.3607	4.35	0.00	0.45	1.19	5.99	2.16	0.09	0.00	0.04	0.06	0.19	0.07	0.12	0.04	6.30	2.27
22年目	H 46	0.99800	0.99536	0.99741	0.3468	4.34	0.00	0.45	1.19	5.98	2.07	0.09	0.00	0.04	0.06	0.19	0.06	0.12	0.04	6.28	2.18
23年目	H 47	0.99800	0.99534	0.99740	0.3335	4.33	0.00	0.45	1.18	5.96	1.99	0.09	0.00	0.04	0.06	0.19	0.06	0.12	0.04	6.26	2.09
24年目	H 48	0.99799	0.99531	0.99739	0.3207	4.32	0.00	0.45	1.17	5.94	1.91	0.09	0.00	0.04	0.06	0.19	0.06	0.12	0.04	6.25	2.00
25年目	H 49	0.99799	0.99529	0.99738	0.3083	4.31	0.00	0.45	1.17	5.93	1.83	0.09	0.00	0.04	0.06	0.18	0.06	0.12	0.04	6.23	1.92
26年目	H 50	0.99799	0.99527	0.99738	0.2965	4.30	0.00	0.44	1.16	5.91	1.75	0.09	0.00	0.04	0.06	0.18	0.05	0.12	0.03	6.21	1.84
27年目	H 51	0.99798	0.99525	0.99737	0.2851	4.29	0.00	0.44	1.16	5.89	1.68	0.08	0.00	0.04	0.06	0.18	0.05	0.12	0.03	6.19	1.77
28年目	H 52	0.99798	0.99522	0.99736	0.2741	4.29	0.00	0.44	1.15	5.88	1.61	0.08	0.00	0.04	0.06	0.18	0.05	0.12	0.03	6.18	1.69
29年目	H 53	0.99706	0.99834	0.99734	0.2636	4.27	0.00	0.44	1.15	5.86	1.55	0.08	0.00	0.04	0.06	0.18	0.05	0.12	0.03	6.16	1.62
30年目	H 54	0.99705	0.99834	0.99734	0.2534	4.26	0.00	0.44	1.15	5.85	1.48	0.08	0.00	0.04	0.06	0.18	0.05	0.12	0.03	6.15	1.56
31年目	H 55	0.99704	0.99834	0.99733	0.2437	4.25	0.00	0.44	1.15	5.83	1.42	0.08	0.00	0.04	0.06	0.18	0.04	0.12	0.03	6.13	1.49
32年目	H 56	0.99703	0.99833	0.99732	0.2343	4.23	0.00	0.44	1.14	5.82	1.36	0.08	0.00	0.04	0.06	0.18	0.04	0.12	0.03	6.11	1.43
33年目	H 57	0.99702	0.99833	0.99732	0.2253	4.22	0.00	0.44	1.14	5.80	1.31	0.08	0.00	0.04	0.06	0.18	0.04	0.11	0.03	6.10	1.37
34年目	H 58	0.99701	0.99833	0.99731	0.2166	4.21	0.00	0.44	1.14	5.79	1.25	0.08	0.00	0.04	0.06	0.18	0.04	0.11	0.02	6.08	1.32
35年目	H 59	0.99700	0.99833	0.99730	0.2083	4.20	0.00	0.43	1.14	5.77	1.20	0.08	0.00	0.04	0.06	0.18	0.04	0.11	0.02	6.07	1.26
36年目	H 60	0.99700	0.99832	0.99729	0.2003	4.18	0.00	0.43	1.14	5.76	1.15	0.08	0.00	0.04	0.06	0.18	0.04	0.11	0.02	6.05	1.21
37年目	H 61	0.99699	0.99832	0.99729	0.1926	4.17	0.00	0.43	1.14	5.74	1.11	0.08	0.00	0.04	0.06	0.18	0.03	0.11	0.02	6.03	1.16
38年目	H 62	0.99698	0.99832	0.99728	0.1852	4.16	0.00	0.43	1.13	5.73	1.06	0.08	0.00	0.04	0.06	0.18	0.03	0.11	0.02	6.02	1.11
39年目	H 63	0.99697	0.99831	0.99727	0.1780	4.15	0.00	0.43	1.13	5.71	1.02	0.08	0.00	0.04	0.06	0.18	0.03	0.11	0.02	6.00	1.07
合計						171.76	0.00	18.48	48.41	238.65	101.70	3.40	0.00	1.59	2.54	7.52	3.22	4.72	2.01	250.88	106.93
