

令和 6 年 5 月 17 日
帯広開発建設部

しもっしゅべつ 下牛首別排水機場の故障と対応について（第3報）

しもっしゅべつ しもっしゅべつ
下牛首別川・下牛首別排水機場（豊頃町）に設置されている4台の排水ポンプのうち、故障している排水ポンプ1台について点検を行った結果、復旧見込みは出水期前の6月下旬となることをお知らせいたします。

1 対象設備と状況

- ・対象設備：北海道中川郡豊頃町背負 下牛首別排水機場
- ・排水能力：7.5 m³/s × 4台
- ・損傷箇所：排水ポンプ1台（2号ポンプ）
- ・稼働状態：残り3台は正常に動作することを確認済み

2 現在の状況

3月28日に排水機場の出水期前の設備点検を実施したところ、2号ポンプが故障により稼働できないことが判明いたしました。

これを受けて臨時点検を実施したところ、ポンプの回転体[※]に焼損及び折損が確認されたことから、故障原因を把握するため、回転体を本州に所在する工場まで輸送し、点検を行った結果、回転体の設置位置の調整不良による破損が内部に確認できたため、今後復旧に向けた作業を行います。

現時点の復旧予定は出水期前の6月下旬を見込んでいます。

今後の状況については改めてお知らせします。

復旧までの間、北海道開発局が保有している排水ポンプ車等の配備により、地域の浸水被害の低減に努めます。

※ 回転体

ポンプ内部のプロペラを回転させるための部品全体の総称（別紙2参照）

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部

- ・一般的な問い合わせについて

施設整備課 課長 小宮山 一重 （電話 0155-24-4103）

- ・復旧までの代替対応について

治水課 課長 尾崎 光政 （電話 0155-24-4105）

帯広開発建設部ホームページ <https://www.hkd.mlit.go.jp/ob/index.html>


下牛首別排水機場 位置図



下牛首別排水機場 全景



下牛首別排水機場 平面図

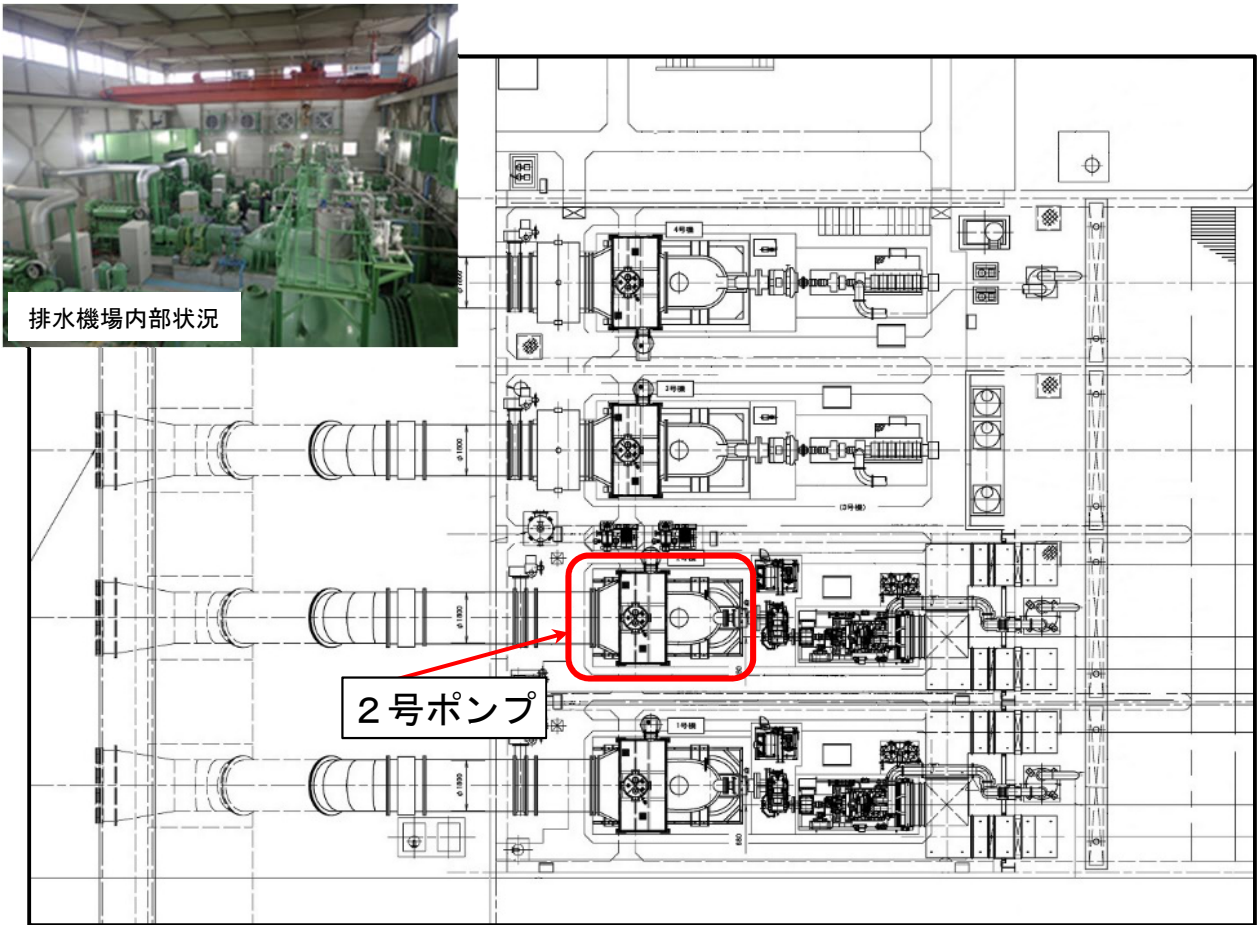

下牛首別排水機場 断面図

