ダム整備が効果を発揮（北海道　札内川ダム）（国管理）

〇令和7年9月1日の低気圧に伴う降雨により、札内川ダムにおいては、洪水量を超える流入量を観測。

〇札内川ダムの防災操作によって、下流河川の水量の低減を図り、下流の中札内村（上札内水位観測所）では、水位を約1.3m低減させる効果があったものと推測されます

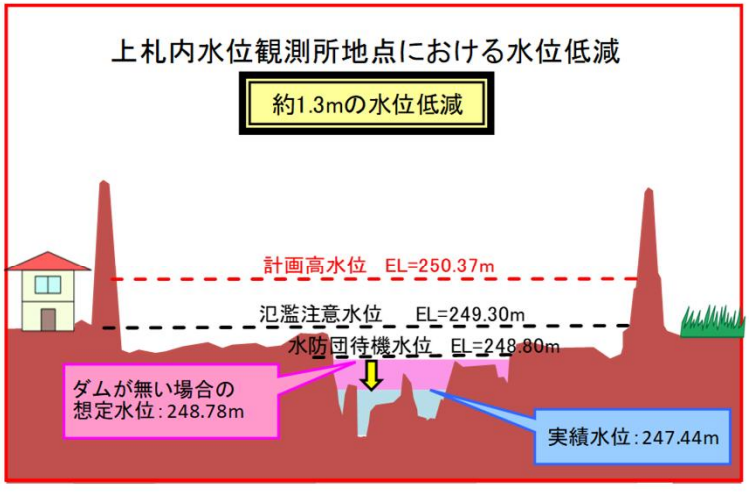

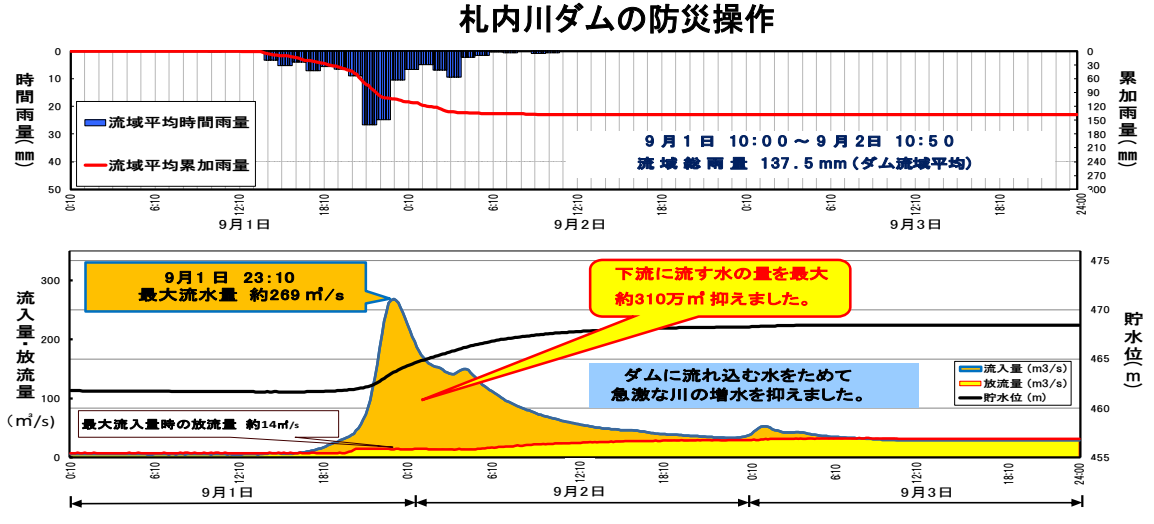

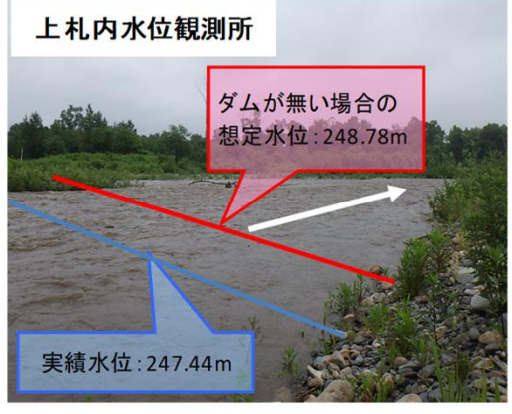

※本資料の数値は速報値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。
