ダム整備が効果を発揮（北海道 豊平峡（ほうへいきょう）ダム）（国管理）

○平成 26 年 9 月 11 日、低気圧による大雨により、豊平峡（ほうへいきょう）ダムにおいては、洪水量を超える流入量を観測。

○豊平峡（ほうへいきょう）ダムの洪水調節等によって下流河川の水位低減を図り、下流の札幌（さっぽろ）市（雁来（かりき）水位観測所）では、はん濫注意水位※１以下の水位に抑えることができました。

○仮にダムが整備されていなければ、はん濫危険水位※２を上回る出水となったことが想定されます。

※1 はん濫注意水位：災害が発生する危険性がある水位。水防団が出動して河川の警戒にあたる水位。
※2 はん濫危険水位：洪水等により相当の家屋浸水等の被害を生じるはん濫の恐れがある水位。

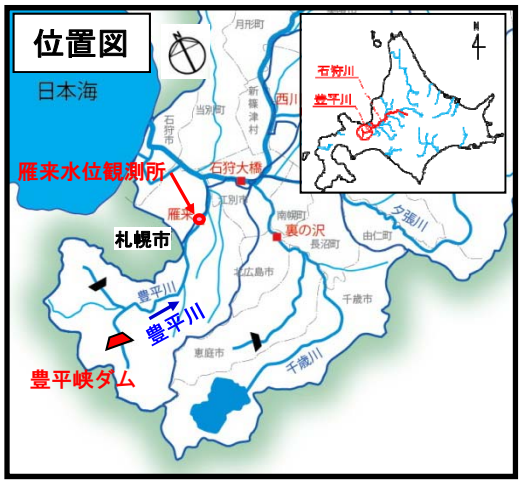

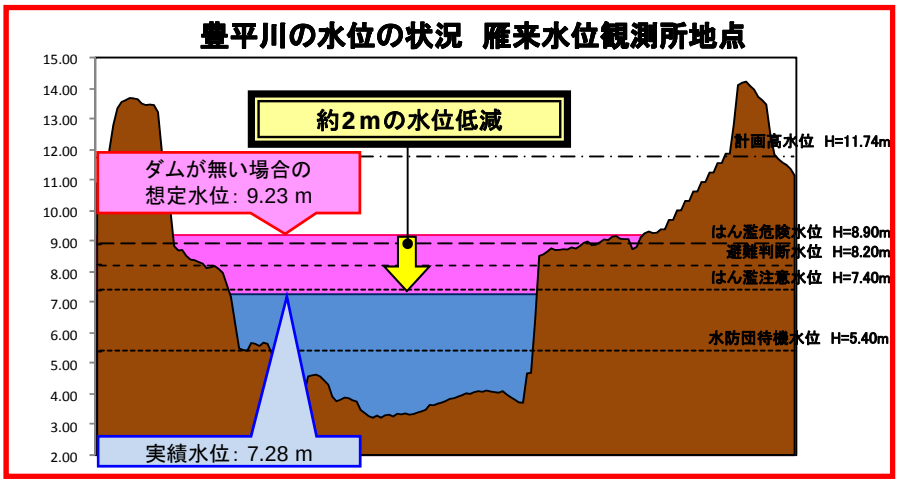

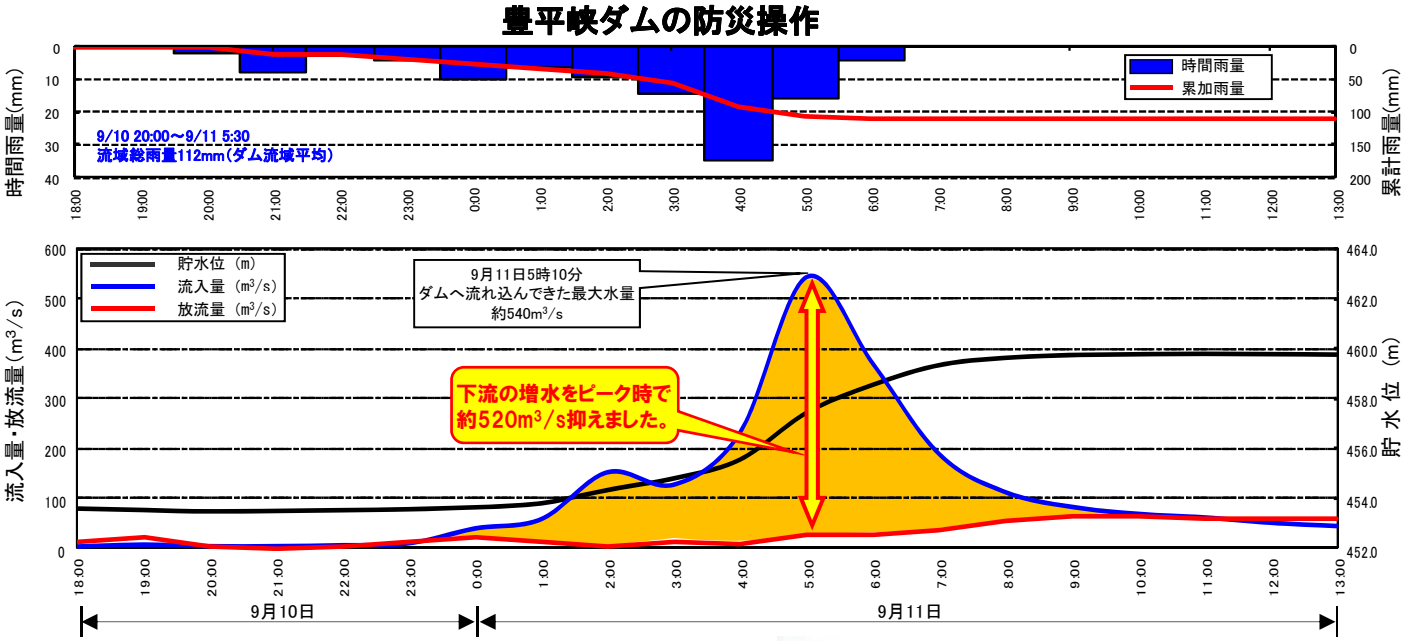

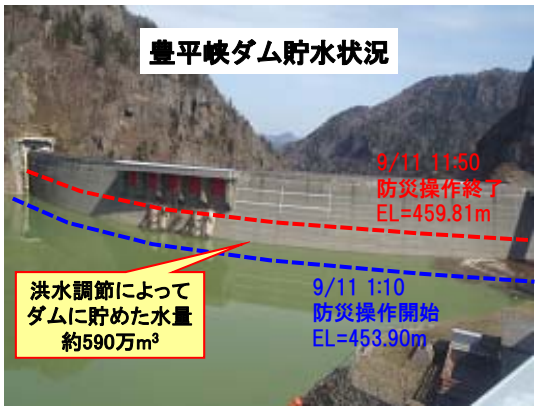

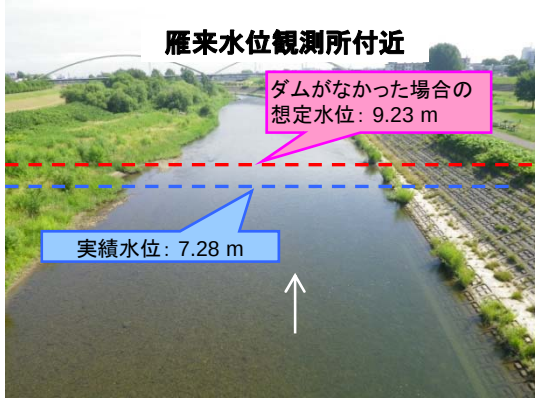

※本資料の数値は速報値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。
