

ひだか
日高自動車道

あつがしずない
厚賀静内道路

しずないみついし しずない ひがししずない
静内三石道路 (静内～東静内)

費用便益分析バックデータ

令和4年度

北海道開発局

目 次

費用便益分析の結果	3
交通状況の変化	5
費用便益分析の条件	9
費用の現在価値算定表	12
便益の現在価値算定表	14
地域の特殊性を考慮した便益の検討	20
参考資料（厚賀静内道路）	34
参考資料（静内三石道路（静内～東静内））	47

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
日高自動車道	厚真IC～三石	L=76.5km	高規格B	B P

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
6,800～11,700	2	北海道開発局

① 費用

	事業費	維持管理費	更新費	合計
基準年	令和4年度			
単純合計	2,982億円	737億円	139億円	3,859億円
うち残事業分	1,070億円	265億円	46億円	1,381億円
基準年における 現在価値(C)	4,052億円	331億円	27億円	4,410億円
うち残事業分	850億円	76億円	4.9億円	931億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和4年度			
供用年	平成16年度, 平成18年度, 平成24年度, 令和元年度, 令和12年度, 令和15年度, 令和17年度			
単年便益 (初年便益)	16億円	3.7億円	0.91億円	21億円
基準年における 現在価値(B)	4,567億円	656億円	142億円	5,365億円
うち残事業分	1,497億円	150億円	31億円	1,678億円

③ 結果

費用便益比(事業全体)	1.2
経済的純現在価値(事業全体)	956億円
経済的内部収益率(事業全体)	5.0%
費用便益比(残事業)	1.8
経済的純現在価値(残事業)	747億円
経済的内部収益率(残事業)	7.8%

注)費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比(B/C)
交通量	6,800~11,700	±10%	1.1~1.4
事業費	2,982億円	±10%	1.2~1.2
事業期間	45年	±20%	1.2~1.2

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比(B/C)
交通量	8,300~11,700	±10%	1.6~2.1
事業費	1,070億円	±10%	1.7~2.0
事業期間	12年	±20%	1.7~1.8

交通状況の変化(事業全体)

事業名:厚真IC~三石

(推計時点 R22年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] 76.5km	交通量	[台/日]	0	8,700	
	走行時間	[分]	0.0	63.2	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	107.83	
②主な 周辺道路	現道: 国道235号 81.2km	交通量	[台/日]	8,300	2,300
		走行時間	[分]	174.9	140.7
		走行時間費用	[億円/年]	277.92	63.24
	一)新冠 平取線 15.1km	交通量	[台/日]	100	0
		走行時間	[分]	27.5	27.4
		走行時間費用	[億円/年]	0.37	0.00
	主)平取 静内線 35.0km	交通量	[台/日]	800	400
		走行時間	[分]	45.7	44.7
		走行時間費用	[億円/年]	6.97	3.20
	一)静内 浦河線 9.4km	交通量	[台/日]	1,000	100
		走行時間	[分]	19.6	18.8
		走行時間費用	[億円/年]	3.49	0.43
③その他道路合計 26,191.0km	走行時間費用	[億円/年]	20,879.05	20,808.59	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計: 26,408.2km	走行時間短縮便益	[億円/年]	21,167.80	20,983.29	184.51

事業名:厚真IC~三石

【 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)】



交通状況の変化(残事業)

事業名:厚真IC~三石

(推計時点 R22年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] 36.5km	交通量	[台/日]	0	9,700	
	走行時間	[分]	0.0	28.1	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	53.49	
②主な 周辺道路	現道: 国道235号 81.2km	交通量	[台/日]	5,600	2,300
		走行時間	[分]	165.8	140.7
		走行時間費用	[億円/年]	181.67	63.24
	一)新冠 平取線 15.1km	交通量	[台/日]	300	0
		走行時間	[分]	27.8	27.4
		走行時間費用	[億円/年]	1.63	0.00
	主)平取 静内線 35.0km	交通量	[台/日]	600	400
		走行時間	[分]	45.3	44.7
		走行時間費用	[億円/年]	5.37	3.20
	一)静内 浦河線 9.4km	交通量	[台/日]	900	100
		走行時間	[分]	19.5	18.8
		走行時間費用	[億円/年]	3.48	0.43
③その他道路合計 26,231.0km	走行時間費用	[億円/年]	20,896.18	20,862.93	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計: 26,408.2km	走行時間短縮便益	[億円/年]	21,088.33	20,983.29	105.03

事業名:厚真IC～三石

【 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)】



費用便益分析の条件

事業名:厚真IC~三石

(2)

項目		チェック欄
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和4年2月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>
	その他	<input type="checkbox"/>
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間
	社会的割引率	4%
	基準年次	令和4年
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (R22)
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H27センサス)
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
	その他()	<input type="checkbox"/>
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
	有	<input type="checkbox"/>
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載
交通流推計	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>
	簡易手法	<input type="checkbox"/>
	簡易手法の 採択理由	小規模事業である <input type="checkbox"/> 山間部海岸部で併行道路が少ない <input type="checkbox"/> その他()
	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)	
	その他()	<input type="checkbox"/>
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input checked="" type="checkbox"/>
	採用理由を記載	交通容量未満・以上の路線が混在した配分結果となっているため、便益算出においては速度差の生ずる加重平均速度を用いた。
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>
	採用理由を記載	
その他()	<input type="checkbox"/>	

(3)

項目		チェック欄		
便 益 の 算 定	休日交通の 影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する 場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数	()%
	休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載			
	災害等による 通行止めの 影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する 場合のみ	採用した通行止め日数	()日
			採用した通行止め日数の考え方を記載	
とり止め交通を考慮する		<input type="checkbox"/>		
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載				
冬期交通の 影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>		
	考慮する	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する 場合のみ	採用した冬期日数	(94)日	
		採用した冬期日数の考え方を記載 当該地域の直近3か年(令和元年～令和3年)における最低気温0℃以下かつ積雪 1cm以上を満たす日数とし、94日と設定		
		冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載 Vmax、Vminについて低減		
交通流推計の 時点以外の 便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ()	<input type="checkbox"/>		
車種別時間 価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
車種別走行 経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少 便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走 行経費減少・交通 事故減少以外の便 益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
その他				

事業名:厚真IC～三石

(4)

		項目	チェック欄	
費用の算定	事業費	詳細事業計画による値を採用	<input type="checkbox"/>	
		標準投資パターンを採用	<input checked="" type="checkbox"/>	
		その他()	<input type="checkbox"/>	
	維持管理費	維持管理費の設定根拠を記載 当該区間を管轄する事務所における直轄国道の維持管理費実績に基づき算出		
	更新費	更新費の設定根拠を記載 評価対象期間末までに設計供用期間を超過する橋梁を対象に、当該橋梁または類似した橋梁の新設費用(仮設費用を含む)と旧橋撤去に要する費用を計上		
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である	<input checked="" type="checkbox"/>	
	当該道路整備が行われない場合の費用	考慮しない		<input checked="" type="checkbox"/>
		考慮する		<input type="checkbox"/>
		考慮する場合のみ	事業費を考慮	<input type="checkbox"/>
			維持管理費を考慮	<input type="checkbox"/>
		当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載(対策内容、費用等)		
その他				
4. その他				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				

費用の現在価値算定表(事業全体)

箇所名: 日高自動車道 厚真IC～三石				維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)					
				単価(億円)		延長(km)		単純単価(億円)	
				0.164		76.5		12.51	
年次	年度	割引率 4.0%	GDP デフレ率	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
				単純単価	現在単価	単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
-14年目	H 2	3.5081	109.89	0.98	3.18				
-13年目	H 3	3.3731	112.53	0.98	2.98				
-12年目	H 4	3.2434	114.08	1.97	5.70				
-11年目	H 5	3.1187	114.41	10.03	27.87				
-10年目	H 6	2.9987	114.30	10.68	28.56				
- 9年目	H 7	2.8834	113.70	13.41	34.64				
- 8年目	H 8	2.7725	113.20	19.15	47.80				
- 7年目	H 9	2.6658	114.20	50.09	119.16				
- 6年目	H 10	2.5633	113.60	72.99	167.82				
- 5年目	H 11	2.4647	112.00	116.97	262.29				
- 4年目	H 12	2.3699	110.70	75.01	163.64				
- 3年目	H 13	2.2788	109.40	103.63	219.97				
- 2年目	H 14	2.1911	107.60	76.84	159.45				
- 1年目	H 15	2.1088	106.10	56.15	113.62				
供用開始年次	H 16	2.0258	105.00	55.94	109.98	1.50	2.95		
1年目	H 17	1.9479	103.70	68.36	130.85	1.50	2.87		
供用開始(2年目)	H 18	1.8730	103.00	49.53	91.78	3.49	6.47		
3年目	H 19	1.8009	102.10	82.86	148.94	3.49	6.27		
4年目	H 20	1.7317	101.60	53.31	92.59	3.49	6.06		
5年目	H 21	1.6651	100.30	50.81	85.95	3.49	5.91		
6年目	H 22	1.6010	98.60	33.20	54.94	3.49	5.78		
7年目	H 23	1.5395	97.20	46.22	74.60	3.49	5.63		
供用開始(8年目)	H 24	1.4802	96.40	86.08	134.69	4.37	6.84		
9年目	H 25	1.4233	96.40	30.09	45.27	4.37	6.58		
10年目	H 26	1.3686	98.70	57.84	81.73	4.37	6.18		
11年目	H 27	1.3159	100.20	79.05	105.78	4.37	5.85		
12年目	H 28	1.2653	100.30	74.30	95.51	4.37	5.62		
13年目	H 29	1.2167	100.50	128.79	158.88	4.37	5.39		
14年目	H 30	1.1699	100.40	69.31	82.30	4.37	5.19		
供用開始(15年目)	R 1	1.1249	101.20	85.83	97.22	6.33	7.17		
16年目	R 2	1.0816	101.90	88.23	95.43	6.33	6.84		
17年目	R 3	1.0400	101.90	93.16	96.89	6.33	6.58		
18年目	R 4	1.0000	101.90	70.92	70.92	6.33	6.33		
19年目	R 5	0.9615	101.90	65.01	62.50	6.33	6.08		
20年目	R 6	0.9246	101.90	74.02	68.44	6.33	5.85		
21年目	R 7	0.8890	101.90	67.41	59.92	6.33	5.62		
22年目	R 8	0.8548	101.90	106.43	90.98	6.33	5.41		
23年目	R 9	0.8219	101.90	145.29	119.41	6.33	5.20		
24年目	R 10	0.7903	101.90	137.74	108.86	6.33	5.00		
25年目	R 11	0.7599	101.90	138.80	105.47	6.33	4.81		
供用開始(26年目)	R 12	0.7307	101.90	126.00	92.07	8.44	6.16		
27年目	R 13	0.7026	101.90	109.41	76.87	8.44	5.93		
28年目	R 14	0.6756	101.90	52.69	35.60	8.44	5.70		
供用開始(29年目)	R 15	0.6496	101.90	37.99	24.68	9.44	6.13		
30年目	R 16	0.6246	101.90	8.76	5.47	9.44	5.89		
供用開始(31年目)	R 17	0.6006	101.90			11.37	6.83		
32年目	R 18	0.5775	101.90			11.37	6.57		
33年目	R 19	0.5553	101.90			11.37	6.32		
34年目	R 20	0.5339	101.90			11.37	6.07		
35年目	R 21	0.5134	101.90			11.37	5.84		
36年目	R 22	0.4936	101.90			11.37	5.61		
37年目	R 23	0.4746	101.90			11.37	5.40		
38年目	R 24	0.4564	101.90			11.37	5.19		
39年目	R 25	0.4388	101.90			11.37	4.99		
40年目	R 26	0.4220	101.90			11.37	4.80		
41年目	R 27	0.4057	101.90			11.37	4.61		
42年目	R 28	0.3901	101.90			11.37	4.44		
43年目	R 29	0.3751	101.90			11.37	4.27		
44年目	R 30	0.3607	101.90			11.37	4.10		
45年目	R 31	0.3468	101.90			11.37	3.94		
46年目	R 32	0.3335	101.90			11.37	3.79		
47年目	R 33	0.3207	101.90			11.37	3.65		
48年目	R 34	0.3083	101.90			11.37	3.51		
49年目	R 35	0.2965	101.90			11.37	3.37		
50年目	R 36	0.2851	101.90			11.37	3.24	20.19	5.76
51年目	R 37	0.2741	101.90			11.37	3.12		
52年目	R 38	0.2636	101.90			11.37	3.00	33.36	8.79
53年目	R 39	0.2534	101.90			11.37	2.88		
54年目	R 40	0.2437	101.90			11.37	2.77		
55年目	R 41	0.2343	101.90			11.37	2.66		
56年目	R 42	0.2253	101.90			11.37	2.56		
57年目	R 43	0.2166	101.90			11.37	2.46		
58年目	R 44	0.2083	101.90			11.37	2.37	22.20	4.63
59年目	R 45	0.2003	101.90			11.37	2.28		
60年目	R 46	0.1926	101.90			11.37	2.19		
61年目	R 47	0.1852	101.90			11.37	2.11		
62年目	R 48	0.1780	101.90			11.37	2.02		
63年目	R 49	0.1712	101.90			11.37	1.95		
64年目	R 50	0.1646	101.90			11.37	1.87		
65年目	R 51	0.1583	101.90			11.37	1.80	17.24	2.73
66年目	R 52	0.1522	101.90			11.37	1.73		
67年目	R 53	0.1463	101.90			11.37	1.66		
68年目	R 54	0.1407	101.90			11.37	1.60		
69年目	R 55	0.1353	101.90			11.37	1.54		
70年目	R 56	0.1301	101.90			11.37	1.48		
71年目	R 57	0.1251	101.90			11.37	1.42		
72年目	R 58	0.1203	101.90			11.37	1.37		
73年目	R 59	0.1157	101.90			11.37	1.32		
74年目	R 60	0.1112	101.90			11.37	1.26		
75年目	R 61	0.1069	101.90			11.37	1.22	46.29	4.95
76年目	R 62	0.1028	101.90			11.37	1.17		
77年目	R 63	0.0989	101.90			11.37	1.12		
78年目	R 64	0.0951	101.90			11.37	1.08		
79年目	R 65	0.0914	101.90			11.37	1.04		
80年目	R 66	0.0879	101.90	-113.22	-9.35	11.37	1.00		
合計				2,869.05	4,051.84	736.97	330.91	139.28	26.85
単純事業費計				2,982.27		736.97		139.28	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表(残事業)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 日高自動車道 厚真IC~三石

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.152	36.5	5.55

年次	年度	割引率 4.0%	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
- 7年目	R 5	0.9615	101.90	65.01	62.50				
- 6年目	R 6	0.9246	101.90	74.02	68.44				
- 5年目	R 7	0.8890	101.90	67.41	59.92				
- 4年目	R 8	0.8548	101.90	106.43	90.98				
- 3年目	R 9	0.8219	101.90	145.29	119.41				
- 2年目	R 10	0.7903	101.90	137.74	108.86				
- 1年目	R 11	0.7599	101.90	138.80	105.47				
供用開始年次	R 12	0.7307	101.90	126.00	92.07	2.11	1.54		
1年目	R 13	0.7026	101.90	109.41	76.87	2.11	1.48		
2年目	R 14	0.6756	101.90	52.69	35.60	2.11	1.42		
供用開始(3年目)	R 15	0.6496	101.90	37.99	24.68	3.11	2.02		
4年目	R 16	0.6246	101.90	8.76	5.47	3.11	1.94		
供用開始(5年目)	R 17	0.6006	101.90			5.05	3.03		
6年目	R 18	0.5775	101.90			5.05	2.91		
7年目	R 19	0.5553	101.90			5.05	2.80		
8年目	R 20	0.5339	101.90			5.05	2.69		
9年目	R 21	0.5134	101.90			5.05	2.59		
10年目	R 22	0.4936	101.90			5.05	2.49		
11年目	R 23	0.4746	101.90			5.05	2.39		
12年目	R 24	0.4564	101.90			5.05	2.30		
13年目	R 25	0.4388	101.90			5.05	2.21		
14年目	R 26	0.4220	101.90			5.05	2.13		
15年目	R 27	0.4057	101.90			5.05	2.05		
16年目	R 28	0.3901	101.90			5.05	1.97		
17年目	R 29	0.3751	101.90			5.05	1.89		
18年目	R 30	0.3607	101.90			5.05	1.82		
19年目	R 31	0.3468	101.90			5.05	1.75		
20年目	R 32	0.3335	101.90			5.05	1.68		
21年目	R 33	0.3207	101.90			5.05	1.62		
22年目	R 34	0.3083	101.90			5.05	1.56		
23年目	R 35	0.2965	101.90			5.05	1.50		
24年目	R 36	0.2851	101.90			5.05	1.44		
25年目	R 37	0.2741	101.90			5.05	1.38		
26年目	R 38	0.2636	101.90			5.05	1.33		
27年目	R 39	0.2534	101.90			5.05	1.28		
28年目	R 40	0.2437	101.90			5.05	1.23		
29年目	R 41	0.2343	101.90			5.05	1.18		
30年目	R 42	0.2253	101.90			5.05	1.14		
31年目	R 43	0.2166	101.90			5.05	1.09		
32年目	R 44	0.2083	101.90			5.05	1.05		
33年目	R 45	0.2003	101.90			5.05	1.01		
34年目	R 46	0.1926	101.90			5.05	0.97		
35年目	R 47	0.1852	101.90			5.05	0.93		
36年目	R 48	0.1780	101.90			5.05	0.90		
37年目	R 49	0.1712	101.90			5.05	0.86		
38年目	R 50	0.1646	101.90			5.05	0.83		
39年目	R 51	0.1583	101.90			5.05	0.80		
40年目	R 52	0.1522	101.90			5.05	0.77		
41年目	R 53	0.1463	101.90			5.05	0.74		
42年目	R 54	0.1407	101.90			5.05	0.71		
43年目	R 55	0.1353	101.90			5.05	0.68		
44年目	R 56	0.1301	101.90			5.05	0.66		
45年目	R 57	0.1251	101.90			5.05	0.63		
46年目	R 58	0.1203	101.90			5.05	0.61		
47年目	R 59	0.1157	101.90			5.05	0.58		
48年目	R 60	0.1112	101.90			5.05	0.56		
49年目	R 61	0.1069	101.90			5.05	0.54	46.29	4.95
50年目	R 62	0.1028	101.90			5.05	0.52		
51年目	R 63	0.0989	101.90			5.05	0.50		
52年目	R 64	0.0951	101.90			5.05	0.48		
53年目	R 65	0.0914	101.90			5.05	0.46		
54年目	R 66	0.0879	101.90			5.05	0.44		
合計				-7.27	-0.64	5.05	0.44		
合計				1,062.28	849.64	264.82	76.11	46.29	4.95

単純事業費計	1,069.55	264.82	46.29
--------	----------	--------	-------

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表(事業全体)

箇所名:日高自動車道 厚真IC~三石

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (北海道ブロック)				GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)			合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車		割合率 4.0%	乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 ②×(A)	③	③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4.0%
供用開始年次	H 16	0.98873	0.95725	0.95369	0.98051	2.0258	105.00	10.51	1.56	3.94	16.02	31.49	2.64	0.29	0.75	3.68	7.24	0.91	1.79	20.15	40.52
1年目	H 17	0.95398	0.95904	0.99176	0.95871	1.9479	103.70	10.40	1.49	3.76	15.65	29.95	2.61	0.28	0.72	3.60	6.90	0.89	1.71	20.15	38.56
供用開始(2年目)	H 18	0.96105	0.96660	1.00122	0.96224	1.8730	103.00	24.75	3.49	9.88	38.12	70.64	5.56	0.55	1.73	7.84	14.52	1.89	3.51	47.85	88.57
3年目	H 19	0.93682	0.94276	0.97826	0.94238	1.8009	102.10	23.79	3.38	9.89	37.05	66.60	5.35	0.53	1.73	7.80	13.67	1.83	3.29	46.89	83.55
4年目	H 20	0.94683	0.96129	0.99443	0.96286	1.7317	101.60	22.29	3.18	9.87	35.14	61.03	5.01	0.50	1.69	7.20	12.50	1.72	2.99	44.06	78.53
5年目	H 21	0.94893	0.95625	0.98632	0.95578	1.6651	100.30	21.27	3.06	9.67	34.00	57.52	4.78	0.48	1.69	6.95	11.76	1.66	2.80	42.61	72.08
6年目	H 22	1.01616	1.03299	0.99374	1.01555	1.6010	98.60	20.19	2.93	9.63	32.75	54.18	4.54	0.46	1.69	6.68	11.05	1.58	2.62	41.01	67.85
7年目	H 23	1.04134	1.05759	1.01883	1.04074	1.5395	97.20	20.51	3.02	9.57	33.11	53.43	4.61	0.47	1.68	6.76	10.91	1.61	2.59	41.47	66.94
供用開始(8年目)	H 24	1.01834	1.03335	0.99677	1.01778	1.4802	96.40	31.02	4.91	13.61	49.54	77.51	5.91	0.59	2.18	8.68	13.58	2.02	3.16	60.24	94.25
9年目	H 25	1.00898	1.02303	0.98802	1.00845	1.4233	96.40	31.59	5.07	13.57	50.23	75.57	6.01	0.61	2.18	8.80	13.24	2.06	3.09	61.08	91.90
10年目	H 26	1.02076	1.03423	0.99997	1.02024	1.3686	98.70	31.87	5.19	13.40	50.47	71.31	6.07	0.63	2.15	8.84	12.50	2.07	2.93	61.38	86.73
11年目	H 27	0.99546	0.97919	0.99872	0.99346	1.3159	100.20	32.54	5.36	13.40	51.30	68.66	6.19	0.65	2.15	8.99	12.03	2.11	2.83	62.41	83.52
12年目	H 28	0.99544	0.97874	0.99872	0.99341	1.2653	100.30	32.39	5.25	13.39	51.03	65.60	6.17	0.63	2.15	8.95	11.50	2.10	2.70	62.08	79.80
13年目	H 29	0.99542	0.97828	0.99872	0.99337	1.2167	100.50	32.24	5.14	13.37	50.75	62.61	6.14	0.62	2.14	8.90	10.98	2.09	2.57	61.74	76.17
14年目	H 30	0.99540	0.97780	0.99872	0.99333	1.1699	100.40	32.09	5.03	13.35	50.48	59.93	6.11	0.61	2.14	8.86	10.52	2.07	2.46	61.41	72.91
供用開始(15年目)	R 1	0.99538	0.97730	0.99872	0.99328	1.1249	100.20	31.97	4.99	13.33	49.89	59.79	6.10	0.61	2.14	8.86	10.52	2.07	2.46	61.41	72.91
16年目	R 2	0.99536	0.97677	0.99872	0.99324	1.0816	101.90	36.71	9.27	23.30	89.28	96.58	9.28	0.96	3.41	13.65	14.77	2.95	3.19	105.88	114.52
17年目	R 3	0.99534	0.97622	0.99872	0.99319	1.0403	101.90	36.44	9.16	23.27	88.77	92.32	9.24	0.94	3.41	13.58	14.13	2.93	3.12	105.28	109.49
18年目	R 4	0.99531	0.97568	0.99871	0.99314	1.0000	101.90	36.18	9.06	23.24	88.26	88.26	9.20	0.92	3.40	13.51	13.51	2.91	2.91	104.68	104.68
19年目	R 5	0.99529	0.97503	0.99871	0.99310	0.9615	101.90	35.92	8.93	23.21	87.75	84.37	9.15	0.89	3.40	13.45	12.93	2.89	2.78	104.08	100.08
20年目	R 6	0.99527	0.97439	0.99871	0.99305	0.9246	101.90	35.65	8.81	23.18	87.24	80.67	9.11	0.87	3.39	13.38	12.37	2.87	2.65	103.49	95.68
21年目	R 7	0.99525	0.97372	0.99871	0.99300	0.8890	101.90	35.39	8.70	23.15	86.74	77.11	9.07	0.85	3.39	13.31	11.83	2.85	2.53	102.89	91.47
22年目	R 8	0.99523	0.97301	0.99871	0.99295	0.8548	101.90	35.13	7.98	23.12	86.23	73.71	9.02	0.83	3.38	13.24	11.31	2.83	2.42	102.29	87.44
23年目	R 9	0.99520	0.97226	0.99870	0.99290	0.8219	101.90	34.86	7.77	23.09	85.72	70.45	8.98	0.81	3.38	13.17	10.82	2.81	2.31	101.69	83.58
24年目	R 10	0.99518	0.97147	0.99870	0.99285	0.7903	101.90	34.60	7.55	23.06	85.21	67.34	8.94	0.78	3.38	13.10	10.35	2.79	2.20	101.09	79.89
25年目	R 11	0.99516	0.97063	0.99870	0.99280	0.7599	101.90	34.34	7.33	23.03	84.70	64.36	8.89	0.76	3.37	13.03	9.90	2.77	2.10	100.49	76.37
供用開始(26年目)	R 12	0.99401	0.98507	0.99820	0.99354	0.7307	101.90	89.32	12.48	33.34	135.15	135.55	12.24	1.22	4.48	19.24	14.06	4.10	2.99	158.49	115.81
27年目	R 13	0.99397	0.98484	0.99820	0.99349	0.7026	101.90	88.78	12.30	33.28	134.37	94.41	13.47	1.20	4.47	19.13	13.44	4.07	2.86	157.57	110.71
28年目	R 14	0.99393	0.98461	0.99820	0.99345	0.6756	101.90	88.25	12.11	33.22	133.58	90.25	13.39	1.18	4.46	19.03	12.85	4.05	2.73	156.66	105.84
供用開始(29年目)	R 15	0.99390	0.98437	0.99819	0.99341	0.6496	101.90	104.52	16.14	38.21	158.88	103.21	15.00	1.52	4.85	21.37	13.88	4.49	2.91	184.74	120.01
30年目	R 16	0.99386	0.98412	0.99819	0.99337	0.6246	101.90	103.88	15.99	38.15	157.92	98.64	14.91	1.49	4.84	21.25	13.27	4.46	2.78	183.62	114.59
供用開始(31年目)	R 17	0.99382	0.98386	0.99819	0.99332	0.6006	101.90	124.77	21.14	44.57	190.47	114.40	16.54	1.64	4.87	23.25	13.96	4.92	2.90	219.54	131.26
32年目	R 18	0.99378	0.98360	0.99818	0.99328	0.5775	101.90	124.00	20.80	44.49	189.28	109.21	16.44	1.61	4.86	23.11	13.35	4.79	2.77	217.18	125.42
33年目	R 19	0.99374	0.98332	0.99818	0.99323	0.5553	101.90	123.22	20.46	44.40	188.09	104.44	16.34	1.58	4.85	22.97	12.75	4.76	2.64	215.81	119.84
34年目	R 20	0.99370	0.98304	0.99818	0.99318	0.5339	101.90	122.45	20.12	44.32	186.89	99.78	16.24	1.55	4.84	22.83	12.19	4.72	2.52	214.45	114.49
35年目	R 21	0.99366	0.98275	0.99817	0.99314	0.5134	101.90	121.68	19.78	44.24	185.70	95.34	16.14	1.52	4.84	22.69	11.65	4.69	2.41	213.08	109.40
36年目	R 22	0.99362	0.98249	0.99817	0.99309	0.4936	101.90	120.91	19.43	44.16	184.51	91.07	16.03	1.49	4.83	22.55	11.13	4.66	2.30	211.71	104.50
37年目	R 23	0.99358	0.98223	0.99817	0.99304	0.4746	101.90	119.86	19.28	44.13	183.27	86.98	15.93	1.47	4.82	22.39	10.63	4.63	2.20	210.29	99.80
38年目	R 24	0.99354	0.98197	0.99817	0.99299	0.4556	101.90	118.81	19.12	44.10	182.03	83.08	15.75	1.46	4.82	22.23	10.15	4.59	2.10	208.86	95.32
39年目	R 25	0.99350	0.98171	0.99817	0.99294	0.4368	101.90	117.76	18.96	44.07	180.80	79.33	15.62	1.45	4.82	22.08	9.69	4.56	2.00	207.44	91.02
40年目	R 26	0.99346	0.98145	0.99817	0.99289	0.4180	101.90	116.71	18.80	44.05	179.56	75.77	15.48	1.43	4.81	21.92	9.25	4.53	1.91	206.01	86.94
41年目	R 27	0.99342	0.98119	0.99817	0.99284	0.3992	101.90	115.66	18.65	44.02	178.33	72.35	15.34	1.42	4.81	21.77	8.82	4.49	1.82	204.59	83.00
42年目	R 28	0.99338	0.98093	0.99817	0.99279	0.3804	101.90	114.61	18.49	43.99	177.09	69.08	15.20	1.41	4.81	21.61	8.43	4.46	1.74	203.16	79.25
43年目	R 29	0.99334	0.98067	0.99817	0.99274	0.3616	101.90	113.56	18.33	43.96	175.85	65.96	15.06	1.39	4.80	21.45	8.05	4.43	1.66	201.73	75.67
44年目	R 30	0.99330	0.98041	0.99817	0.99269	0.3428	101.90	112.51	18.18	43.93	174.62	62.88	14.92	1.38	4.80	21.30	7.68	4.39	1.58	200.31	72.25
45年目	R 31	0.99326	0.98015	0.99817	0.99264	0.3240	101.90	111.46	18.02	43.90	173.38	60.13	14.79	1.36	4.80	21.14	7.33	4.36	1.51	198.88	68.97
46年目	R 32	0.99322	0.97989	0.99817	0.99259	0.3052	101.90	110.41	17.86	43.87	172.14</										

便益の現在価値算定表(残事業)

箇所名:日高自動車道 厚真IC~三石

年次	年度 (基準年) R4	総走行台キロの年次別伸び率 (北海道ブロック)				GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)		
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車		乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4.0%	
																					割引率 4.0% (A)
供用開始年次	R 12	0.99401	0.98507	0.99820	0.99354	0.7307	101.90	35.25	5.37	10.34	50.96	37.23	4.70	0.48	1.11	6.29	4.59	1.35	0.99	58.59	42.81
1年目	R 13	0.99397	0.98484	0.99820	0.99349	0.7026	101.90	35.03	5.29	10.33	50.65	35.58	4.67	0.47	1.11	6.25	4.39	1.34	0.94	58.24	40.92
2年目	R 14	0.99393	0.98461	0.99820	0.99345	0.6756	101.90	34.82	5.21	10.31	50.34	34.01	4.64	0.46	1.11	6.21	4.20	1.33	0.90	57.88	39.10
供用開始(3年目)	R 15	0.99390	0.98437	0.99819	0.99341	0.6496	101.90	51.42	9.34	15.34	76.10	49.44	6.31	0.81	1.50	8.63	5.60	1.79	1.16	86.52	56.20
4年目	R 16	0.99386	0.98412	0.99819	0.99337	0.6246	101.90	51.10	9.20	15.31	75.61	47.23	6.27	0.80	1.50	8.57	5.35	1.78	1.11	85.97	53.69
供用開始(5年目)	R 17	0.99382	0.98386	0.99819	0.99332	0.6006	101.90	72.31	14.55	21.77	108.64	65.25	7.96	1.15	1.53	10.64	6.39	2.16	1.30	121.45	72.94
6年目	R 18	0.99378	0.98360	0.99818	0.99328	0.5775	101.90	71.87	14.32	21.73	107.92	62.32	7.91	1.13	1.53	10.57	6.11	2.15	1.24	120.64	69.67
7年目	R 19	0.99374	0.98332	0.99818	0.99323	0.5553	101.90	71.42	14.08	21.69	107.20	59.53	7.86	1.11	1.53	10.50	5.83	2.13	1.19	119.83	66.54
8年目	R 20	0.99370	0.98304	0.99818	0.99318	0.5339	101.90	70.97	13.85	21.66	106.48	56.85	7.81	1.10	1.53	10.43	5.57	2.12	1.13	119.03	63.55
9年目	R 21	0.99366	0.98275	0.99817	0.99314	0.5134	101.90	70.53	13.61	21.62	105.75	54.29	7.76	1.08	1.52	10.36	5.32	2.11	1.08	118.22	60.70
10年目	R 22	0.99132	0.99191	0.99934	0.99287	0.4936	101.90	70.08	13.38	21.58	105.03	51.84	7.71	1.06	1.52	10.29	5.08	2.09	1.03	117.42	57.96
11年目	R 23	0.99124	0.99184	0.99934	0.99282	0.4746	101.90	69.47	13.27	21.56	104.30	49.50	7.65	1.05	1.52	10.22	4.85	2.08	0.99	116.59	55.34
12年目	R 24	0.99116	0.99177	0.99934	0.99277	0.4564	101.90	68.86	13.16	21.55	103.57	47.27	7.58	1.04	1.52	10.14	4.63	2.06	0.94	115.77	52.84
13年目	R 25	0.99108	0.99171	0.99934	0.99272	0.4388	101.90	68.25	13.05	21.53	102.84	45.13	7.51	1.03	1.52	10.06	4.42	2.05	0.90	114.95	50.44
14年目	R 26	0.99100	0.99164	0.99934	0.99266	0.4220	101.90	67.64	12.94	21.52	102.11	43.09	7.44	1.02	1.52	9.99	4.21	2.03	0.86	114.13	48.16
15年目	R 27	0.99092	0.99157	0.99934	0.99261	0.4057	101.90	67.04	12.84	21.50	101.38	41.13	7.38	1.02	1.52	9.91	4.02	2.02	0.82	113.30	45.97
16年目	R 28	0.99084	0.99149	0.99934	0.99256	0.3901	101.90	66.43	12.73	21.49	100.65	39.26	7.31	1.01	1.51	9.83	3.84	2.00	0.78	112.48	43.88
17年目	R 29	0.99075	0.99142	0.99933	0.99250	0.3751	101.90	65.82	12.62	21.48	99.91	37.48	7.24	1.00	1.51	9.76	3.66	1.99	0.75	111.66	41.88
18年目	R 30	0.99067	0.99135	0.99933	0.99244	0.3607	101.90	65.21	12.51	21.46	99.18	35.78	7.18	0.99	1.51	9.68	3.49	1.97	0.71	110.83	39.98
19年目	R 31	0.99058	0.99127	0.99933	0.99239	0.3468	101.90	64.60	12.40	21.45	98.45	34.14	7.11	0.98	1.51	9.60	3.33	1.96	0.68	110.01	38.15
20年目	R 32	0.99049	0.99119	0.99933	0.99233	0.3335	101.90	63.99	12.30	21.43	97.72	32.59	7.04	0.97	1.51	9.53	3.18	1.94	0.65	109.19	36.41
21年目	R 33	0.99040	0.99112	0.99933	0.99227	0.3207	101.90	63.38	12.19	21.42	96.99	31.10	6.98	0.96	1.51	9.45	3.03	1.93	0.62	108.37	34.75
22年目	R 34	0.99031	0.99104	0.99933	0.99221	0.3083	101.90	62.78	12.08	21.40	96.26	29.68	6.91	0.96	1.51	9.37	2.89	1.91	0.59	107.54	33.16
23年目	R 35	0.99021	0.99096	0.99933	0.99215	0.2965	101.90	62.17	11.97	21.39	95.53	28.32	6.84	0.95	1.51	9.30	2.76	1.90	0.56	106.72	31.64
24年目	R 36	0.99011	0.99087	0.99933	0.99208	0.2851	101.90	61.56	11.86	21.38	94.80	27.03	6.77	0.94	1.51	9.22	2.63	1.88	0.54	105.90	30.19
25年目	R 37	0.99002	0.99079	0.99933	0.99202	0.2741	101.90	60.95	11.75	21.36	94.07	25.78	6.71	0.93	1.51	9.14	2.51	1.87	0.51	105.08	28.80
26年目	R 38	0.98991	0.99070	0.99933	0.99196	0.2636	101.90	60.34	11.65	21.35	93.33	24.60	6.64	0.92	1.50	9.07	2.39	1.85	0.49	104.25	27.48
27年目	R 39	0.98981	0.99062	0.99933	0.99189	0.2534	101.90	59.73	11.54	21.33	92.60	23.47	6.57	0.91	1.50	8.99	2.28	1.84	0.47	103.43	26.21
28年目	R 40	0.98971	0.99053	0.99933	0.99182	0.2437	101.90	59.12	11.43	21.32	91.87	22.39	6.51	0.90	1.50	8.91	2.17	1.82	0.44	102.61	25.01
29年目	R 41	0.98960	0.99044	0.99933	0.99176	0.2343	101.90	58.52	11.32	21.30	91.14	21.35	6.44	0.90	1.50	8.84	2.07	1.81	0.42	101.79	23.85
30年目	R 42	0.98949	0.99034	0.99933	0.99169	0.2253	101.90	57.91	11.21	21.29	90.41	20.37	6.37	0.89	1.50	8.76	1.97	1.79	0.40	100.96	22.75
31年目	R 43	0.98938	0.99025	0.99933	0.99162	0.2166	101.90	57.30	11.10	21.28	89.68	19.42	6.31	0.88	1.50	8.68	1.88	1.78	0.39	100.14	21.69
32年目	R 44	0.98926	0.99015	0.99933	0.99155	0.2083	101.90	56.69	11.00	21.26	88.95	18.53	6.24	0.87	1.50	8.61	1.79	1.76	0.37	99.32	20.69
33年目	R 45	0.98915	0.99006	0.99933	0.99148	0.2003	101.90	56.08	10.89	21.25	88.22	17.67	6.17	0.86	1.50	8.53	1.71	1.75	0.35	98.50	19.73
34年目	R 46	0.98903	0.98996	0.99933	0.99140	0.1926	101.90	55.47	10.78	21.23	87.49	16.85	6.11	0.85	1.50	8.45	1.63	1.73	0.33	97.67	18.81
35年目	R 47	0.98891	0.98985	0.99933	0.99133	0.1852	101.90	54.86	10.67	21.22	86.75	16.07	6.04	0.84	1.50	8.38	1.55	1.72	0.32	96.85	17.94
36年目	R 48	0.98878	0.98975	0.99933	0.99125	0.1780	101.90	54.26	10.56	21.20	86.02	15.31	5.97	0.84	1.49	8.30	1.48	1.70	0.30	96.03	17.09
37年目	R 49	0.98866	0.98964	0.99933	0.99118	0.1712	101.90	53.65	10.45	21.19	85.29	14.60	5.90	0.83	1.49	8.22	1.41	1.69	0.29	95.21	16.30
38年目	R 50	0.98853	0.98954	0.99933	0.99110	0.1646	101.90	53.04	10.35	21.18	84.56	13.92	5.84	0.82	1.49	8.15	1.34	1.67	0.28	94.38	15.54
39年目	R 51	0.98839	0.98943	0.99933	0.99102	0.1583	101.90	52.43	10.24	21.16	83.83	13.27	5.77	0.81	1.49	8.07	1.28	1.66	0.26	93.56	14.81
40年目	R 52	0.98826	0.98931	0.99932	0.99094	0.1522	101.90	51.82	10.13	21.15	83.10	12.65	5.70	0.80	1.49	8.00	1.22	1.64	0.25	92.74	14.11
41年目	R 53	0.98812	0.98920	0.99932	0.99085	0.1463	101.90	51.21	10.02	21.13	82.37	12.05	5.64	0.79	1.49	7.92	1.16	1.63	0.24	91.92	13.45
42年目	R 54	0.98797	0.98908	0.99932	0.99077	0.1407	101.90	50.60	9.91	21.12	81.64	11.49	5.57	0.78	1.49	7.84	1.10	1.61	0.23	91.09	12.82
43年目	R 55	0.98783	0.98896	0.99932	0.99068	0.1353	101.90	50.00	9.81	21.10	80.91	10.95	5.50	0.78	1.49	7.77	1.05	1.60	0.22	90.27	12.21
44年目	R 56	0.98768	0.98883	0.99932	0.99059	0.1301	101.90	49.39	9.70	21.09	80.17	10.43	5.44	0.77	1.49	7.69	1.00	1.58	0.21	89.45	11.64
45年目	R 57	0.98752	0.98871	0.99932	0.99051	0.1251	101.90	48.78	9.59	21.08	79.44	9.94	5.37	0.76	1.49	7.61	0.95	1.57	0.20	88.62	11.09
46年目	R 58	0.98737	0.98858	0.99932	0.99041	0.1203	101.90	48.17	9.48	21.06	78.71	9.47	5.30	0.75	1.48	7.54	0.91	1.55	0.19	87.80	10.56
47年目	R 59	0.98720	0.98845	0.99932	0.99032	0.1157	101.90	47.56	9.37	21.05	77.98	9.02	5.23	0.74	1.48	7.46	0.86	1.54	0.18	86.98	10.06
48年目	R 60	0.98704	0.98831	0.99932	0.99023	0.1112	101.90	46.95	9.26	21.03	77.25	8.59	5.17	0.73	1.48	7.38	0.82	1.52	0.17	86.16	9.58
49年目	R 61	0.98687	0.98817	0.99932	0.99013	0.1069	101.90	46.34	9.16	21.02	76.52	8.18	5.10	0.72	1.48	7.31	0.78	1.51	0.16	85.33	9.12
50年目	R 62	0.98669	0.98803	0.99932	0.99003	0.1028	101.90	45.74	9.05	21.00	75.79	7.79	5.03	0.72	1.48	7.23	0.74	1.49	0.15	84.51	8.69
51年目	R 63	0.98651	0.98789	0.99932	0.98993	0.0989	101.90	45.13	8.94	20.99	75.06	7.42	4.97	0.71	1.48	7.15	0.71	1.48	0.15	83.69	8.28
52年目	R 64	0.98633	0.98774	0.9																	

路線名	箇所名	車線数	延長
日高自動車道 (一般国道235号)	厚真～三石(一体評価)	2	76.5km

■事業費内訳(事業全体)

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
①	工事費				248,007	
	改良費				98,776	
		土工	m3	26,160,794	44,099	切土(m3)、盛土(m3)
		軟弱地盤対策工	式	1	14,151	深層混合処理工法
		法面工	m2	2,805,486	15,833	切土法面、盛土法面
		擁壁工	式	1	1,328	
		排水工	式	1	8,948	U型側溝、集水樹等
		函渠工	箇所	1,454	10,915	ボックスカルバート
		管渠工	m	6,715	776	横断管渠
		防護柵工	m	66,756	1,263	ガードケーブル、立入防止柵等
		付帯施設工	式	1	1,400	道路照明設備、道路情報表示設備等
		付替道路工	式	1	62	
	橋梁費				53,400	
		100m以上	m	3,920	30,926	14橋
		100m未満	m	1,608	19,822	34橋
		跨道橋	m	749	2,651	16橋
	トンネル費				63,525	
		NATM	m	8,203	63,525	5本
		シールド	m	-	-	
	IC・JCT費				4,863	
		IC	箇所	9	4,863	日高門別IC、日高厚賀IC、新冠IC(仮称)、静内IC(仮称)、東静内IC(仮称)、三石IC(仮称)
		JCT	箇所	-	-	
	舗装費				16,451	
		車道	m2	603,797	11,417	
		歩道	m2	-	-	
		舗装工(一式)	式	1	4,844	
		区画線工	m	83,991	19	
		縁石工	式	1	171	アスカープ等
	付帯施設費				10,991	
		交通管理施設工	式	1	10,991	
		情報ボックス	式	-	-	
		遮音壁	式	-	-	
②	用地及補償費				30,392	
	用地費		m2	3,928,027	11,322	
		宅地	m2	126,243	1,528	
		牧草地・畑・水田	m2	1,097,362	2,373	
		山林・雑種地	m2	1,307,929	213	
		用地費(一式)	m2	1,396,493	7,207	
	補償費		式	1	19,070	
③	間接経費		式	1	41,881	地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費
事業費合計					320,279	

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名	箇所名	車線数	延長
日高自動車道 (一般国道235号)	厚真～三石(一体評価)	2	76.5km

■事業費内訳(残事業)

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
①工事費					101,298	
	改良費				33,591	
		土工	m3	10,241,300	16,076	切土(m3)、盛土(m3)
		軟弱地盤対策工	式	1	7,071	深層混合処理工法
		法面工	m2	814,600	4,084	切土法面、盛土法面
		擁壁工	式	1	653	
		排水工	式	1	1,874	U型側溝、集水樹等
		函渠工	箇所	1,382	3,210	ボックスカルバート
		管渠工	m	5,807	561	横断管渠
		防護柵工	m	-	-	ガードケーブル、立入防止柵等
		付替道路工	式	1	62	
	橋梁費				21,013	
		100m以上	m	1,478	7,110	14橋
		100m未満	m	914	13,414	34橋
		跨道橋	m	353	489	16橋
	トンネル費				32,389	
		NATM	m	6,191	32,389	1本+1本=2本
		シールド	m	-	-	
	IC・JCT費				2,255	
		IC	箇所	6	2,255	日高厚賀IC、新冠IC(仮称)、静内IC(仮称)、東静内IC(仮称)、三石IC(仮称)
		JCT	箇所	-	-	
	舗装費				5,494	
		車道舗装	m2	382,839	5,494	
		歩道舗装	m2	0	0	
	付帯施設費				6,556	
		交通管理施設工	式	3	6,556	
		遮音壁	式	-	-	
②用地及補償費					1,112	
	用地費		m2	1,210,715	727	
		宅地	m2	15,341	201	
		牧草地・畑・水田	m2	309,067	386	
		山林・雑種地	m2	886,307	140	
	補償費		式	1	385	
③間接経費			式	1	15,168	地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費
事業費合計					117,578	

【単価等について】

- 工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用
- 用地補償算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

全事業

路線名	箇所名	車線数	延長
日高自動車道 (一般国道235号)	厚真IC～三石	2	76.5km

■維持管理費内訳

区分	単位	数量	金額 (百万円)	備考
維持費	km	76.5	29,111	巡回、清掃、除草、除雪等
修繕費	式	1	51,956	路面補修、構造物の点検・補修等
その他	式			
維持管理費合計			81,067	

■更新費内訳

区分	単位	数量	金額 (百万円)	備考
更新費	式	1	13,928	構造物の更新
更新費合計			13,928	

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

○更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。

残事業

路線名	箇所名	車線数	延長
日高自動車道 (一般国道235号)	厚真IC～三石	2	36.5km

■維持管理費内訳

区分	単位	数量	金額 (百万円)	備考
維持費	km	36.5	10,988	巡回、清掃、除草、除雪等
修繕費	式	1	18,142	路面補修、構造物の点検・補修等
その他	式			
維持管理費合計			29,130	

■更新費内訳

区分	単位	数量	金額 (百万円)	備考
更新費	式	1	4,629	構造物の更新
更新費合計			4,629	

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

○更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。

1. 事業の投資効果

(1) 地域の特殊性を考慮した便益の検討

北海道開発局事業審議委員会（平成21年6月開催）では、「道路事業の事業評価において、3便益以外に地域の特殊性等を考慮した多様な便益についても適切に反映できるよう検討し、事業評価を充実されたい。」とのご意見をいただいているところです。

今回、試算としてではありませんが、現段階での知見に基づき便益算出の検討を行いました。

当該事業箇所周辺の救急医療（高次医療）は、苫小牧市内の医療施設へ搬送されており、道路整備による救急医療へのアクセス向上効果について試算しております。

また、道路の整備により移動時の所要時間の変動（ばらつき）が減少し、時間に遅れないために見込む余裕時間の短縮効果、道路整備により旅行速度や交通量が変化することによるCO₂排出削減効果について試算しております。


1) 救急医療改善効果

① 便益算定の考え方

生死に係わる患者の傷病発生から手当てが施されるまでの経過時間が生存率に大きく影響します。道路整備によって救急医療へのアクセスが向上することで、生死に係わる傷病の発生から救命処置が施されるまでの経過時間が短縮し、救命数が増加するものと考えられます。


そこで、「九州地方を対象とした救急医療改善効果の研究結果」を参考とし、救われる人命価値を道路整備による便益として試算しました。

【概念図】 救急医療改善効果の概念

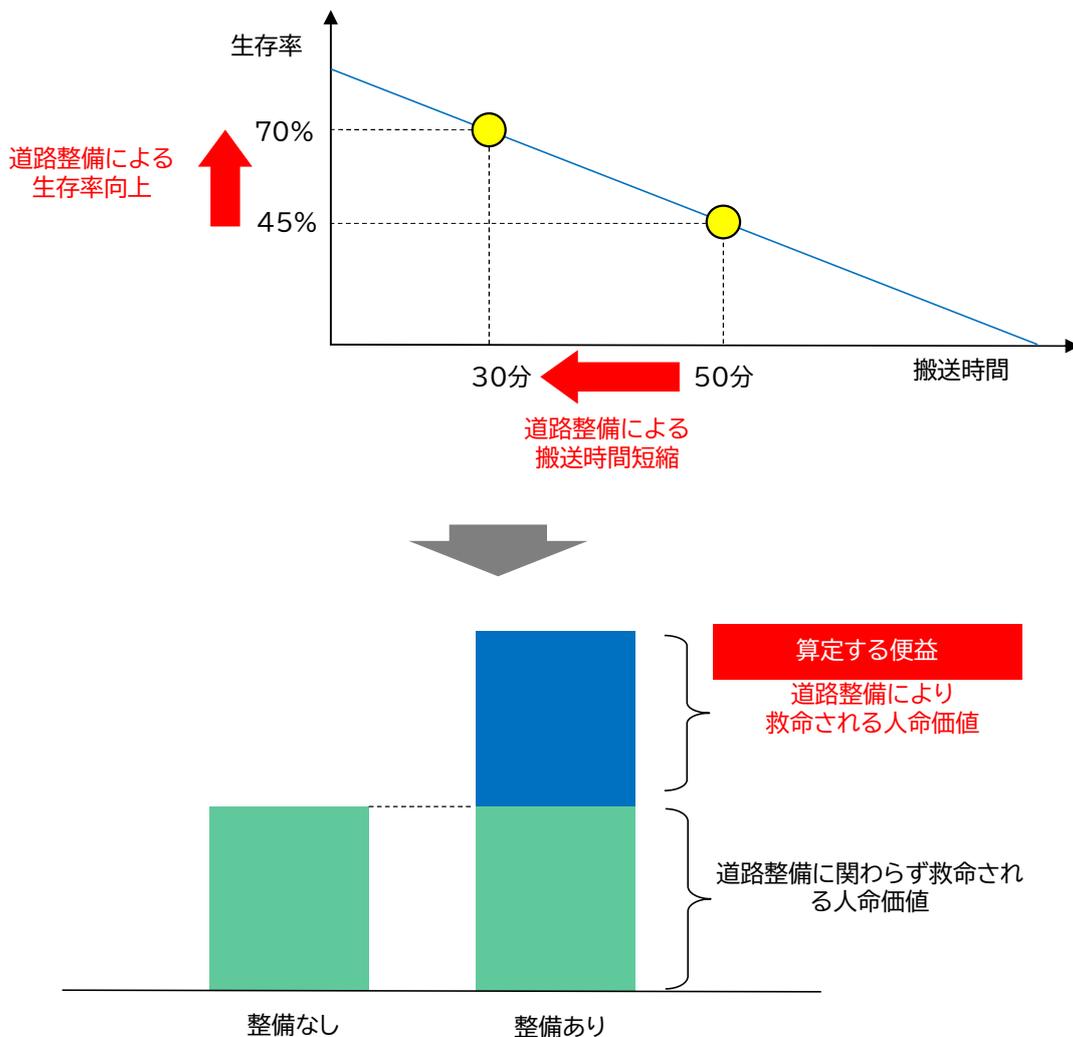

②便益算定のフローと算定式

改善効果は、道路の整備による搬送時間短縮に伴う生存者増加数の貨幣評価値より試算しました。

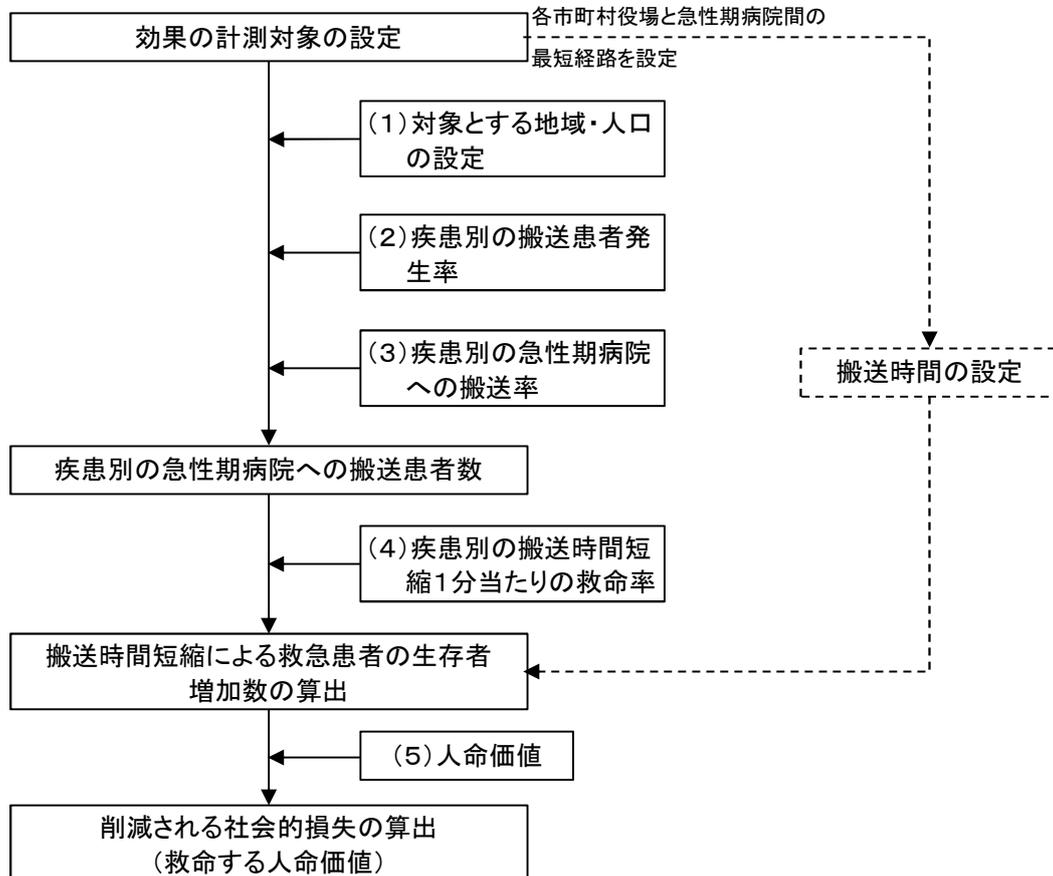

◎救急医療改善効果（円／年）（搬送時間短縮により救命される人命数の貨幣評価値（円／年））

$$= \sum P \times A_i \times B_i \times C \times D_i \times E$$

- P : 改善効果対象地域・地区の受益人口（万人）
- A_i : 疾患別の搬送患者発生率（人/万人）
- B_i : 疾患別の収容施設への搬送率（%）
- C : 地区と収容施設間の搬送時間短縮（分）
- D_i : 疾患別の搬送時間短縮1分当たりの救命率
- E : 人命価値（2.26億円／人）
- i : 疾患別（疾患：急性心筋梗塞、脳梗塞、大動脈乖離、多発外傷）

③便益の算定

当該事業において試算した救急医療改善効果は、現段階での知見に基づき、傷病発生から救急車が現場に到着し病院へ搬送し救命措置が施されるケースについて、搬送時間短縮に伴う生存者増加数に着目して試算しました。

a) 便益算定の設定、条件等

項目		設定等	備考
改善効果算定対象	地域・地区区分	当該区間の整備により最寄りの高次施設（急性期病院）への搬送時間が短縮する市町村	総務省統計局「H27 国勢調査」
	收容施設	苫小牧市内の急性期病院 ①急性心筋梗塞：血管外科を併設する循環器急性期医療機関、循環器科のある救急医療機関 ②脳梗塞：脳卒中急性期医療機関 ③大動脈乖離：上記①と同じ ④多発外傷：上記①及び②の双方に該当する医療機関	「北海道医療計画（平成30年度～令和5年度）＜中間見直し＞」（北海道）令和3年4月1日現在
收容施設への搬送率	急性心筋梗塞	3次メッシュ（1kmメッシュ）の各ゾーンから、最短時間でアクセス可能な急性期病院へ搬送	—
	脳梗塞		
	大動脈解離		
	多発外傷		
搬送患者発生率	急性心筋梗塞	2.62人/万人	「道路整備による救急医療便益」交通工学 Vol145 No5 2010
	脳梗塞	11.98人/万人	
	大動脈解離	1.95人/万人	
	多発外傷	0.56人/万人	
搬送時間		覚知～現場発（各市町村）までの時間	「道路整備による救急医療便益」交通工学 Vol145 No5 2010
		各市町村から最寄りの急性期病院までの所要時間	3次メッシュの各ゾーンから最寄りの急性期病院までの所要時間を交通量推計結果に基づく走行速度から算出し、ゾーンの人口加重により市町村の平均所要時間を算出
搬送時間短縮1分当たりの救命率	急性心筋梗塞	0.0160/分	「道路整備による救急医療便益」交通工学 Vol145 No5 2010
	脳梗塞	0.0048/分	
	大動脈解離	0.0112/分	
	多発外傷	0.0119/分	
人命の価値		2.26億円/人	資料「公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編）平成21年6月」

b) 便益の算定結果

I. 救急医療改善便益（急性心筋梗塞）

		救命する人命数	救急医療改善効果 (億円/年)
日高自動車道 (厚真～三石)	事業全体	0.1235	0.2790
	残事業	0.0000	0.0000

II. 救急医療改善便益（脳梗塞）

		救命する人命数	救急医療改善効果 (億円/年)
日高自動車道 (厚真～三石)	事業全体	13.1216	29.6548
	残事業	4.6593	10.5300

III. 救急医療改善便益（大動脈解離）

		救命する人命数	救急医療改善効果 (億円/年)
日高自動車道 (厚真～三石)	事業全体	0.6414	1.4495
	残事業	0.0449	0.1014

IV. 救急医療改善便益（多発外傷）

		救命する人命数	救急医療改善効果 (億円/年)
日高自動車道 (厚真～三石)	事業全体	0.0213	0.0480
	残事業	0.0000	0.0000

V. 便益算定表（現在価値）


	事業全体	残事業
基準年	令和4年度	
単年効果	31.43億円	10.63億円
基準年における現在価値※	421.75億円	142.65億円

※は、供用後50年間の効果額として試算した値（参考値）

試算の結果、厚真 IC～三石の整備により、日高地域の住民にとって苫小牧市内の急性期病院へのアクセスが、最大で約70分短縮し、事業全体を対象とした場合は年間14人の患者が救命され、約422億円の効果が発現し、残事業を対象とした場合は年間5人の患者が救命され、約143億円の効果が発現すると試算されました。

②便益算定のフローと算定式

余裕時間の短縮による便益は、以下の手順及び算定式より試算しました。

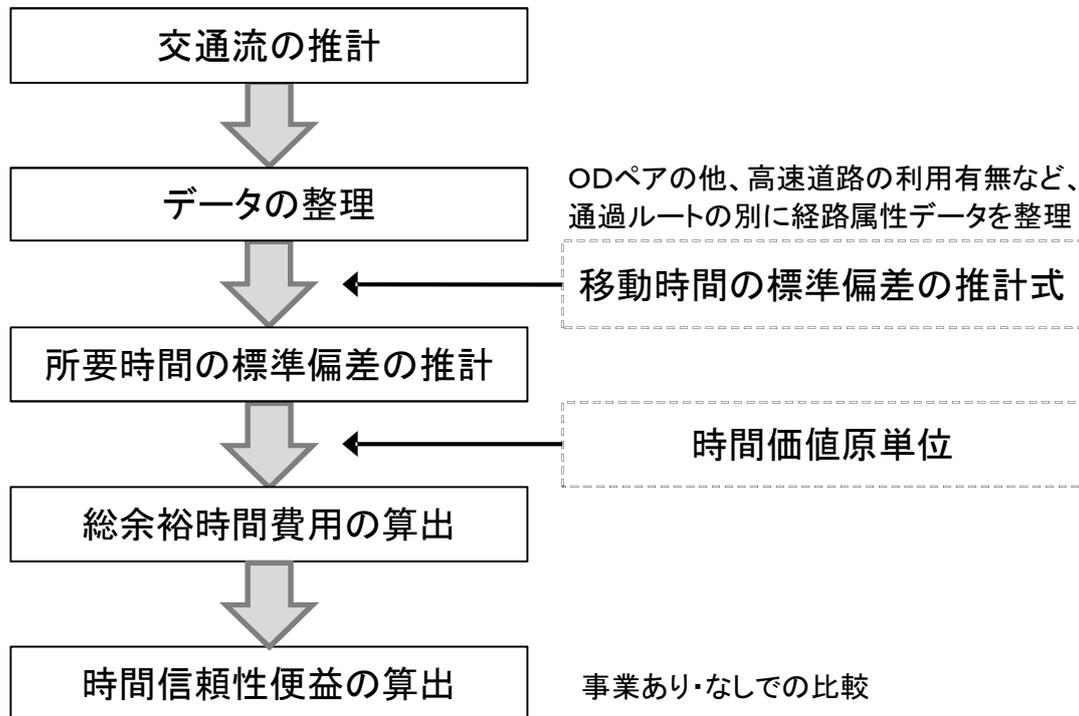

時間信頼性向上便益： $MT = MT_0 - MT_W$

総余裕時間費用： $MT_i = \sum_j \sum_m \sum_n (SD_{imn} \times Q_{imnj} \times \alpha_j)$

ここで、

- MT_i : 整備 i の場合の総余裕時間費用(円/年)
- SD_{imn} : 整備 i の場合の OD ペア m のルート n における移動時間の標準偏差(分)
- Q_{imnj} : 整備 i の場合の OD ペア m のルート n における車種 j の交通量(台/日)
- α_j : 車種 j の時間価値原単位(円/分・台)
- ※走行時間短縮便益の時間価値原単位と同じとする。
- i : 整備有の場合 W 、無の場合 O
- j : 車種
- m : OD ペア
- n : 通過ルート(OD ペア間に高速道、一般道の複数ルートがあればその別)

移動時間の標準偏差： $SD_{imn} =$

$$-8.129 + 6.545CI_{imn} + 0.014S_{imn} + 0.048d_1 + 0.043d_2 + 0.025d_3$$
 (※ $SD_{imn} < 0$ の場合、 $SD_{imn} = 0$)

ここで、

- SD_{imn} : 整備 i の場合の OD ペア m のルート n における移動時間の標準偏差(分)
- CI_{imn} : 混雑指数(OD 間平均旅行時間(T_{ave})÷OD 間自由流旅行時間(T_0))
- $T_{ave\ imn}$: 整備 i の場合の OD ペア m のルート n の平均旅行時間(分)
 ※走行時間短縮便益の算出に用いたリンク旅行速度よりリンク毎の平均所要時間を求め、OD 間の経路を構成する全リンクで合計して算出。
- $T_{0\ imn}$: 整備 i の場合の OD ペア m のルート n の自由流旅行時間(分)
- S_{imn} : 整備 i の場合の OD ペア m のルート n の信号交差点数(箇所)
- d : 整備 i の場合の OD ペア m のルート n の延長(種別・km)
 (d_1 : 高速道路、 d_2 : 一般道路 (2 車線) 、 d_3 : 一般道路 (多車線))
- i : 整備有の場合 W 、無の場合 O
- m : OD ペア
- n : 通過ルート(OD ペア間に高速道、一般道の複数ルートがあればその別)

③便益の算定

交通流の推計結果より、以下に示す OD ペア・通過ルート毎に経路属性データを整理して、時間信頼性向上便益を試算しました。

a) 便益算定の設定、条件等

I. 経路属性データ整理の対象とした OD ペア

	経路属性データ整理の対象とした OD ペア
算定対象 OD	・ 走行時間短縮便益の算出するエリアに関連する (エリア内々、エリア内外およびエリアを通過する OD)
起終点	・ 配分ゾーンベースの OD
経路	・ OD ペア・通過ルートの別に経路属性データ ※高速道路を利用可能な OD ペアの場合、高速道経由ルートと一般道経由ルートの複数の経路属性データ

II. 整理の対象とした経路データ

	整理の対象とした経路データ
OD交通量 (Q)	・車種（乗用車類、小型貨物車、普通貨物車）別の交通量
平均旅行時間 (T_{ave})	・走行時間短縮便益の算出根拠とする速度を用いて、算出したリンク毎の平均旅行時間 ・通過ルートを構成する全リンクの平均旅行時間を合計し、OD間平均旅行時間を算出
自由流旅行時間 (T_0)	・ETC2.0道路プローブデータ（R01～R03、5～11月の22時～5時）を用いてリンク毎に設定した自由流旅行速度（表1参照）より自由流旅行時間を算出し、通過ルートを構成する全リンクで合計
信号交差点数 (S)	・全国道路・街路交通情勢調査対象路線：平成27年度全国道路・街路交通情勢調査で調査された信号交差点密度に延長を乗じてリンクの信号交差点数を算出 ・上記以外の道路：平成27年度全国道路・街路交通情勢調査より、北海道地域の沿道状況別信号交差点密度（表2）を設定し、これに延長を乗じてリンクの信号交差点数を算出
経路延長 (d)	・通過ルートを構成するリンクの総延長を以下の別に算出 (d_1 ：高速道路、 d_2 ：一般道路（2車線）、 d_3 ：一般道路（多車線）)

表1. 自由流旅行速度 (km/h)

		DID	その他市街部	平地	山地
自動車専用道路	2車線	90.7			
	多車線	96.5			
一般国道	2車線	66.2	72.3	74.3	72.6
	多車線	69.1	70.7	72.1	72.2
それ以外	2車線	61.8	64.7	70.2	71.5
	多車線	63.4	65.4	68.8	66.1

表2. 全国道路・街路交通情勢調査対象路線以外の道路の信号交差点数設定のための沿道状況別信号交差点数 (km 当たり)

DID	その他市街部	平地	山地
3.3	1.1	0.3	0.1

b) 便益の算定結果

I. 時間信頼性向上便益 (R22)

		総余裕時間費用 (億円/年)		時間信頼性向上便益 (億円/年)
		①整備なし	②整備あり	
日高自動車道 (厚真～三石)	事業全体	5,441.90	5,406.61	35.29
	残事業	5,428.39	5,406.61	21.78

II. 便益算定表(現在価値)

	事業全体	残事業
基準年	令和 4 年度	
単年便益	35.29 億円	21.78 億円
基準年における現在価値※	432.52 億円	266.53 億円

※は、供用後 50 年間の便益額として試算した値 (参考値)

試算の結果、厚真 IC～三石の整備により、移動時間の標準偏差が縮小することによる余裕時間の短縮効果である時間信頼性向上便益は、事業全体を対象とした場合は約 433 億円と試算され、残事業を対象とした場合は約 267 億円と試算されました。

3) CO₂ 排出削減による効果

① 便益算定の考え方

混雑などにより、一定速度での通行ができず停止や加速の頻度が高まると、自動車の燃料消費は増加します。したがって、旅行速度が低い場合において CO₂ 排出量が大きくなります（図 1）。

新たな道路の整備は、交通動態の変化をもたらし、周辺の道路を含む面的な旅行速度の向上が期待されます。ここでは、旅行速度や交通量の変化による CO₂ 排出削減の効果を「CO₂ 排出削減便益」として試算することとしました。


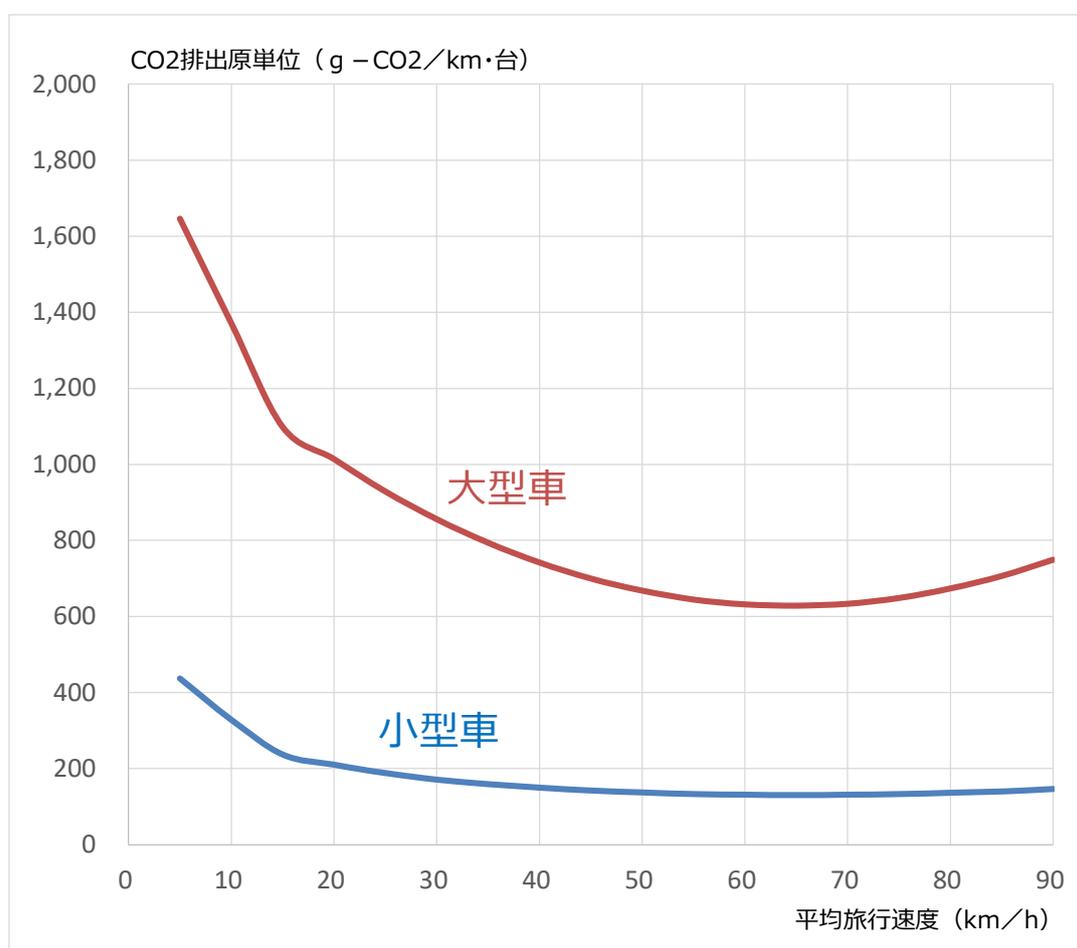


図 1. 自動車の旅行速度と CO₂ 排出原単位との関係

②便益算定のフローと算定式

CO₂ 排出削減便益は、以下の手順及び算定式より試算しました。

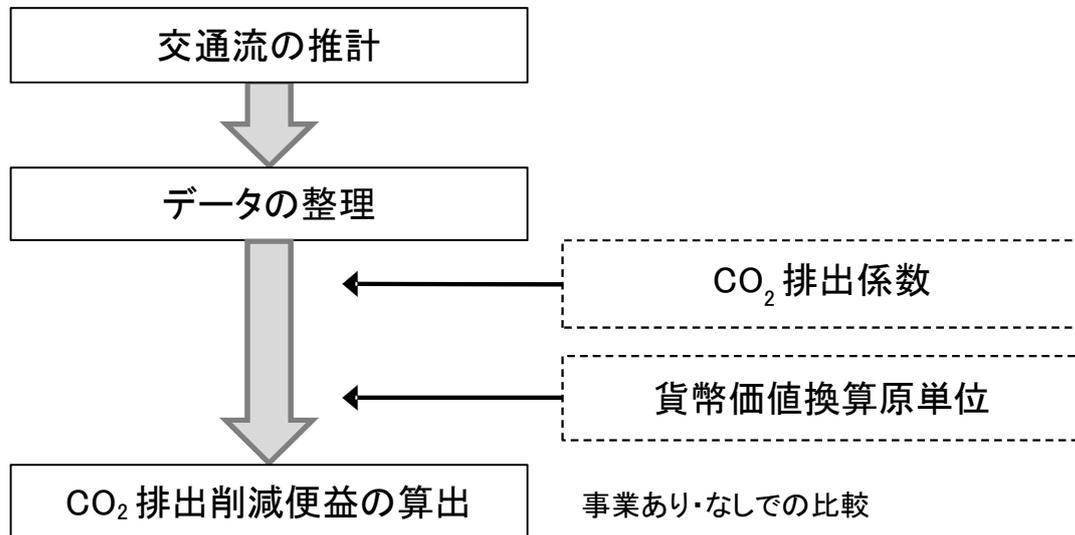

$$\text{CO}_2 \text{ 排出削減便益} : BG = BG_O - BG_W$$

$$\text{CO}_2 \text{ 排出費用} : BG_i = \sum_j \sum_l (Q_{ijl} \times L_l \times \gamma_{ijl}) \times \frac{12}{44} \times \frac{1}{10^6} \times \delta \times 365$$

ここで、

- BG : 年間総 CO₂ 排出削減便益 (円/年)
- BG_i : 整備 i の場合の CO₂ 排出費用 (円/年)
- Q_{ijl} : 整備 i の場合のリンク l における車種 j の交通量 (台/日)
- L_l : リンク l の延長 (km)
- γ_{ijl} : 整備 i の場合のリンク l における車種 j の CO₂ 排出係数 (g-CO₂/km・台)
- δ : CO₂ 排出削減の貨幣評価原単位 (円/分・台)
- i : 整備有の場合 W 、無の場合 O
- j : 車種
- l : リンク

注) 排出係数による CO₂ 排出量の単位は g-CO₂ である。一方、貨幣評価換算原単位は t-C 当たりの値として示されている。炭素の分子量は 12、酸素は 16 のため、CO₂ の分子量は 12+16×2=44 となり、1gCO₂=(12/44)*(1/10⁶) tC と換算される。

③便益の算定

交通流の推計結果を基に、便益評価の対象とするリンク毎に、車種別（小型車（乗用車、小型貨物車）・大型車（バス、普通貨物車））の交通量及び走行時間短縮便益の算出に用いる平均旅行速度を整理して、CO₂ 排出削減便益を試算しました。

a) 便益算定の設定、条件等

I. CO₂ 排出係数 (γ_{ij})

各リンクの平均旅行速度に応じて、国土技術政策総合研究所により定められた排出係数（表3）を用いて CO₂ 排出量を算出した。平均旅行速度が表に示された値の間をとる場合は、適宜補間して排出係数を求めた。

表 3. CO₂ 排出係数

平均旅行速度 (km/h)	CO ₂ 排出係数 (g/km・台)	
	小型車類	大型車類
5	437	1,646
10	329	1,372
15	237	1,099
20	210	1,014
25	188	929
30	171	856
35	159	794
40	150	742
45	142	700
50	137	668
55	133	645
60	131	632
65	130	629
70	131	634
75	133	649
80	136	674
85	140	707
90	146	750

出典)「道路環境影響評価等に用いる自動車排出係数の算定根拠(平成22年度版)」

国土技術政策総合研究所資料 No. 671 (2012)

II. CO₂ 排出係数の貨幣評価原単位 (δ)

CO₂ 排出の貨幣価値換算には、「公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針(共通編)」(平成21年6月国土交通省)による原単位(10,600円/t-C)を用いた。

b) 便益の算定結果

I. CO₂ 排出削減便益 (R22)

		CO ₂ 排出費用 (億円/年)		CO ₂ 排出削減便益 (億円/年)
		①整備なし	②整備あり	
日高自動車道 (厚真～三石)	事業全体	211.59	210.95	0.63
	残事業	211.30	210.95	0.35

II. 便益算定表(現在価値)

	事業全体	残事業
基準年	令和 4 年度	
単年便益	0.63 億円	0.35 億円
基準年における現在価値※	8.01 億円	4.38 億円

※は、供用後 50 年間の便益額として試算した値 (参考値)

試算の結果、厚真 IC～三石の整備により、CO₂ 排出量が削減することによる便益は、事業全体を対象とした場合は約 8.0 億円と試算され、残事業を対象とした場合は約 4.4 億円と試算されました。

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他別
日高自動車道 (一般国道235号)	厚賀静内道路	L=16.2km	高規格B	B P

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
10,000~11,400	2	北海道開発局

① 費用

	事業費	維持管理費	更新費	合計
基準年	令和4年度			
単純合計	800億円	105億円		905億円
うち残事業分	270億円	105億円		376億円
基準年における 現在価値(C)	862億円	34億円		897億円
うち残事業分	239億円	34億円		274億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和4年度			
供用年	令和12年度			
単年便益 (初年便益)	57億円	6.8億円	1.4億円	65億円
基準年における 現在価値(B)	833億円	99億円	21億円	953億円
うち残事業分	833億円	99億円	21億円	953億円

③ 結果

費用便益比(事業全体)	1.1
経済的純現在価値(事業全体)	56億円
経済的内部収益率(事業全体)	4.3%
費用便益比(残事業)	3.5
経済的純現在価値(残事業)	679億円
経済的内部収益率(残事業)	13.4%

注)費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比(B/C)
交通量	10,000~11,400	±10%	0.93~1.2
事業費	800億円	±10%	1.0~1.1
事業期間	35年	±20%	1.0~1.1

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比(B/C)
交通量	10,000~11,400	±10%	3.0~4.0
事業費	270億円	±10%	3.2~3.8
事業期間	7年	±20%	3.5~3.7

交通状況の変化(事業全体)

事業名:厚賀静内道路


(推計時点 R22年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] 16.2km	交通量	[台/日]	0	10,800	
	走行時間	[分]	0.0	12.6	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	26.35	
②主な 周辺道路	現道: 国道235号 17.3km	交通量	[台/日]	11,300	1,500
		走行時間	[分]	35.4	23.5
		走行時間費用	[億円/年]	76.96	6.37
	一)新冠 平取線 15.1km	交通量	[台/日]	100	0
		走行時間	[分]	27.5	27.4
		走行時間費用	[億円/年]	0.38	0.00
	主)平取 静内線 35.0km	交通量	[台/日]	600	400
		走行時間	[分]	45.1	44.8
		走行時間費用	[億円/年]	4.79	3.32
③その他道路合計 26,312.3km	走行時間費用	[億円/年]	20,987.09	20,979.60	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計:26,395.9km	走行時間短縮便益	[億円/年]	21,069.22	21,015.64	53.58

事業名:厚賀静内道路

【 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)】

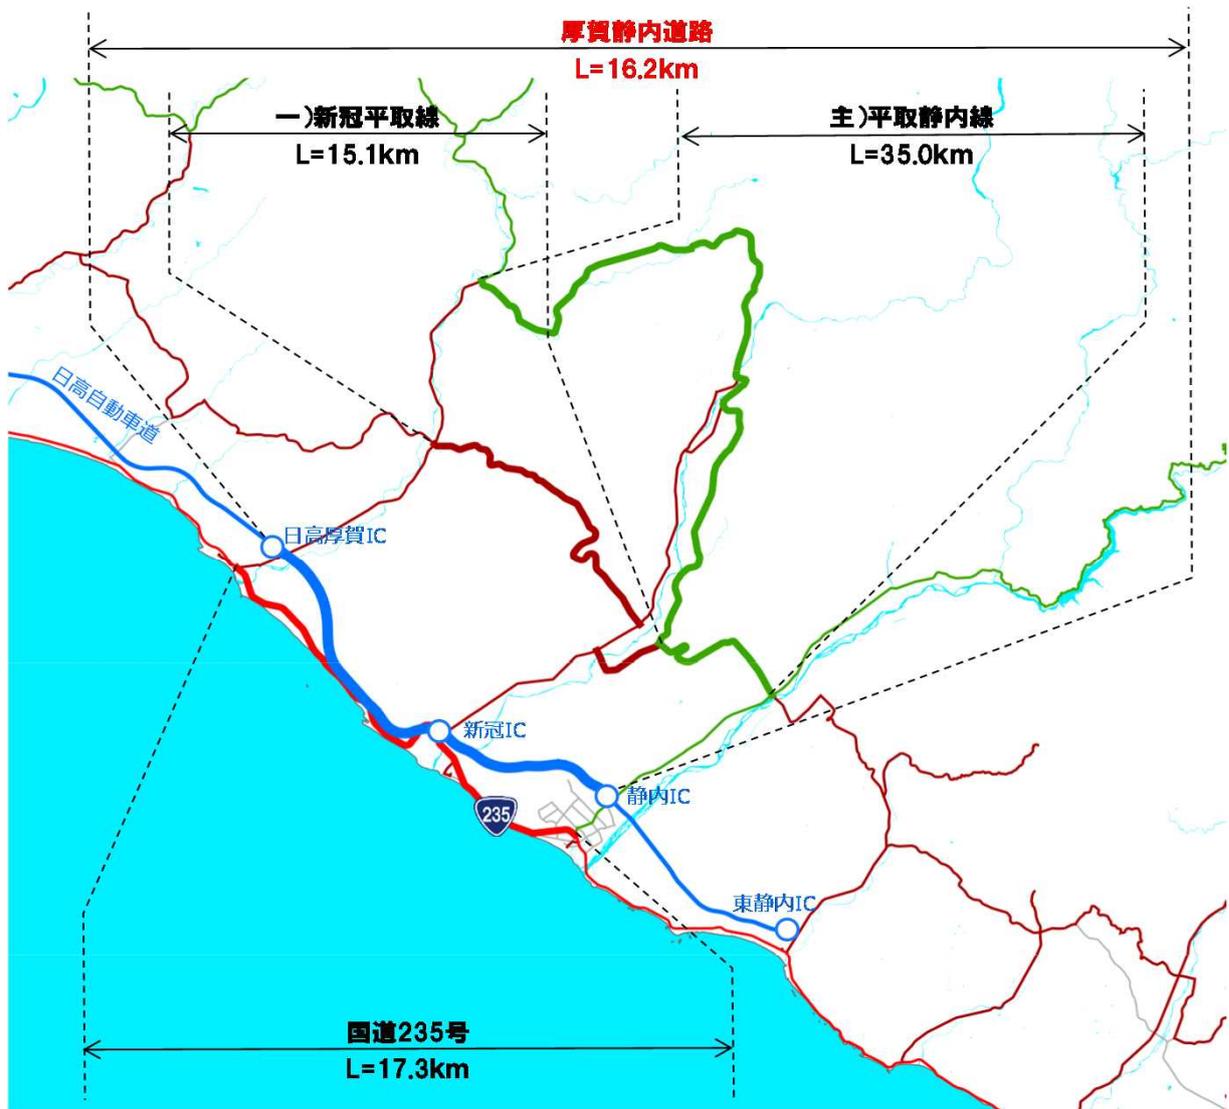

交通状況の変化(残事業)

事業名:厚賀静内道路


(推計時点 R22年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] 16.2km	交通量	[台/日]	0	10,800	
	走行時間	[分]	0.0	12.6	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	26.35	
②主な 周辺道路	現道: 国道235号 17.3km	交通量	[台/日]	11,300	1,500
		走行時間	[分]	35.4	23.5
		走行時間費用	[億円/年]	76.96	6.37
	一)新冠 平取線 15.1km	交通量	[台/日]	100	0
		走行時間	[分]	27.5	27.4
		走行時間費用	[億円/年]	0.38	0.00
	主)平取 静内線 35.0km	交通量	[台/日]	600	400
		走行時間	[分]	45.1	44.8
		走行時間費用	[億円/年]	4.79	3.32
③その他道路合計 26,312.3km	走行時間費用	[億円/年]	20,987.09	20,979.60	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計:26,395.9km	走行時間短縮便益	[億円/年]	21,069.22	21,015.64	53.58

事業名:厚賀静内道路

【 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)】

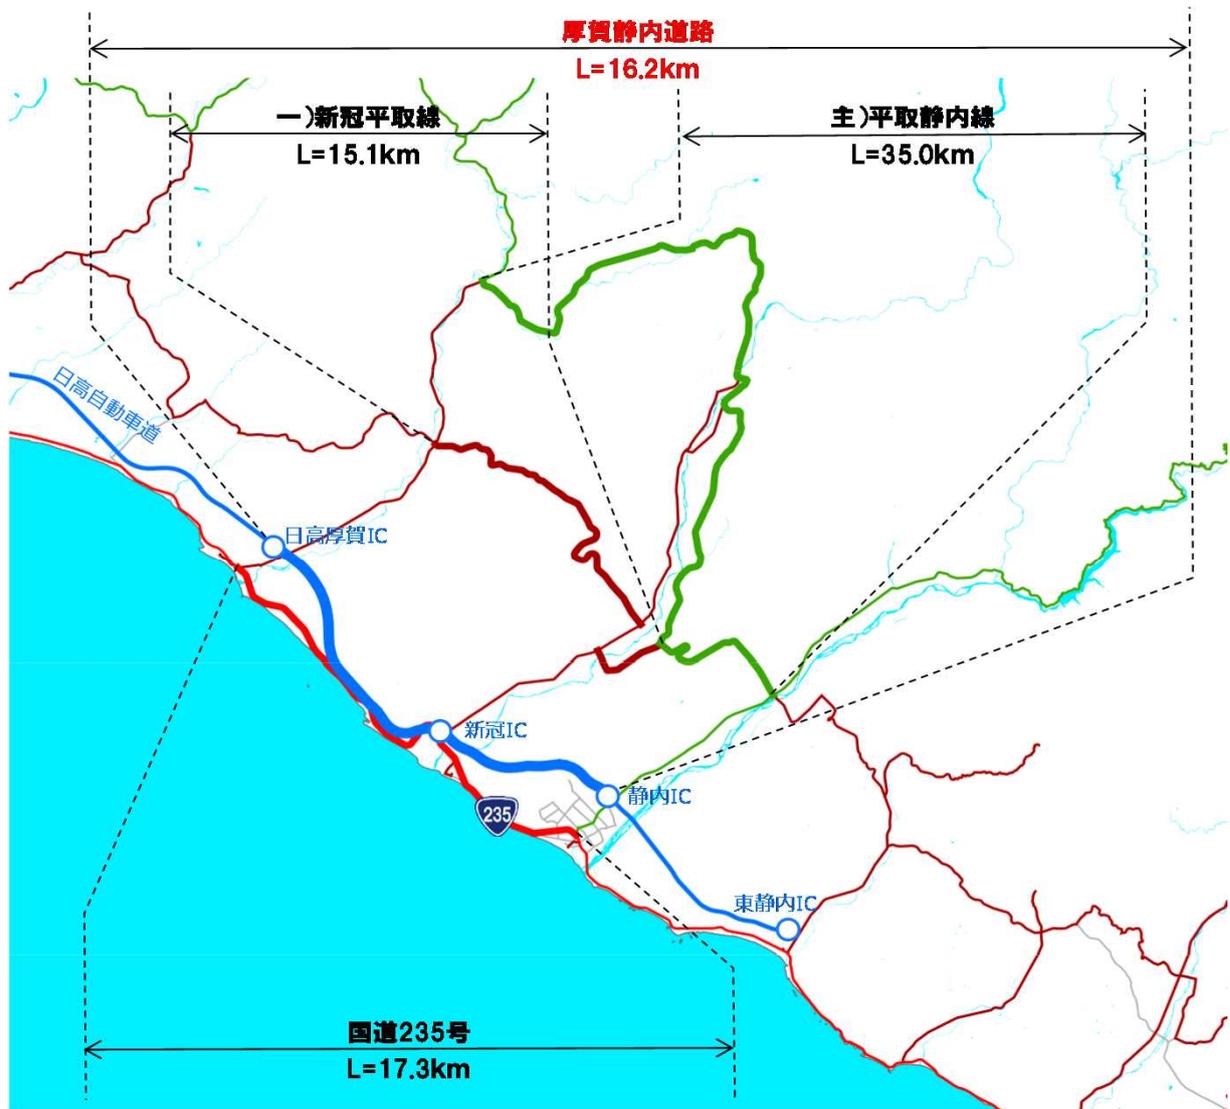

費用便益分析の条件

事業名: 厚賀静内道路

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和4年2月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	令和4年	
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (R22)	
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載	
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H27センサス)	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
	その他()	<input type="checkbox"/>	
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
	有	<input type="checkbox"/>	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載	
交通流推計	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の 採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
	その他()		
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)			
速度設定の 考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載	交通容量未満・以上の路線が混在した配分結果となっているため、便益算出においては速度差の生ずる加重平均速度を用いた。	
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載		
	その他()	<input type="checkbox"/>	

事業名:厚賀静内道路

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数	()%
	休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載			
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数	()日
			採用した通行止め日数の考え方を記載	
とり止め交通を考慮する		<input type="checkbox"/>		
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載				
冬期交通の影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>		
	考慮する	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する場合のみ	採用した冬期日数	(94)日	
		採用した冬期日数の考え方を記載 当該地域の直近3か年(令和元年~令和3年)における最低気温0℃以下かつ積雪1cm以上を満たす日数とし、94日と設定		
		冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載 Vmax、Vminについて低減		
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ()	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
その他				

事業名:厚賀静内道路

(4)

		項目	チェック欄	
費用の算定	事業費	詳細事業計画による値を採用	<input type="checkbox"/>	
		標準投資パターンを採用	<input checked="" type="checkbox"/>	
		その他()	<input type="checkbox"/>	
	維持管理費	維持管理費の設定根拠を記載 当該区間を管轄する事務所における直轄国道の維持管理費実績に基づき算出		
	更新費	更新費の設定根拠を記載 評価対象期間末までに設計供用期間を超過する橋梁がないため計上しない		
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である	<input checked="" type="checkbox"/>	
	当該道路整備が行われない場合の費用	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	事業費を考慮	<input type="checkbox"/>
			維持管理費を考慮	<input type="checkbox"/>
		当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載(対策内容、費用等)		
その他				
4. その他				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				

費用の現在価値算定表(事業全体)

				維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)					
				単価(億円)		延長(km)		単純単価(億円)	
				0.143		16.2		2.32	
年次	年度	割引率 4.0%	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
				単純単価	現在単価	単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
-35年目	H 7	2.8834	113.70	0.97	2.52				
-34年目	H 8	2.7725	113.20	0.98	2.45				
-33年目	H 9	2.6658	114.20	0.96	2.28				
-32年目	H 10	2.5633	113.60	0.96	2.21				
-31年目	H 11	2.4647	112.00	0.96	2.15				
-30年目	H 12	2.3699	110.70	0.96	2.09				
-29年目	H 13	2.2788	109.40	0.96	2.04				
-28年目	H 14	2.1911	107.60	0.96	1.99				
-27年目	H 15	2.1068	106.10	0.96	1.94				
-26年目	H 16	2.0258	105.00	0.96	1.89				
-25年目	H 17	1.9479	103.70	0.96	1.84				
-24年目	H 18	1.8730	103.00	4.80	8.90				
-23年目	H 19	1.8009	102.10	4.81	8.64				
-22年目	H 20	1.7317	101.60	1.39	2.41				
-21年目	H 21	1.6651	100.30	3.34	5.65				
-20年目	H 22	1.6010	98.60	0.81	1.34				
-19年目	H 23	1.5395	97.20	3.60	5.80				
-18年目	H 24	1.4802	96.40	3.92	6.13				
-17年目	H 25	1.4233	96.40	11.47	17.25				
-16年目	H 26	1.3686	98.70	17.55	24.79				
-15年目	H 27	1.3159	100.20	17.05	22.81				
-14年目	H 28	1.2653	100.30	17.08	21.95				
-13年目	H 29	1.2167	100.50	32.16	39.67				
-12年目	H 30	1.1699	100.40	63.89	75.87				
-11年目	R 1	1.1249	101.20	85.83	97.22				
-10年目	R 2	1.0816	101.90	88.23	95.43				
- 9年目	R 3	1.0400	101.90	93.16	96.89				
- 8年目	R 4	1.0000	101.90	70.01	70.01				
- 7年目	R 5	0.9615	101.90	57.88	55.65				
- 6年目	R 6	0.9246	101.90	60.01	55.48				
- 5年目	R 7	0.8890	101.90	51.45	45.74				
- 4年目	R 8	0.8548	101.90	40.45	34.58				
- 3年目	R 9	0.8219	101.90	27.73	22.79				
- 2年目	R 10	0.7903	101.90	18.18	14.37				
- 1年目	R 11	0.7599	101.90	14.53	11.04				
供用開始年次	R 12	0.7307	101.90			2.11	1.54		
1年目	R 13	0.7026	101.90			2.11	1.48		
2年目	R 14	0.6756	101.90			2.11	1.42		
3年目	R 15	0.6496	101.90			2.11	1.37		
4年目	R 16	0.6246	101.90			2.11	1.32		
5年目	R 17	0.6006	101.90			2.11	1.27		
6年目	R 18	0.5775	101.90			2.11	1.22		
7年目	R 19	0.5553	101.90			2.11	1.17		
8年目	R 20	0.5339	101.90			2.11	1.13		
9年目	R 21	0.5134	101.90			2.11	1.08		
10年目	R 22	0.4936	101.90			2.11	1.04		
11年目	R 23	0.4746	101.90			2.11	1.00		
12年目	R 24	0.4564	101.90			2.11	0.96		
13年目	R 25	0.4388	101.90			2.11	0.93		
14年目	R 26	0.4220	101.90			2.11	0.89		
15年目	R 27	0.4057	101.90			2.11	0.86		
16年目	R 28	0.3901	101.90			2.11	0.82		
17年目	R 29	0.3751	101.90			2.11	0.79		
18年目	R 30	0.3607	101.90			2.11	0.76		
19年目	R 31	0.3468	101.90			2.11	0.73		
20年目	R 32	0.3335	101.90			2.11	0.70		
21年目	R 33	0.3207	101.90			2.11	0.68		
22年目	R 34	0.3083	101.90			2.11	0.65		
23年目	R 35	0.2965	101.90			2.11	0.63		
24年目	R 36	0.2851	101.90			2.11	0.60		
25年目	R 37	0.2741	101.90			2.11	0.58		
26年目	R 38	0.2636	101.90			2.11	0.56		
27年目	R 39	0.2534	101.90			2.11	0.53		
28年目	R 40	0.2437	101.90			2.11	0.51		
29年目	R 41	0.2343	101.90			2.11	0.49		
30年目	R 42	0.2253	101.90			2.11	0.48		
31年目	R 43	0.2166	101.90			2.11	0.46		
32年目	R 44	0.2083	101.90			2.11	0.44		
33年目	R 45	0.2003	101.90			2.11	0.42		
34年目	R 46	0.1926	101.90			2.11	0.41		
35年目	R 47	0.1852	101.90			2.11	0.39		
36年目	R 48	0.1780	101.90			2.11	0.38		
37年目	R 49	0.1712	101.90			2.11	0.36		
38年目	R 50	0.1646	101.90			2.11	0.35		
39年目	R 51	0.1583	101.90			2.11	0.33		
40年目	R 52	0.1522	101.90			2.11	0.32		
41年目	R 53	0.1463	101.90			2.11	0.31		
42年目	R 54	0.1407	101.90			2.11	0.30		
43年目	R 55	0.1353	101.90			2.11	0.29		
44年目	R 56	0.1301	101.90			2.11	0.27		
45年目	R 57	0.1251	101.90			2.11	0.26		
46年目	R 58	0.1203	101.90			2.11	0.25		
47年目	R 59	0.1157	101.90			2.11	0.24		
48年目	R 60	0.1112	101.90			2.11	0.23		
49年目	R 61	0.1069	101.90	-15.00	-1.61	2.11	0.23		
合計				784.89	862.19	105.45	34.43	0.00	0.00
単純事業費計				799.89		105.45		0.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表(残事業)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 日高自動車道(一般国道235号)厚賀静内道路

年次	年度	割引率 4.0%	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)		
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	
								0.143	16.2	2.32
- 7年目	R 5	0.9615	101.90	57.88	55.65					
- 6年目	R 6	0.9246	101.90	60.01	55.48					
- 5年目	R 7	0.8890	101.90	51.45	45.74					
- 4年目	R 8	0.8548	101.90	40.45	34.58					
- 3年目	R 9	0.8219	101.90	27.73	22.79					
- 2年目	R 10	0.7903	101.90	18.18	14.37					
- 1年目	R 11	0.7599	101.90	14.53	11.04					
供用開始年次	R 12	0.7307	101.90			2.11	1.54			
1年目	R 13	0.7026	101.90			2.11	1.48			
2年目	R 14	0.6756	101.90			2.11	1.42			
3年目	R 15	0.6496	101.90			2.11	1.37			
4年目	R 16	0.6246	101.90			2.11	1.32			
5年目	R 17	0.6006	101.90			2.11	1.27			
6年目	R 18	0.5775	101.90			2.11	1.22			
7年目	R 19	0.5553	101.90			2.11	1.17			
8年目	R 20	0.5339	101.90			2.11	1.13			
9年目	R 21	0.5134	101.90			2.11	1.08			
10年目	R 22	0.4936	101.90			2.11	1.04			
11年目	R 23	0.4746	101.90			2.11	1.00			
12年目	R 24	0.4564	101.90			2.11	0.96			
13年目	R 25	0.4388	101.90			2.11	0.93			
14年目	R 26	0.4220	101.90			2.11	0.89			
15年目	R 27	0.4057	101.90			2.11	0.86			
16年目	R 28	0.3901	101.90			2.11	0.82			
17年目	R 29	0.3751	101.90			2.11	0.79			
18年目	R 30	0.3607	101.90			2.11	0.76			
19年目	R 31	0.3468	101.90			2.11	0.73			
20年目	R 32	0.3335	101.90			2.11	0.70			
21年目	R 33	0.3207	101.90			2.11	0.68			
22年目	R 34	0.3083	101.90			2.11	0.65			
23年目	R 35	0.2965	101.90			2.11	0.63			
24年目	R 36	0.2851	101.90			2.11	0.60			
25年目	R 37	0.2741	101.90			2.11	0.58			
26年目	R 38	0.2636	101.90			2.11	0.56			
27年目	R 39	0.2534	101.90			2.11	0.53			
28年目	R 40	0.2437	101.90			2.11	0.51			
29年目	R 41	0.2343	101.90			2.11	0.49			
30年目	R 42	0.2253	101.90			2.11	0.48			
31年目	R 43	0.2166	101.90			2.11	0.46			
32年目	R 44	0.2083	101.90			2.11	0.44			
33年目	R 45	0.2003	101.90			2.11	0.42			
34年目	R 46	0.1926	101.90			2.11	0.41			
35年目	R 47	0.1852	101.90			2.11	0.39			
36年目	R 48	0.1780	101.90			2.11	0.38			
37年目	R 49	0.1712	101.90			2.11	0.36			
38年目	R 50	0.1646	101.90			2.11	0.35			
39年目	R 51	0.1583	101.90			2.11	0.33			
40年目	R 52	0.1522	101.90			2.11	0.32			
41年目	R 53	0.1463	101.90			2.11	0.31			
42年目	R 54	0.1407	101.90			2.11	0.30			
43年目	R 55	0.1353	101.90			2.11	0.29			
44年目	R 56	0.1301	101.90			2.11	0.27			
45年目	R 57	0.1251	101.90			2.11	0.26			
46年目	R 58	0.1203	101.90			2.11	0.25			
47年目	R 59	0.1157	101.90			2.11	0.24			
48年目	R 60	0.1112	101.90			2.11	0.23			
49年目	R 61	0.1069	101.90	-1.75	-0.19	2.11	0.23			
合計				268.48	239.47	105.45	34.43	0.00	0.00	
単純事業費計				270.23		105.45		0.00		

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表(事業全体)

箇所名:日高自動車道(一般国道235号)厚賀静内道路

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (北海道ブロック)				割引率 4.0% (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4.0%
供用開始年次	R 12	0.99401	0.98507	0.99820	0.99354	0.7307	101.90	38.45	6.22	12.36	57.04	41.68	4.96	0.59	1.22	6.77	4.95	1.44	1.05	65.24	47.67
1年目	R 13	0.99397	0.98484	0.99820	0.99349	0.7026	101.90	38.22	6.13	12.34	56.69	39.83	4.93	0.58	1.22	6.73	4.73	1.43	1.00	64.85	45.56
2年目	R 14	0.99393	0.98461	0.99820	0.99345	0.6756	101.90	37.99	6.04	12.32	56.34	38.07	4.90	0.57	1.21	6.69	4.52	1.42	0.96	64.45	43.54
3年目	R 15	0.99390	0.98437	0.99819	0.99341	0.6496	101.90	37.76	5.94	12.30	56.00	36.38	4.88	0.56	1.21	6.65	4.32	1.41	0.92	64.06	41.61
4年目	R 16	0.99386	0.98412	0.99819	0.99337	0.6246	101.90	37.53	5.85	12.27	55.65	34.76	4.85	0.55	1.21	6.61	4.13	1.40	0.88	63.66	39.76
5年目	R 17	0.99382	0.98386	0.99819	0.99332	0.6006	101.90	37.30	5.76	12.25	55.31	33.22	4.82	0.54	1.21	6.57	3.94	1.39	0.84	63.27	38.00
6年目	R 18	0.99378	0.98360	0.99818	0.99328	0.5775	101.90	37.07	5.66	12.23	54.96	31.74	4.79	0.54	1.20	6.53	3.77	1.38	0.80	62.87	36.31
7年目	R 19	0.99374	0.98332	0.99818	0.99323	0.5553	101.90	36.84	5.57	12.21	54.62	30.33	4.76	0.53	1.20	6.49	3.60	1.37	0.76	62.47	34.69
8年目	R 20	0.99370	0.98304	0.99818	0.99318	0.5339	101.90	36.61	5.48	12.19	54.27	28.97	4.73	0.52	1.20	6.44	3.44	1.36	0.73	62.08	33.14
9年目	R 21	0.99366	0.98275	0.99817	0.99314	0.5134	101.90	36.38	5.39	12.16	53.92	27.68	4.70	0.51	1.20	6.40	3.29	1.36	0.70	61.68	31.67
10年目	R 22	0.99132	0.99191	0.99934	0.99287	0.4936	101.90	36.15	5.29	12.14	53.58	26.45	4.67	0.50	1.20	6.36	3.14	1.35	0.66	61.29	30.25
11年目	R 23	0.99124	0.99184	0.99934	0.99282	0.4746	101.90	35.83	5.25	12.13	53.21	25.26	4.63	0.50	1.20	6.32	3.00	1.34	0.63	60.87	28.89
12年目	R 24	0.99116	0.99177	0.99934	0.99277	0.4564	101.90	35.52	5.21	12.13	52.85	24.12	4.59	0.49	1.19	6.27	2.86	1.33	0.61	60.45	27.59
13年目	R 25	0.99108	0.99171	0.99934	0.99272	0.4388	101.90	35.20	5.16	12.12	52.48	23.03	4.55	0.49	1.19	6.23	2.73	1.32	0.58	60.03	26.34
14年目	R 26	0.99100	0.99164	0.99934	0.99266	0.4220	101.90	34.89	5.12	12.11	52.12	21.99	4.50	0.48	1.19	6.18	2.61	1.31	0.55	59.61	25.15
15年目	R 27	0.99092	0.99157	0.99934	0.99261	0.4057	101.90	34.58	5.08	12.10	51.76	21.00	4.46	0.48	1.19	6.14	2.49	1.30	0.53	59.19	24.01
16年目	R 28	0.99084	0.99149	0.99934	0.99256	0.3901	101.90	34.26	5.04	12.09	51.39	20.05	4.42	0.48	1.19	6.09	2.38	1.29	0.50	58.77	22.93
17年目	R 29	0.99075	0.99142	0.99933	0.99250	0.3751	101.90	33.95	4.99	12.09	51.03	19.14	4.38	0.47	1.19	6.05	2.27	1.28	0.48	58.35	21.89
18年目	R 30	0.99067	0.99135	0.99933	0.99244	0.3607	101.90	33.63	4.95	12.08	50.66	18.27	4.34	0.47	1.19	6.00	2.16	1.27	0.46	57.93	20.90
19年目	R 31	0.99058	0.99127	0.99933	0.99239	0.3468	101.90	33.32	4.91	12.07	50.30	17.44	4.30	0.46	1.19	5.95	2.07	1.26	0.44	57.51	19.94
20年目	R 32	0.99049	0.99119	0.99933	0.99233	0.3335	101.90	33.01	4.86	12.06	49.93	16.65	4.26	0.46	1.19	5.91	1.97	1.25	0.42	57.09	19.04
21年目	R 33	0.99040	0.99112	0.99933	0.99227	0.3207	101.90	32.69	4.82	12.05	49.57	15.89	4.22	0.46	1.19	5.86	1.88	1.24	0.40	56.67	18.17
22年目	R 34	0.99031	0.99104	0.99933	0.99221	0.3083	101.90	32.38	4.78	12.04	49.20	15.17	4.18	0.45	1.19	5.82	1.79	1.23	0.38	56.25	17.34
23年目	R 35	0.99021	0.99096	0.99933	0.99215	0.2965	101.90	32.06	4.74	12.04	48.84	14.48	4.14	0.45	1.19	5.77	1.71	1.22	0.36	55.83	16.55
24年目	R 36	0.99011	0.99087	0.99933	0.99208	0.2851	101.90	31.75	4.69	12.03	48.47	13.82	4.10	0.44	1.18	5.73	1.63	1.21	0.35	55.41	15.80
25年目	R 37	0.99002	0.99079	0.99933	0.99202	0.2741	101.90	31.44	4.65	12.02	48.11	13.19	4.06	0.44	1.18	5.68	1.56	1.20	0.33	54.99	15.07
26年目	R 38	0.98991	0.99070	0.99933	0.99196	0.2636	101.90	31.12	4.61	12.01	47.74	12.59	4.02	0.44	1.18	5.64	1.49	1.19	0.31	54.57	14.39
27年目	R 39	0.98981	0.99062	0.99933	0.99189	0.2534	101.90	30.81	4.56	12.00	47.38	12.01	3.98	0.43	1.18	5.59	1.42	1.18	0.30	54.15	13.72
28年目	R 40	0.98971	0.99053	0.99933	0.99182	0.2437	101.90	30.50	4.52	12.00	47.01	11.46	3.94	0.43	1.18	5.55	1.35	1.17	0.29	53.73	13.09
29年目	R 41	0.98960	0.99044	0.99933	0.99176	0.2343	101.90	30.18	4.48	11.99	46.65	10.93	3.90	0.42	1.18	5.50	1.29	1.16	0.27	53.31	12.49
30年目	R 42	0.98949	0.99034	0.99933	0.99169	0.2253	101.90	29.87	4.44	11.98	46.28	10.43	3.86	0.42	1.18	5.46	1.23	1.15	0.26	52.89	11.92
31年目	R 43	0.98938	0.99025	0.99933	0.99162	0.2166	101.90	29.55	4.39	11.97	45.92	9.95	3.82	0.42	1.18	5.41	1.17	1.14	0.25	52.47	11.37
32年目	R 44	0.98926	0.99015	0.99933	0.99155	0.2083	101.90	29.24	4.35	11.96	45.55	9.49	3.78	0.41	1.18	5.36	1.12	1.13	0.24	52.05	10.84
33年目	R 45	0.98915	0.99006	0.99933	0.99148	0.2003	101.90	28.93	4.31	11.96	45.19	9.05	3.73	0.41	1.18	5.32	1.07	1.13	0.23	51.63	10.34
34年目	R 46	0.98903	0.98996	0.99933	0.99140	0.1926	101.90	28.61	4.26	11.95	44.82	8.63	3.69	0.40	1.18	5.27	1.02	1.12	0.21	51.21	9.86
35年目	R 47	0.98891	0.98985	0.99933	0.99133	0.1852	101.90	28.30	4.22	11.94	44.46	8.23	3.65	0.40	1.18	5.23	0.97	1.11	0.20	50.79	9.41
36年目	R 48	0.98878	0.98975	0.99933	0.99125	0.1780	101.90	27.98	4.18	11.93	44.10	7.85	3.61	0.39	1.18	5.18	0.92	1.10	0.20	50.38	8.97
37年目	R 49	0.98866	0.98964	0.99933	0.99118	0.1712	101.90	27.67	4.14	11.92	43.73	7.49	3.57	0.39	1.17	5.14	0.88	1.09	0.19	49.96	8.55
38年目	R 50	0.98853	0.98954	0.99933	0.99110	0.1646	101.90	27.36	4.09	11.92	43.37	7.14	3.53	0.39	1.17	5.09	0.84	1.08	0.18	49.54	8.15
39年目	R 51	0.98839	0.98943	0.99933	0.99102	0.1583	101.90	27.04	4.05	11.91	43.00	6.81	3.49	0.38	1.17	5.05	0.80	1.07	0.17	49.12	7.78
40年目	R 52	0.98826	0.98931	0.99932	0.99094	0.1522	101.90	26.73	4.01	11.90	42.64	6.49	3.45	0.38	1.17	5.00	0.76	1.06	0.16	48.70	7.41
41年目	R 53	0.98812	0.98920	0.99932	0.99085	0.1463	101.90	26.41	3.96	11.89	42.27	6.18	3.41	0.37	1.17	4.96	0.73	1.05	0.15	48.28	7.06
42年目	R 54	0.98797	0.98908	0.99932	0.99077	0.1407	101.90	26.10	3.92	11.88	41.91	5.90	3.37	0.37	1.17	4.91	0.69	1.04	0.15	47.86	6.73
43年目	R 55	0.98783	0.98896	0.99932	0.99068	0.1353	101.90	25.79	3.88	11.88	41.54	5.62	3.33	0.37	1.17	4.87	0.66	1.03	0.14	47.44	6.42
44年目	R 56	0.98768	0.98883	0.99932	0.99059	0.1301	101.90	25.47	3.84	11.87	41.18	5.36	3.29	0.36	1.17	4.82	0.63	1.02	0.13	47.02	6.12
45年目	R 57	0.98752	0.98871	0.99932	0.99051	0.1251	101.90	25.16	3.79	11.86	40.81	5.11	3.25	0.36	1.17	4.78	0.60	1.01	0.13	46.60	5.83
46年目	R 58	0.98737	0.98858	0.99932	0.99041	0.1203	101.90	24.85	3.75	11.85	40.45	4.87	3.21	0.35	1.17	4.73	0.57	1.00	0.12	46.18	5.56
47年目	R 59	0.98720	0.98845	0.99932	0.99032	0.1157	101.90	24.53	3.71	11.84	40.08	4.64	3.17	0.35	1.17	4.68	0.54	0.99	0.11	45.76	5.29
48年目	R 60	0.98704	0.98831	0.99932	0.99023	0.1112	101.90	24.22	3.66	11.84	39.72	4.42	3.13	0.35	1.17	4.64	0.52	0.98	0.11	45.34	5.04
49年目	R 61	0.98687	0.98817	0.99932	0.99013	0.1069	101.90	23.90	3.62	11.83	39.35	4.21	3.09	0.34	1.17	4.59	0.49	0.97	0.10	44.92	4.80
合計								1,575.10	236.33	602.02	2,413.45	833.43	203.36	22.34	59.30	285.00	98.66	60.32	20.89	2,758.77	952.98

便益の現在価値算定表(残事業)

箇所名:日高自動車道(一般国道235号)厚賀静内道路

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (北海道ブロック)				割戻率 4.0% (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割戻率4.0%
供用開始年次	R 12	0.99401	0.98507	0.99820	0.99354	0.7307	101.90	38.45	6.22	12.36	57.04	41.68	4.96	0.59	1.22	6.77	4.95	1.44	1.05	65.24	47.67
1年目	R 13	0.99397	0.98484	0.99820	0.99349	0.7026	101.90	38.22	6.13	12.34	56.69	39.83	4.93	0.58	1.22	6.73	4.73	1.43	1.00	64.85	45.56
2年目	R 14	0.99393	0.98461	0.99820	0.99345	0.6756	101.90	37.99	6.04	12.32	56.34	38.07	4.90	0.57	1.21	6.69	4.52	1.42	0.96	64.45	43.54
3年目	R 15	0.99390	0.98437	0.99819	0.99341	0.6496	101.90	37.76	5.94	12.30	56.00	36.38	4.88	0.56	1.21	6.65	4.32	1.41	0.92	64.06	41.61
4年目	R 16	0.99386	0.98412	0.99819	0.99337	0.6246	101.90	37.53	5.85	12.27	55.65	34.76	4.85	0.55	1.21	6.61	4.13	1.40	0.88	63.66	39.76
5年目	R 17	0.99382	0.98386	0.99819	0.99332	0.6006	101.90	37.30	5.76	12.25	55.31	33.22	4.82	0.54	1.21	6.57	3.94	1.39	0.84	63.27	38.00
6年目	R 18	0.99378	0.98360	0.99818	0.99328	0.5775	101.90	37.07	5.66	12.23	54.96	31.74	4.79	0.54	1.20	6.53	3.77	1.38	0.80	62.87	36.31
7年目	R 19	0.99374	0.98332	0.99818	0.99323	0.5553	101.90	36.84	5.57	12.21	54.62	30.33	4.76	0.53	1.20	6.49	3.60	1.37	0.76	62.47	34.69
8年目	R 20	0.99370	0.98304	0.99818	0.99318	0.5339	101.90	36.61	5.48	12.19	54.27	28.97	4.73	0.52	1.20	6.44	3.44	1.36	0.73	62.08	33.14
9年目	R 21	0.99366	0.98275	0.99817	0.99314	0.5134	101.90	36.38	5.39	12.16	53.92	27.68	4.70	0.51	1.20	6.40	3.29	1.36	0.70	61.68	31.67
10年目	R 22	0.99132	0.99191	0.99934	0.99287	0.4936	101.90	36.15	5.29	12.14	53.58	26.45	4.67	0.50	1.20	6.36	3.14	1.35	0.66	61.29	30.25
11年目	R 23	0.99124	0.99184	0.99934	0.99282	0.4746	101.90	35.83	5.25	12.13	53.21	25.26	4.63	0.50	1.20	6.32	3.00	1.34	0.63	60.87	28.89
12年目	R 24	0.99116	0.99177	0.99934	0.99277	0.4564	101.90	35.52	5.21	12.13	52.85	24.12	4.59	0.49	1.19	6.27	2.86	1.33	0.61	60.45	27.59
13年目	R 25	0.99108	0.99171	0.99934	0.99272	0.4388	101.90	35.20	5.16	12.12	52.48	23.03	4.55	0.49	1.19	6.23	2.73	1.32	0.58	60.03	26.34
14年目	R 26	0.99100	0.99164	0.99934	0.99266	0.4220	101.90	34.89	5.12	12.11	52.12	21.99	4.50	0.48	1.19	6.18	2.61	1.31	0.55	59.61	25.15
15年目	R 27	0.99092	0.99157	0.99934	0.99261	0.4057	101.90	34.58	5.08	12.10	51.76	21.00	4.46	0.48	1.19	6.14	2.49	1.30	0.53	59.19	24.01
16年目	R 28	0.99084	0.99149	0.99934	0.99256	0.3901	101.90	34.26	5.04	12.09	51.39	20.05	4.42	0.48	1.19	6.09	2.38	1.29	0.50	58.77	22.93
17年目	R 29	0.99075	0.99142	0.99933	0.99250	0.3751	101.90	33.95	4.99	12.09	51.03	19.14	4.38	0.47	1.19	6.05	2.27	1.28	0.48	58.35	21.89
18年目	R 30	0.99067	0.99135	0.99933	0.99244	0.3607	101.90	33.63	4.95	12.08	50.66	18.27	4.34	0.47	1.19	6.00	2.16	1.27	0.46	57.93	20.90
19年目	R 31	0.99058	0.99127	0.99933	0.99239	0.3468	101.90	33.32	4.91	12.07	50.30	17.44	4.30	0.46	1.19	5.95	2.07	1.26	0.44	57.51	19.94
20年目	R 32	0.99049	0.99119	0.99933	0.99233	0.3335	101.90	33.01	4.86	12.06	49.93	16.65	4.26	0.46	1.19	5.91	1.97	1.25	0.42	57.09	19.04
21年目	R 33	0.99040	0.99112	0.99933	0.99227	0.3207	101.90	32.69	4.82	12.05	49.57	15.89	4.22	0.46	1.19	5.86	1.88	1.24	0.40	56.67	18.17
22年目	R 34	0.99031	0.99104	0.99933	0.99221	0.3083	101.90	32.38	4.78	12.04	49.20	15.17	4.18	0.45	1.19	5.82	1.79	1.23	0.38	56.25	17.34
23年目	R 35	0.99021	0.99096	0.99933	0.99215	0.2965	101.90	32.06	4.74	12.04	48.84	14.48	4.14	0.45	1.19	5.77	1.71	1.22	0.36	55.83	16.55
24年目	R 36	0.99011	0.99087	0.99933	0.99208	0.2851	101.90	31.75	4.69	12.03	48.47	13.82	4.10	0.44	1.18	5.73	1.63	1.21	0.35	55.41	15.80
25年目	R 37	0.99002	0.99079	0.99933	0.99202	0.2741	101.90	31.44	4.65	12.02	48.11	13.19	4.06	0.44	1.18	5.68	1.56	1.20	0.33	54.99	15.07
26年目	R 38	0.98991	0.99070	0.99933	0.99196	0.2636	101.90	31.12	4.61	12.01	47.74	12.59	4.02	0.44	1.18	5.64	1.49	1.19	0.31	54.57	14.39
27年目	R 39	0.98981	0.99062	0.99933	0.99189	0.2534	101.90	30.81	4.56	12.00	47.38	12.01	3.98	0.43	1.18	5.59	1.42	1.18	0.30	54.15	13.72
28年目	R 40	0.98971	0.99053	0.99933	0.99182	0.2437	101.90	30.50	4.52	12.00	47.01	11.46	3.94	0.43	1.18	5.55	1.35	1.17	0.29	53.73	13.09
29年目	R 41	0.98960	0.99044	0.99933	0.99176	0.2343	101.90	30.18	4.48	11.99	46.65	10.93	3.90	0.42	1.18	5.50	1.29	1.16	0.27	53.31	12.49
30年目	R 42	0.98949	0.99034	0.99933	0.99169	0.2253	101.90	29.87	4.44	11.98	46.28	10.43	3.86	0.42	1.18	5.46	1.23	1.15	0.26	52.89	11.92
31年目	R 43	0.98938	0.99025	0.99933	0.99162	0.2166	101.90	29.55	4.39	11.97	45.92	9.95	3.82	0.42	1.18	5.41	1.17	1.14	0.25	52.47	11.37
32年目	R 44	0.98926	0.99015	0.99933	0.99155	0.2083	101.90	29.24	4.35	11.96	45.55	9.49	3.78	0.41	1.18	5.36	1.12	1.13	0.24	52.05	10.84
33年目	R 45	0.98915	0.99006	0.99933	0.99148	0.2003	101.90	28.93	4.31	11.96	45.19	9.05	3.73	0.41	1.18	5.32	1.07	1.13	0.23	51.63	10.34
34年目	R 46	0.98903	0.98996	0.99933	0.99140	0.1926	101.90	28.61	4.26	11.95	44.82	8.63	3.69	0.40	1.18	5.27	1.02	1.12	0.21	51.21	9.86
35年目	R 47	0.98891	0.98985	0.99933	0.99133	0.1852	101.90	28.30	4.22	11.94	44.46	8.23	3.65	0.40	1.18	5.23	0.97	1.11	0.20	50.79	9.41
36年目	R 48	0.98878	0.98975	0.99933	0.99125	0.1780	101.90	27.98	4.18	11.93	44.10	7.85	3.61	0.39	1.18	5.18	0.92	1.10	0.20	50.38	8.97
37年目	R 49	0.98866	0.98964	0.99933	0.99118	0.1712	101.90	27.67	4.14	11.92	43.73	7.49	3.57	0.39	1.17	5.14	0.88	1.09	0.19	49.96	8.55
38年目	R 50	0.98853	0.98954	0.99933	0.99110	0.1646	101.90	27.36	4.09	11.92	43.37	7.14	3.53	0.39	1.17	5.09	0.84	1.08	0.18	49.54	8.15
39年目	R 51	0.98839	0.98943	0.99933	0.99102	0.1583	101.90	27.04	4.05	11.91	43.00	6.81	3.49	0.38	1.17	5.05	0.80	1.07	0.17	49.12	7.78
40年目	R 52	0.98826	0.98931	0.99932	0.99094	0.1522	101.90	26.73	4.01	11.90	42.64	6.49	3.45	0.38	1.17	5.00	0.76	1.06	0.16	48.70	7.41
41年目	R 53	0.98812	0.98920	0.99932	0.99085	0.1463	101.90	26.41	3.96	11.89	42.27	6.18	3.41	0.37	1.17	4.96	0.73	1.05	0.15	48.28	7.06
42年目	R 54	0.98797	0.98908	0.99932	0.99077	0.1407	101.90	26.10	3.92	11.88	41.91	5.90	3.37	0.37	1.17	4.91	0.69	1.04	0.15	47.86	6.73
43年目	R 55	0.98783	0.98896	0.99932	0.99068	0.1353	101.90	25.79	3.88	11.88	41.54	5.62	3.33	0.37	1.17	4.87	0.66	1.03	0.14	47.44	6.42
44年目	R 56	0.98768	0.98883	0.99932	0.99059	0.1301	101.90	25.47	3.84	11.87	41.18	5.36	3.29	0.36	1.17	4.82	0.63	1.02	0.13	47.02	6.12
45年目	R 57	0.98752	0.98871	0.99932	0.99051	0.1251	101.90	25.16	3.79	11.86	40.81	5.11	3.25	0.36	1.17	4.78	0.60	1.01	0.13	46.60	5.83
46年目	R 58	0.98737	0.98858	0.99932	0.99041	0.1203	101.90	24.85	3.75	11.85	40.45	4.87	3.21	0.35	1.17	4.73	0.57	1.00	0.12	46.18	5.56
47年目	R 59	0.98720	0.98845	0.99932	0.99032	0.1157	101.90	24.53	3.71	11.84	40.08	4.64	3.17	0.35	1.17	4.68	0.54	0.99	0.11	45.76	5.29
48年目	R 60	0.98704	0.98831	0.99932	0.99023	0.1112	101.90	24.22	3.66	11.84	39.72	4.42	3.13	0.35	1.17	4.64	0.52	0.98	0.11	45.34	5.04
49年目	R 61	0.98687	0.98817	0.99932	0.99013	0.1069	101.90	23.90	3.62	11.83	39.35	4.21	3.09	0.34	1.17	4.59	0.49	0.97	0.10	44.92	4.80
合計								1,575.10	236.33	602.02	2,413.45	833.43	203.36	22.34	59.30	285.00	98.66	60.32	20.89	2,758.77	952.98

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
日高自動車道 (一般国道235号)	静内三石道路 (静内～東静内)	L=8.0km	高規格B	B P

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
7,700	2	北海道開発局

① 費用

	事業費	維持管理費	更新費	合計
基準年	令和4年度			
単純合計	473億円	50億円		523億円
うち残事業分	472億円	50億円		522億円
基準年における 現在価値(C)	370億円	15億円		385億円
うち残事業分	369億円	15億円		384億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和4年度			
供用年	令和15年度			
単年便益 (初年便益)	26億円	2.5億円	0.47億円	29億円
基準年における 現在価値(B)	336億円	31億円	6.0億円	373億円
うち残事業分	336億円	31億円	6.0億円	373億円

③ 結果

費用便益比(事業全体)	0.97
経済的純現在価値(事業全体)	-12億円
経済的内部収益率(事業全体)	3.8%
費用便益比(残事業)	0.97
経済的純現在価値(残事業)	-11億円
経済的内部収益率(残事業)	3.8%

注)費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比(B/C)
交通量	7,700	±10%	0.8~1.1
事業費	473億円	±10%	0.9~1.1
事業期間	11年	±20%	0.9~1.01

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比(B/C)
交通量	7,700	±10%	0.9~1.1
事業費	472億円	±10%	0.9~1.1
事業期間	10年	±20%	0.9~1.01

交通状況の変化(事業全体)

事業名: 静内三石道路(静内～東静内)

(推計時点 R22年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] 8.0km	交通量	[台/日]	0	7,700	
	走行時間	[分]	0.0	6.1	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	9.42	
②主な 周辺道路	現道: 国道235号 9.2km	交通量	[台/日]	9,100	3,500
		走行時間	[分]	19.8	14.8
		走行時間費用	[億円/年]	34.10	9.31
	一) 静内 浦河線 9.4km	交通量	[台/日]	1,800	200
		走行時間	[分]	20.5	18.9
		走行時間費用	[億円/年]	7.65	0.81
③その他道路合計 26,369.3km		走行時間費用	[億円/年]	20,998.72	20,996.10

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計: 26,395.9km	走行時間短縮便益	[億円/年]	21,040.47	21,015.64	24.83

事業名: 静内三石道路(静内～東静内)

【 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)】



交通状況の変化(残事業)

事業名: 静内三石道路(静内～東静内)


(推計時点 R22年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] 8.0km	交通量	[台/日]	0	7,700	
	走行時間	[分]	0.0	6.1	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	9.42	
②主な 周辺道路	現道: 国道235号 9.2km	交通量	[台/日]	9,100	3,500
		走行時間	[分]	19.8	14.8
		走行時間費用	[億円/年]	34.10	9.31
	一) 静内 浦河線 9.4km	交通量	[台/日]	1,800	200
		走行時間	[分]	20.5	18.9
		走行時間費用	[億円/年]	7.65	0.81
③その他道路合計 26,369.3km		走行時間費用	[億円/年]	20,998.72	20,996.10

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計: 26,395.9km	走行時間短縮便益	[億円/年]	21,040.47	21,015.64	24.83

事業名: 静内三石道路(静内～東静内)

【 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)】

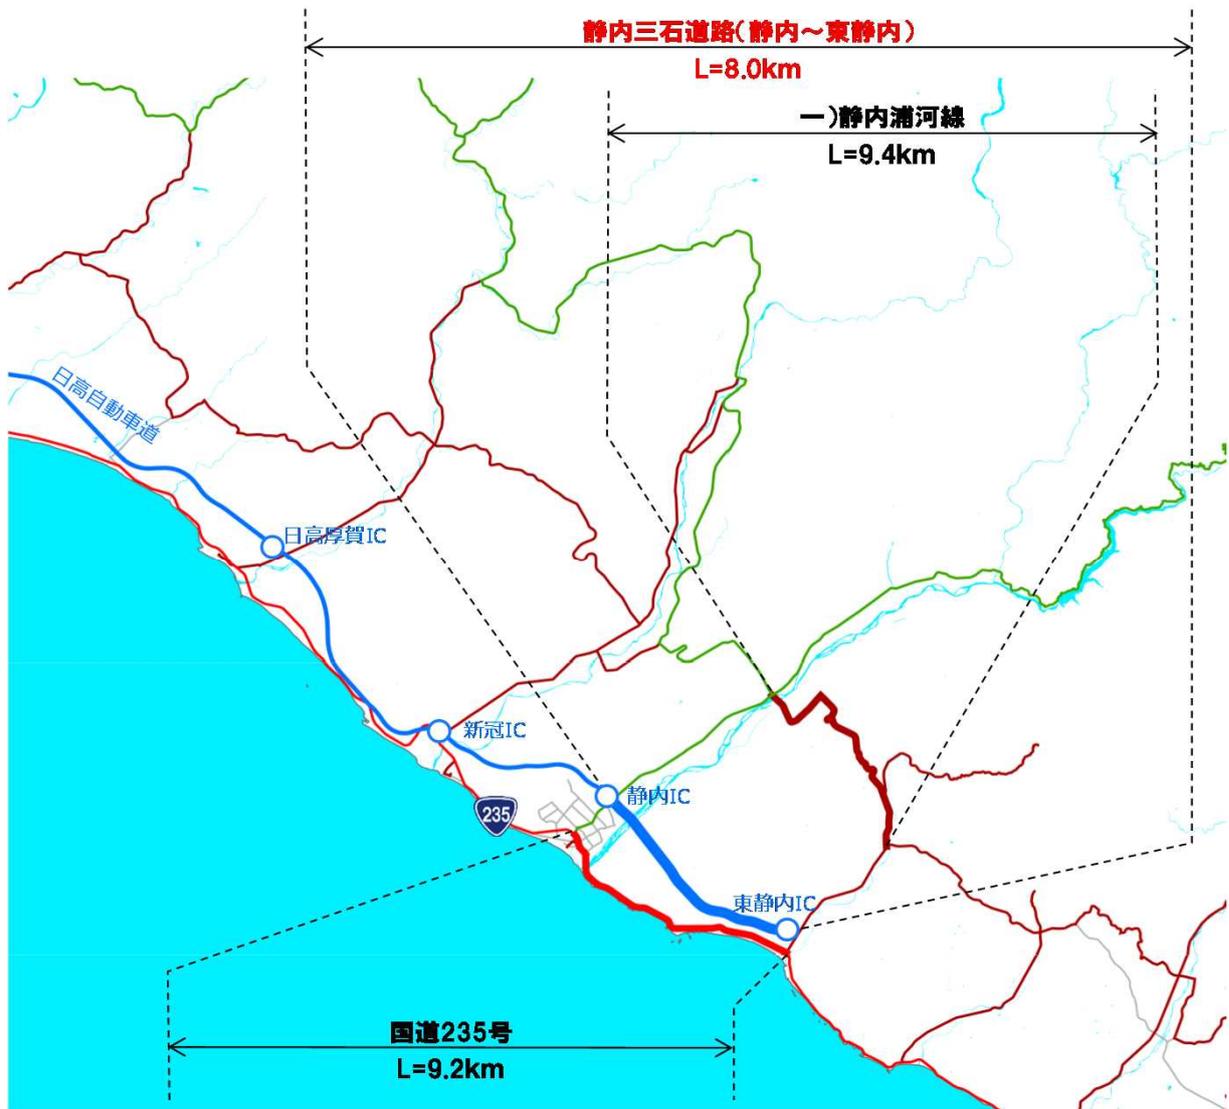

費用便益分析の条件

事業名：静内三石道路(静内～東静内)

(2)

項目		チェック欄
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和4年2月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>
	その他	<input type="checkbox"/>
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間
	社会的割引率	4%
	基準年次	令和4年
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (R22)
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H27センサス)
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
	その他()	<input type="checkbox"/>
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
	有	<input type="checkbox"/>
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載
交通流推計	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>
	簡易手法	<input type="checkbox"/>
	簡易手法の 採択理由	小規模事業である 山間部海岸部で併行道路が少ない その他()
	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)	
	その他()	<input type="checkbox"/>
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定	<input checked="" type="checkbox"/>
	採用理由を記載	交通容量未満・以上の路線が混在した配分結果となっているため、便益算出においては速度差の生ずる加重平均速度を用いた。
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>
	採用理由を記載	
その他()	<input type="checkbox"/>	

事業名: 静内三石道路(静内～東静内)

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数	()%
	休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載			
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数	()日
			採用した通行止め日数の考え方を記載	
とり止め交通を考慮する		<input type="checkbox"/>		
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載				
冬期交通の影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>		
	考慮する	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する場合のみ	採用した冬期日数	(94)日	
		採用した冬期日数の考え方を記載 当該地域の直近3か年(令和元年～令和3年)における最低気温0℃以下かつ積雪1cm以上を満たす日数とし、94日と設定		
		冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載 Vmax、Vminについて低減		
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ()	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
その他				

事業名: 静内三石道路(静内～東静内)

(4)

		項目	チェック欄	
費用の算定	事業費	詳細事業計画による値を採用	<input type="checkbox"/>	
		標準投資パターンを採用	<input checked="" type="checkbox"/>	
		その他()	<input type="checkbox"/>	
	維持管理費	維持管理費の設定根拠を記載 当該区間を管轄する事務所における直轄国道の維持管理費実績に基づき算出		
	更新費	更新費の設定根拠を記載 評価対象期間末までに設計供用期間を超過する橋梁がないため計上しない		
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である	<input checked="" type="checkbox"/>	
	当該道路整備が行われない場合の費用	考慮しない		<input checked="" type="checkbox"/>
		考慮する		<input type="checkbox"/>
		考慮する場合のみ	事業費を考慮	<input type="checkbox"/>
			維持管理費を考慮	<input type="checkbox"/>
		当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載(対策内容、費用等)		
その他				
4. その他				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				

費用の現在価値算定表(事業全体)

維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:日高自動車道(一般国道235号) 静内三石道路(静内～東静内)

年次	年度	割引率 4.0%	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)		
				単価(億円)	延長(km)	単価(億円)	単価(億円)	現在価値	単価(億円)	現在価値
				0.138	8.0	1.10				
-11年目	R 4	1.0000	101.90	0.91	0.91					
-10年目	R 5	0.9615	101.90	7.13	6.85					
- 9年目	R 6	0.9246	101.90	13.10	12.11					
- 8年目	R 7	0.8890	101.90	11.12	9.88					
- 7年目	R 8	0.8548	101.90	52.92	45.24					
- 6年目	R 9	0.8219	101.90	79.36	65.23					
- 5年目	R 10	0.7903	101.90	79.36	62.72					
- 4年目	R 11	0.7599	101.90	79.36	60.31					
- 3年目	R 12	0.7307	101.90	81.09	59.25					
- 2年目	R 13	0.7026	101.90	64.50	45.32					
- 1年目	R 14	0.6756	101.90	4.03	2.72					
供用開始年次	R 15	0.6496	101.90			1.00	0.65			
1年目	R 16	0.6246	101.90			1.00	0.62			
2年目	R 17	0.6006	101.90			1.00	0.60			
3年目	R 18	0.5775	101.90			1.00	0.58			
4年目	R 19	0.5553	101.90			1.00	0.56			
5年目	R 20	0.5339	101.90			1.00	0.53			
6年目	R 21	0.5134	101.90			1.00	0.51			
7年目	R 22	0.4936	101.90			1.00	0.49			
8年目	R 23	0.4746	101.90			1.00	0.47			
9年目	R 24	0.4564	101.90			1.00	0.46			
10年目	R 25	0.4388	101.90			1.00	0.44			
11年目	R 26	0.4220	101.90			1.00	0.42			
12年目	R 27	0.4057	101.90			1.00	0.41			
13年目	R 28	0.3901	101.90			1.00	0.39			
14年目	R 29	0.3751	101.90			1.00	0.38			
15年目	R 30	0.3607	101.90			1.00	0.36			
16年目	R 31	0.3468	101.90			1.00	0.35			
17年目	R 32	0.3335	101.90			1.00	0.33			
18年目	R 33	0.3207	101.90			1.00	0.32			
19年目	R 34	0.3083	101.90			1.00	0.31			
20年目	R 35	0.2965	101.90			1.00	0.30			
21年目	R 36	0.2851	101.90			1.00	0.29			
22年目	R 37	0.2741	101.90			1.00	0.27			
23年目	R 38	0.2636	101.90			1.00	0.26			
24年目	R 39	0.2534	101.90			1.00	0.25			
25年目	R 40	0.2437	101.90			1.00	0.24			
26年目	R 41	0.2343	101.90			1.00	0.23			
27年目	R 42	0.2253	101.90			1.00	0.23			
28年目	R 43	0.2166	101.90			1.00	0.22			
29年目	R 44	0.2083	101.90			1.00	0.21			
30年目	R 45	0.2003	101.90			1.00	0.20			
31年目	R 46	0.1926	101.90			1.00	0.19			
32年目	R 47	0.1852	101.90			1.00	0.19			
33年目	R 48	0.1780	101.90			1.00	0.18			
34年目	R 49	0.1712	101.90			1.00	0.17			
35年目	R 50	0.1646	101.90			1.00	0.16			
36年目	R 51	0.1583	101.90			1.00	0.16			
37年目	R 52	0.1522	101.90			1.00	0.15			
38年目	R 53	0.1463	101.90			1.00	0.15			
39年目	R 54	0.1407	101.90			1.00	0.14			
40年目	R 55	0.1353	101.90			1.00	0.14			
41年目	R 56	0.1301	101.90			1.00	0.13			
42年目	R 57	0.1251	101.90			1.00	0.13			
43年目	R 58	0.1203	101.90			1.00	0.12			
44年目	R 59	0.1157	101.90			1.00	0.12			
45年目	R 60	0.1112	101.90			1.00	0.11			
46年目	R 61	0.1069	101.90			1.00	0.11			
47年目	R 62	0.1028	101.90			1.00	0.10			
48年目	R 63	0.0989	101.90			1.00	0.10			
49年目	R 64	0.0951	101.90	-1.73	-0.16	1.00	0.10			
合計				471.15	370.38	50.00	14.51	0.00	0.00	
単純事業費計				472.88		50.00		0.00		

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表(残事業)

維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 日高自動車道(一般国道235号) 静内三石道路(静内~東静内)

単価(億円)	延長(km)	単価(億円)
0.138	8.0	1.10

年次	年度	割引率 4.0%	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
				単価	現在	単価	現在	単価	現在
-10年目	R 5	0.9615	101.90	7.13	6.85				
- 9年目	R 6	0.9246	101.90	13.10	12.11				
- 8年目	R 7	0.8890	101.90	11.12	9.88				
- 7年目	R 8	0.8548	101.90	52.92	45.24				
- 6年目	R 9	0.8219	101.90	79.36	65.23				
- 5年目	R 10	0.7903	101.90	79.36	62.72				
- 4年目	R 11	0.7599	101.90	79.36	60.31				
- 3年目	R 12	0.7307	101.90	81.09	59.25				
- 2年目	R 13	0.7026	101.90	64.50	45.32				
- 1年目	R 14	0.6756	101.90	4.03	2.72				
供用開始年次	R 15	0.6496	101.90			1.00	0.65		
1年目	R 16	0.6246	101.90			1.00	0.62		
2年目	R 17	0.6006	101.90			1.00	0.60		
3年目	R 18	0.5775	101.90			1.00	0.58		
4年目	R 19	0.5553	101.90			1.00	0.56		
5年目	R 20	0.5339	101.90			1.00	0.53		
6年目	R 21	0.5134	101.90			1.00	0.51		
7年目	R 22	0.4936	101.90			1.00	0.49		
8年目	R 23	0.4746	101.90			1.00	0.47		
9年目	R 24	0.4564	101.90			1.00	0.46		
10年目	R 25	0.4388	101.90			1.00	0.44		
11年目	R 26	0.4220	101.90			1.00	0.42		
12年目	R 27	0.4057	101.90			1.00	0.41		
13年目	R 28	0.3901	101.90			1.00	0.39		
14年目	R 29	0.3751	101.90			1.00	0.38		
15年目	R 30	0.3607	101.90			1.00	0.36		
16年目	R 31	0.3468	101.90			1.00	0.35		
17年目	R 32	0.3335	101.90			1.00	0.33		
18年目	R 33	0.3207	101.90			1.00	0.32		
19年目	R 34	0.3083	101.90			1.00	0.31		
20年目	R 35	0.2965	101.90			1.00	0.30		
21年目	R 36	0.2851	101.90			1.00	0.29		
22年目	R 37	0.2741	101.90			1.00	0.27		
23年目	R 38	0.2636	101.90			1.00	0.26		
24年目	R 39	0.2534	101.90			1.00	0.25		
25年目	R 40	0.2437	101.90			1.00	0.24		
26年目	R 41	0.2343	101.90			1.00	0.23		
27年目	R 42	0.2253	101.90			1.00	0.23		
28年目	R 43	0.2166	101.90			1.00	0.22		
29年目	R 44	0.2083	101.90			1.00	0.21		
30年目	R 45	0.2003	101.90			1.00	0.20		
31年目	R 46	0.1926	101.90			1.00	0.19		
32年目	R 47	0.1852	101.90			1.00	0.19		
33年目	R 48	0.1780	101.90			1.00	0.18		
34年目	R 49	0.1712	101.90			1.00	0.17		
35年目	R 50	0.1646	101.90			1.00	0.16		
36年目	R 51	0.1583	101.90			1.00	0.16		
37年目	R 52	0.1522	101.90			1.00	0.15		
38年目	R 53	0.1463	101.90			1.00	0.15		
39年目	R 54	0.1407	101.90			1.00	0.14		
40年目	R 55	0.1353	101.90			1.00	0.14		
41年目	R 56	0.1301	101.90			1.00	0.13		
42年目	R 57	0.1251	101.90			1.00	0.13		
43年目	R 58	0.1203	101.90			1.00	0.12		
44年目	R 59	0.1157	101.90			1.00	0.12		
45年目	R 60	0.1112	101.90			1.00	0.11		
46年目	R 61	0.1069	101.90			1.00	0.11		
47年目	R 62	0.1028	101.90			1.00	0.10		
48年目	R 63	0.0989	101.90			1.00	0.10		
49年目	R 64	0.0951	101.90	-1.73	-0.16	1.00	0.10		
合計				470.25	369.47	50.00	14.51	0.00	0.00

単純事業費計	471.98	50.00	0.00
--------	--------	-------	------

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表(事業全体)

箇所名:日高自動車道(一般国道235号) 静内三石道路(静内~東静内)

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (北海道ブロック)				GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車		乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4.0%
供用開始年次	R 15	0.99390	0.98437	0.99819	0.99341	101.90	16.81	4.22	5.05	28.08	16.94	1.70	0.35	0.40	2.45	1.59	0.47	0.30	28.99	18.84
1年目	R 16	0.99386	0.98412	0.99819	0.99337	101.90	16.70	4.15	5.04	25.90	16.18	1.69	0.35	0.40	2.44	1.52	0.46	0.29	28.80	17.99
2年目	R 17	0.99382	0.98386	0.99819	0.99332	101.90	16.60	4.09	5.03	25.72	15.45	1.68	0.34	0.40	2.42	1.45	0.46	0.28	28.60	17.18
3年目	R 18	0.99378	0.98360	0.99818	0.99328	101.90	16.50	4.02	5.02	25.54	14.75	1.67	0.34	0.40	2.40	1.39	0.46	0.26	28.40	16.40
4年目	R 19	0.99374	0.98332	0.99818	0.99323	101.90	16.40	3.95	5.01	25.36	14.09	1.66	0.33	0.40	2.39	1.33	0.45	0.25	28.21	15.66
5年目	R 20	0.99370	0.98304	0.99818	0.99318	101.90	16.29	3.89	5.00	25.19	13.45	1.64	0.33	0.40	2.37	1.27	0.45	0.24	28.01	14.95
6年目	R 21	0.99366	0.98275	0.99817	0.99314	101.90	16.19	3.82	5.00	25.01	12.84	1.63	0.32	0.40	2.35	1.21	0.45	0.23	27.81	14.28
7年目	R 22	0.99132	0.99191	0.99934	0.99287	101.90	16.09	3.76	4.99	24.83	12.26	1.62	0.32	0.40	2.34	1.15	0.45	0.22	27.61	13.63
8年目	R 23	0.99124	0.99184	0.99934	0.99282	101.90	15.95	3.73	4.98	24.66	11.70	1.61	0.31	0.40	2.32	1.10	0.44	0.21	27.42	13.01
9年目	R 24	0.99116	0.99177	0.99934	0.99277	101.90	15.81	3.70	4.98	24.49	11.17	1.60	0.31	0.40	2.30	1.05	0.44	0.20	27.23	12.43
10年目	R 25	0.99108	0.99171	0.99934	0.99272	101.90	15.67	3.67	4.98	24.31	10.67	1.58	0.31	0.40	2.29	1.00	0.44	0.19	27.03	11.86
11年目	R 26	0.99100	0.99164	0.99934	0.99266	101.90	15.53	3.64	4.97	24.14	10.19	1.57	0.31	0.40	2.27	0.96	0.43	0.18	26.84	11.33
12年目	R 27	0.99092	0.99157	0.99934	0.99261	101.90	15.39	3.60	4.97	23.96	9.72	1.55	0.30	0.39	2.25	0.91	0.43	0.17	26.65	10.81
13年目	R 28	0.99084	0.99149	0.99934	0.99256	101.90	15.25	3.57	4.97	23.79	9.28	1.54	0.30	0.39	2.23	0.87	0.43	0.17	26.45	10.32
14年目	R 29	0.99075	0.99142	0.99933	0.99250	101.90	15.11	3.54	4.96	23.62	8.86	1.53	0.30	0.39	2.22	0.83	0.42	0.16	26.26	9.85
15年目	R 30	0.99067	0.99135	0.99933	0.99244	101.90	14.97	3.51	4.96	23.44	8.46	1.51	0.30	0.39	2.20	0.79	0.42	0.15	26.07	9.40
16年目	R 31	0.99058	0.99127	0.99933	0.99239	101.90	14.83	3.48	4.96	23.27	8.07	1.50	0.29	0.39	2.18	0.76	0.42	0.14	25.87	8.97
17年目	R 32	0.99049	0.99119	0.99933	0.99233	101.90	14.69	3.45	4.95	23.10	7.70	1.48	0.29	0.39	2.17	0.72	0.41	0.14	25.68	8.56
18年目	R 33	0.99040	0.99112	0.99933	0.99227	101.90	14.55	3.42	4.95	22.92	7.35	1.47	0.29	0.39	2.15	0.69	0.41	0.13	25.48	8.17
19年目	R 34	0.99031	0.99104	0.99933	0.99221	101.90	14.41	3.39	4.95	22.75	7.01	1.45	0.29	0.39	2.13	0.66	0.41	0.13	25.29	7.80
20年目	R 35	0.99021	0.99096	0.99933	0.99215	101.90	14.27	3.36	4.94	22.58	6.69	1.44	0.28	0.39	2.12	0.63	0.40	0.12	25.10	7.44
21年目	R 36	0.99011	0.99087	0.99933	0.99208	101.90	14.13	3.33	4.94	22.40	6.39	1.43	0.28	0.39	2.10	0.60	0.40	0.11	24.90	7.10
22年目	R 37	0.99002	0.99079	0.99933	0.99202	101.90	13.99	3.30	4.94	22.23	6.09	1.41	0.28	0.39	2.08	0.57	0.40	0.11	24.71	6.77
23年目	R 38	0.98991	0.99070	0.99933	0.99196	101.90	13.85	3.27	4.93	22.06	5.81	1.40	0.28	0.39	2.07	0.54	0.39	0.10	24.52	6.46
24年目	R 39	0.98981	0.99062	0.99933	0.99189	101.90	13.71	3.24	4.93	21.88	5.55	1.38	0.27	0.39	2.05	0.52	0.39	0.10	24.32	6.16
25年目	R 40	0.98971	0.99053	0.99933	0.99182	101.90	13.57	3.21	4.93	21.71	5.29	1.37	0.27	0.39	2.03	0.50	0.39	0.09	24.13	5.88
26年目	R 41	0.98960	0.99044	0.99933	0.99176	101.90	13.43	3.18	4.92	21.54	5.05	1.36	0.27	0.39	2.01	0.47	0.38	0.09	23.94	5.61
27年目	R 42	0.98949	0.99034	0.99933	0.99169	101.90	13.29	3.15	4.92	21.36	4.81	1.34	0.26	0.39	2.00	0.45	0.38	0.09	23.74	5.35
28年目	R 43	0.98938	0.99025	0.99933	0.99162	101.90	13.15	3.12	4.92	21.19	4.59	1.33	0.26	0.39	1.98	0.43	0.38	0.08	23.55	5.10
29年目	R 44	0.98926	0.99015	0.99933	0.99155	101.90	13.01	3.09	4.91	21.02	4.38	1.31	0.26	0.39	1.96	0.41	0.38	0.08	23.36	4.87
30年目	R 45	0.98915	0.99006	0.99933	0.99148	101.90	12.88	3.06	4.91	20.84	4.17	1.30	0.26	0.39	1.95	0.39	0.37	0.07	23.16	4.64
31年目	R 46	0.98903	0.98996	0.99933	0.99140	101.90	12.74	3.03	4.91	20.67	3.98	1.29	0.25	0.39	1.93	0.37	0.37	0.07	22.97	4.42
32年目	R 47	0.98891	0.98985	0.99933	0.99133	101.90	12.60	3.00	4.90	20.50	3.80	1.27	0.25	0.39	1.91	0.35	0.37	0.07	22.78	4.22
33年目	R 48	0.98878	0.98975	0.99933	0.99125	101.90	12.46	2.97	4.90	20.32	3.62	1.26	0.25	0.39	1.90	0.34	0.36	0.06	22.58	4.02
34年目	R 49	0.98866	0.98964	0.99933	0.99118	101.90	12.32	2.94	4.90	20.15	3.45	1.24	0.25	0.39	1.88	0.32	0.36	0.06	22.39	3.83
35年目	R 50	0.98853	0.98954	0.99933	0.99110	101.90	12.18	2.91	4.89	19.98	3.29	1.23	0.24	0.39	1.86	0.31	0.36	0.06	22.19	3.65
36年目	R 51	0.98839	0.98943	0.99933	0.99102	101.90	12.04	2.88	4.89	19.80	3.13	1.22	0.24	0.39	1.85	0.29	0.35	0.06	22.00	3.48
37年目	R 52	0.98826	0.98931	0.99932	0.99094	101.90	11.90	2.84	4.89	19.63	2.99	1.20	0.24	0.39	1.83	0.28	0.35	0.05	21.81	3.32
38年目	R 53	0.98812	0.98920	0.99932	0.99085	101.90	11.76	2.81	4.88	19.46	2.85	1.19	0.24	0.39	1.81	0.27	0.35	0.05	21.61	3.16
39年目	R 54	0.98797	0.98908	0.99932	0.99077	101.90	11.62	2.78	4.88	19.28	2.71	1.17	0.23	0.39	1.79	0.25	0.34	0.05	21.42	3.01
40年目	R 55	0.98783	0.98896	0.99932	0.99068	101.90	11.48	2.75	4.88	19.11	2.59	1.16	0.23	0.39	1.78	0.24	0.34	0.05	21.23	2.87
41年目	R 56	0.98768	0.98883	0.99932	0.99059	101.90	11.34	2.72	4.87	18.94	2.46	1.14	0.23	0.39	1.76	0.23	0.34	0.04	21.03	2.74
42年目	R 57	0.98752	0.98871	0.99932	0.99051	101.90	11.20	2.69	4.87	18.76	2.35	1.13	0.23	0.39	1.74	0.22	0.33	0.04	20.84	2.61
43年目	R 58	0.98737	0.98858	0.99932	0.99041	101.90	11.06	2.66	4.87	18.59	2.24	1.12	0.22	0.39	1.73	0.21	0.33	0.04	20.65	2.48
44年目	R 59	0.98720	0.98845	0.99932	0.99032	101.90	10.92	2.63	4.86	18.42	2.13	1.10	0.22	0.39	1.71	0.20	0.33	0.04	20.45	2.37
45年目	R 60	0.98704	0.98831	0.99932	0.99023	101.90	10.78	2.60	4.86	18.24	2.03	1.09	0.22	0.39	1.69	0.19	0.32	0.04	20.26	2.25
46年目	R 61	0.98687	0.98817	0.99932	0.99013	101.90	10.64	2.57	4.86	18.07	1.93	1.07	0.22	0.39	1.68	0.18	0.32	0.03	20.07	2.15
47年目	R 62	0.98669	0.98803	0.99932	0.99003	101.90	10.50	2.54	4.85	17.89	1.84	1.06	0.21	0.39	1.66	0.17	0.32	0.03	19.87	2.04
48年目	R 63	0.98651	0.98789	0.99932	0.98993	101.90	10.36	2.51	4.85	17.72	1.75	1.05	0.21	0.39	1.64	0.16	0.31	0.03	19.68	1.95
49年目	R 64	0.98633	0.98774	0.99932	0.98983	101.90	10.22	2.48	4.85	17.55	1.67	1.03	0.21	0.39	1.63	0.15	0.31	0.03	19.49	1.85
合計		</																		

便益の現在価値算定表(残事業)

箇所名:日高自動車道(一般国道235号) 静内三石道路(静内~東静内)

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (北海道ブロック)				割戻率 4.0% (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割戻率4.0%
供用開始年次	R 15	0.99390	0.98437	0.99819	0.99341	0.6496	101.90	16.81	4.22	5.05	26.08	16.94	1.70	0.35	0.40	2.45	1.59	0.47	0.30	28.99	18.84
1年目	R 16	0.99386	0.98412	0.99819	0.99337	0.6246	101.90	16.70	4.15	5.04	25.90	16.18	1.69	0.35	0.40	2.44	1.52	0.46	0.29	28.80	17.99
2年目	R 17	0.99382	0.98386	0.99819	0.99332	0.6006	101.90	16.60	4.09	5.03	25.72	15.45	1.68	0.34	0.40	2.42	1.45	0.46	0.28	28.60	17.18
3年目	R 18	0.99378	0.98360	0.99818	0.99328	0.5775	101.90	16.50	4.02	5.02	25.54	14.75	1.67	0.34	0.40	2.40	1.39	0.46	0.26	28.40	16.40
4年目	R 19	0.99374	0.98332	0.99818	0.99323	0.5553	101.90	16.40	3.95	5.01	25.36	14.09	1.66	0.33	0.40	2.39	1.33	0.45	0.25	28.21	15.66
5年目	R 20	0.99370	0.98304	0.99818	0.99318	0.5339	101.90	16.29	3.89	5.00	25.19	13.45	1.64	0.33	0.40	2.37	1.27	0.45	0.24	28.01	14.95
6年目	R 21	0.99366	0.98275	0.99817	0.99314	0.5134	101.90	16.19	3.82	5.00	25.01	12.84	1.63	0.32	0.40	2.35	1.21	0.45	0.23	27.81	14.28
7年目	R 22	0.99132	0.99191	0.99934	0.99287	0.4936	101.90	16.09	3.76	4.99	24.83	12.26	1.62	0.32	0.40	2.34	1.15	0.45	0.22	27.61	13.63
8年目	R 23	0.99124	0.99184	0.99934	0.99282	0.4746	101.90	15.95	3.73	4.98	24.66	11.70	1.61	0.31	0.40	2.32	1.10	0.44	0.21	27.42	13.01
9年目	R 24	0.99116	0.99177	0.99934	0.99277	0.4564	101.90	15.81	3.70	4.98	24.49	11.17	1.60	0.31	0.40	2.30	1.05	0.44	0.20	27.23	12.43
10年目	R 25	0.99108	0.99171	0.99934	0.99272	0.4388	101.90	15.67	3.67	4.98	24.31	10.67	1.58	0.31	0.40	2.29	1.00	0.44	0.19	27.03	11.86
11年目	R 26	0.99100	0.99164	0.99934	0.99266	0.4220	101.90	15.53	3.64	4.97	24.14	10.19	1.57	0.31	0.40	2.27	0.96	0.43	0.18	26.84	11.33
12年目	R 27	0.99092	0.99157	0.99934	0.99261	0.4057	101.90	15.39	3.60	4.97	23.96	9.72	1.55	0.30	0.39	2.25	0.91	0.43	0.17	26.65	10.81
13年目	R 28	0.99084	0.99149	0.99934	0.99256	0.3901	101.90	15.25	3.57	4.97	23.79	9.28	1.54	0.30	0.39	2.23	0.87	0.43	0.17	26.45	10.32
14年目	R 29	0.99075	0.99142	0.99933	0.99250	0.3751	101.90	15.11	3.54	4.96	23.62	8.86	1.53	0.30	0.39	2.22	0.83	0.42	0.16	26.26	9.85
15年目	R 30	0.99067	0.99135	0.99933	0.99244	0.3607	101.90	14.97	3.51	4.96	23.44	8.46	1.51	0.30	0.39	2.20	0.79	0.42	0.15	26.07	9.40
16年目	R 31	0.99058	0.99127	0.99933	0.99239	0.3468	101.90	14.83	3.48	4.96	23.27	8.07	1.50	0.29	0.39	2.18	0.76	0.42	0.14	25.87	8.97
17年目	R 32	0.99049	0.99119	0.99933	0.99233	0.3335	101.90	14.69	3.45	4.95	23.10	7.70	1.48	0.29	0.39	2.17	0.72	0.41	0.14	25.68	8.56
18年目	R 33	0.99040	0.99112	0.99933	0.99227	0.3207	101.90	14.55	3.42	4.95	22.92	7.35	1.47	0.29	0.39	2.15	0.69	0.41	0.13	25.48	8.17
19年目	R 34	0.99031	0.99104	0.99933	0.99221	0.3083	101.90	14.41	3.39	4.95	22.75	7.01	1.45	0.29	0.39	2.13	0.66	0.41	0.13	25.29	7.80
20年目	R 35	0.99021	0.99096	0.99933	0.99215	0.2965	101.90	14.27	3.36	4.94	22.58	6.69	1.44	0.28	0.39	2.12	0.63	0.40	0.12	25.10	7.44
21年目	R 36	0.99011	0.99087	0.99933	0.99208	0.2851	101.90	14.13	3.33	4.94	22.40	6.39	1.43	0.28	0.39	2.10	0.60	0.40	0.11	24.90	7.10
22年目	R 37	0.99002	0.99079	0.99933	0.99202	0.2741	101.90	13.99	3.30	4.94	22.23	6.09	1.41	0.28	0.39	2.08	0.57	0.40	0.11	24.71	6.77
23年目	R 38	0.98991	0.99070	0.99933	0.99196	0.2636	101.90	13.85	3.27	4.93	22.06	5.81	1.40	0.28	0.39	2.07	0.54	0.39	0.10	24.52	6.46
24年目	R 39	0.98981	0.99062	0.99933	0.99189	0.2534	101.90	13.71	3.24	4.93	21.88	5.55	1.38	0.27	0.39	2.05	0.52	0.39	0.10	24.32	6.16
25年目	R 40	0.98971	0.99053	0.99933	0.99182	0.2437	101.90	13.57	3.21	4.93	21.71	5.29	1.37	0.27	0.39	2.03	0.50	0.39	0.09	24.13	5.88
26年目	R 41	0.98960	0.99044	0.99933	0.99176	0.2343	101.90	13.43	3.18	4.92	21.54	5.05	1.36	0.27	0.39	2.01	0.47	0.38	0.09	23.94	5.61
27年目	R 42	0.98949	0.99034	0.99933	0.99169	0.2253	101.90	13.29	3.15	4.92	21.36	4.81	1.34	0.26	0.39	2.00	0.45	0.38	0.09	23.74	5.35
28年目	R 43	0.98938	0.99025	0.99933	0.99162	0.2166	101.90	13.15	3.12	4.92	21.19	4.59	1.33	0.26	0.39	1.98	0.43	0.38	0.08	23.55	5.10
29年目	R 44	0.98926	0.99015	0.99933	0.99155	0.2083	101.90	13.01	3.09	4.91	21.02	4.38	1.31	0.26	0.39	1.96	0.41	0.38	0.08	23.36	4.87
30年目	R 45	0.98915	0.99006	0.99933	0.99148	0.2003	101.90	12.88	3.06	4.91	20.84	4.17	1.30	0.26	0.39	1.95	0.39	0.37	0.07	23.16	4.64
31年目	R 46	0.98903	0.98996	0.99933	0.99140	0.1926	101.90	12.74	3.03	4.91	20.67	3.98	1.29	0.25	0.39	1.93	0.37	0.37	0.07	22.97	4.42
32年目	R 47	0.98891	0.98985	0.99933	0.99133	0.1852	101.90	12.60	3.00	4.90	20.50	3.80	1.27	0.25	0.39	1.91	0.35	0.37	0.07	22.78	4.22
33年目	R 48	0.98878	0.98975	0.99933	0.99125	0.1780	101.90	12.46	2.97	4.90	20.32	3.62	1.26	0.25	0.39	1.90	0.34	0.36	0.06	22.58	4.02
34年目	R 49	0.98866	0.98964	0.99933	0.99118	0.1712	101.90	12.32	2.94	4.90	20.15	3.45	1.24	0.25	0.39	1.88	0.32	0.36	0.06	22.39	3.83
35年目	R 50	0.98853	0.98954	0.99933	0.99110	0.1646	101.90	12.18	2.91	4.89	19.98	3.29	1.23	0.24	0.39	1.86	0.31	0.36	0.06	22.19	3.65
36年目	R 51	0.98839	0.98943	0.99933	0.99102	0.1583	101.90	12.04	2.88	4.89	19.80	3.13	1.22	0.24	0.39	1.85	0.29	0.35	0.06	22.00	3.48
37年目	R 52	0.98826	0.98931	0.99932	0.99094	0.1522	101.90	11.90	2.84	4.89	19.63	2.99	1.20	0.24	0.39	1.83	0.28	0.35	0.05	21.81	3.32
38年目	R 53	0.98812	0.98920	0.99932	0.99085	0.1463	101.90	11.76	2.81	4.88	19.46	2.85	1.19	0.24	0.39	1.81	0.27	0.35	0.05	21.61	3.16
39年目	R 54	0.98797	0.98908	0.99932	0.99077	0.1407	101.90	11.62	2.78	4.88	19.28	2.71	1.17	0.23	0.39	1.79	0.25	0.34	0.05	21.42	3.01
40年目	R 55	0.98783	0.98896	0.99932	0.99068	0.1353	101.90	11.48	2.75	4.88	19.11	2.59	1.16	0.23	0.39	1.78	0.24	0.34	0.05	21.23	2.87
41年目	R 56	0.98768	0.98883	0.99932	0.99059	0.1301	101.90	11.34	2.72	4.87	18.94	2.46	1.14	0.23	0.39	1.76	0.23	0.34	0.04	21.03	2.74
42年目	R 57	0.98752	0.98871	0.99932	0.99051	0.1251	101.90	11.20	2.69	4.87	18.76	2.35	1.13	0.23	0.39	1.74	0.22	0.33	0.04	20.84	2.61
43年目	R 58	0.98737	0.98858	0.99932	0.99041	0.1203	101.90	11.06	2.66	4.87	18.59	2.24	1.12	0.22	0.39	1.73	0.21	0.33	0.04	20.65	2.48
44年目	R 59	0.98720	0.98845	0.99932	0.99032	0.1157	101.90	10.92	2.63	4.86	18.42	2.13	1.10	0.22	0.39	1.71	0.20	0.33	0.04	20.45	2.37
45年目	R 60	0.98704	0.98831	0.99932	0.99023	0.1112	101.90	10.78	2.60	4.86	18.24	2.03	1.09	0.22	0.39	1.69	0.19	0.32	0.04	20.26	2.25
46年目	R 61	0.98687	0.98817	0.99932	0.99013	0.1069	101.90	10.64	2.57	4.86	18.07	1.93	1.07	0.22	0.39	1.68	0.18	0.32	0.03	20.07	2.15
47年目	R 62	0.98669	0.98803	0.99932	0.99003	0.1028	101.90	10.50	2.54	4.85	17.89	1.84	1.06	0.21	0.39	1.66	0.17	0.			
